




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 08 de septiembre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-4
Central P. del Tigre	-7
APR A	-0
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.352
Baygorria	1.609
Palmar	5.673
Salto Grande	10.820
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	6.792
TOTAL Generación	28.229

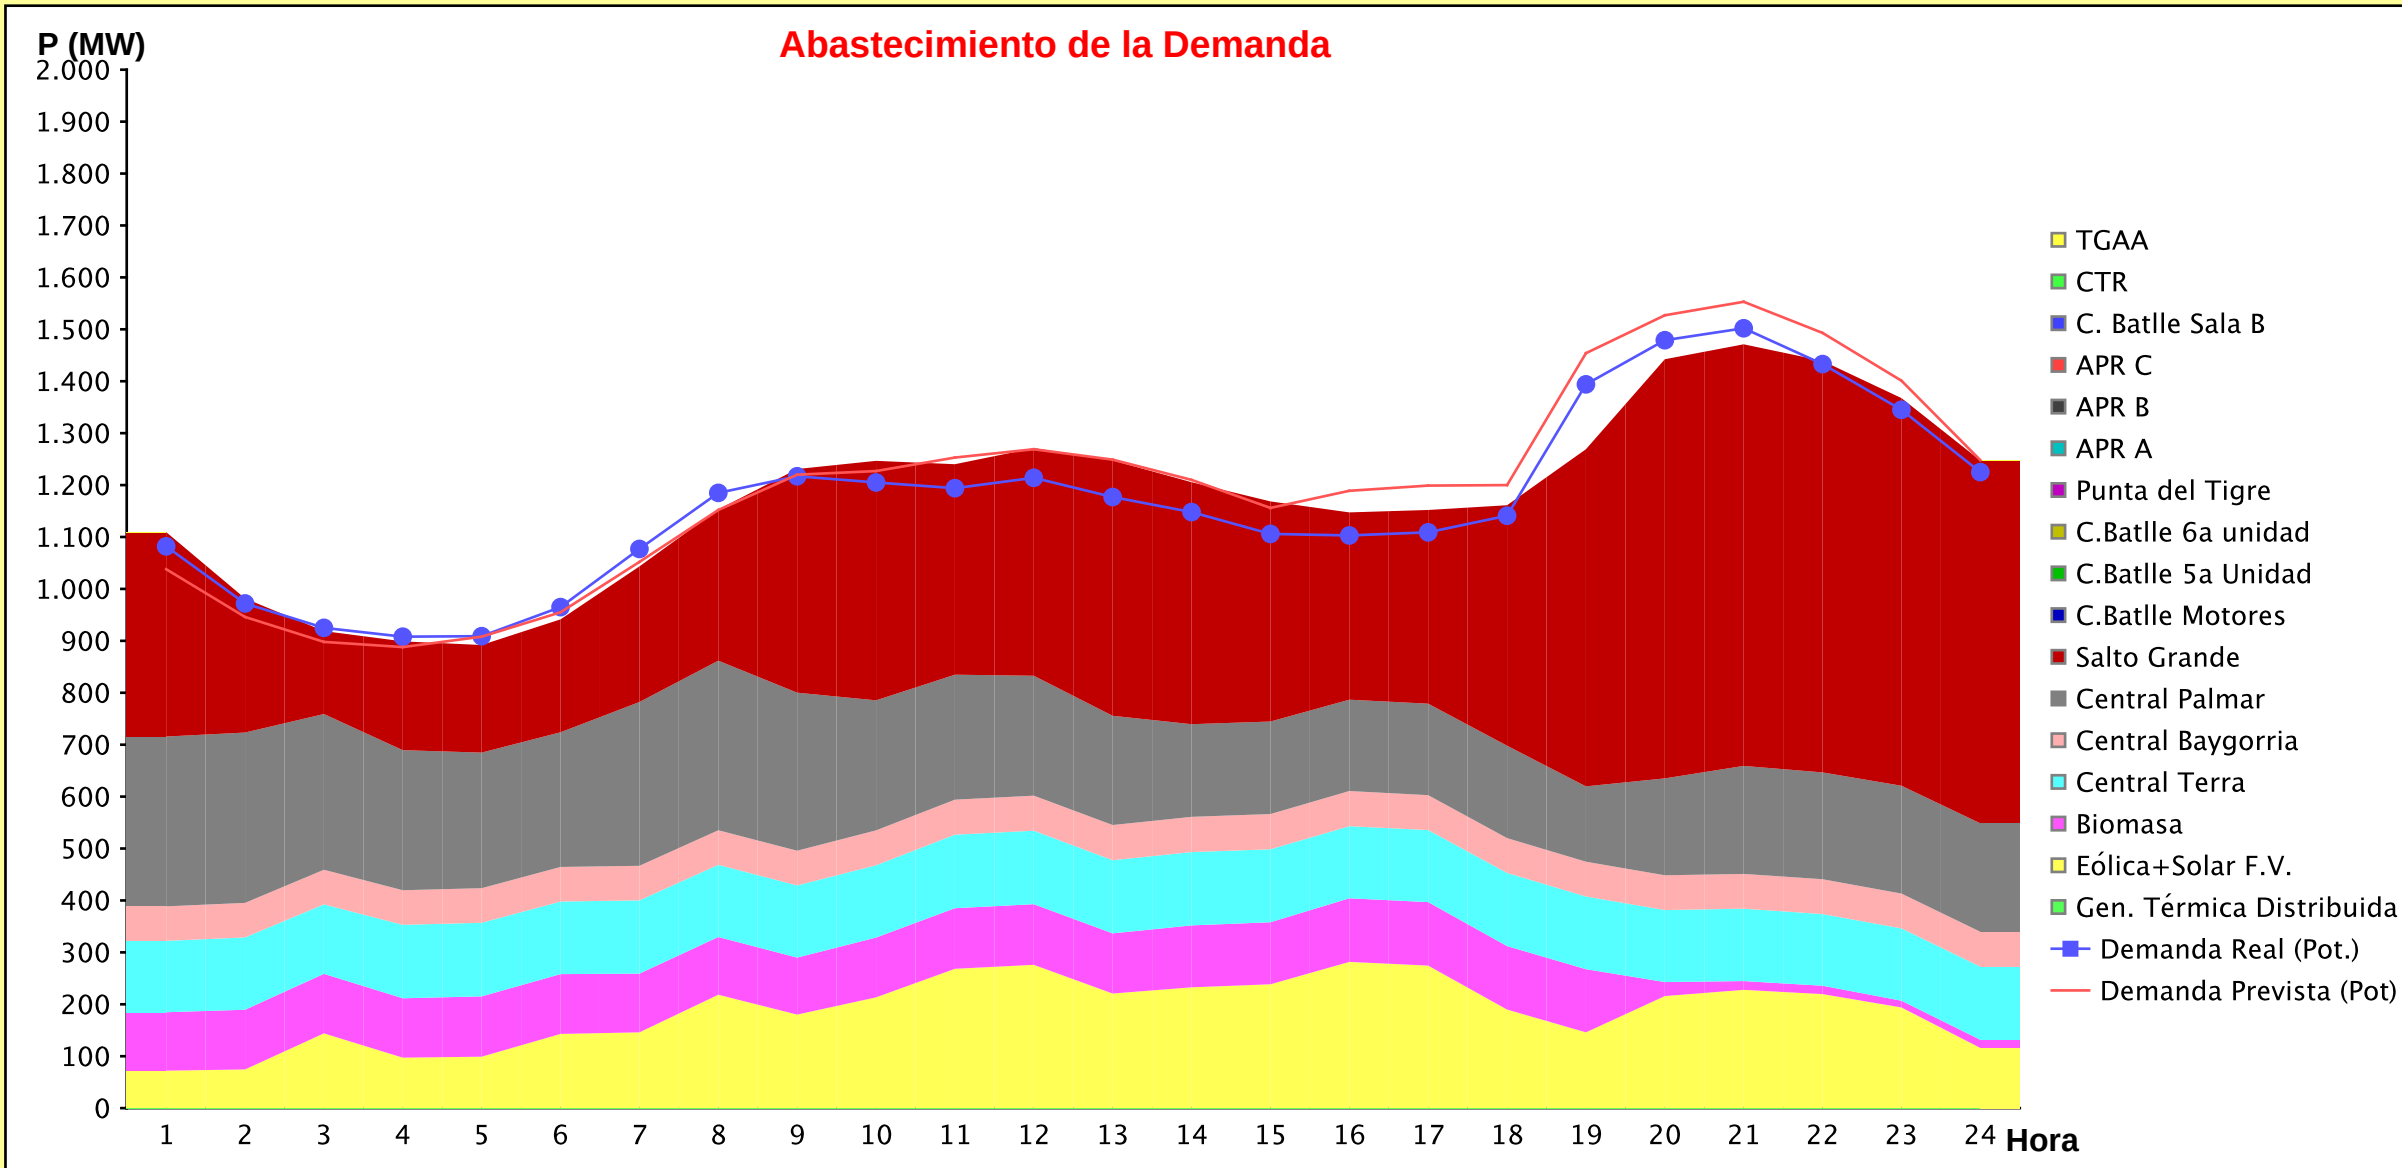




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.229
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.685
Diferencia (MWh)	-456
Ejecutada - Programada	-1,59 %

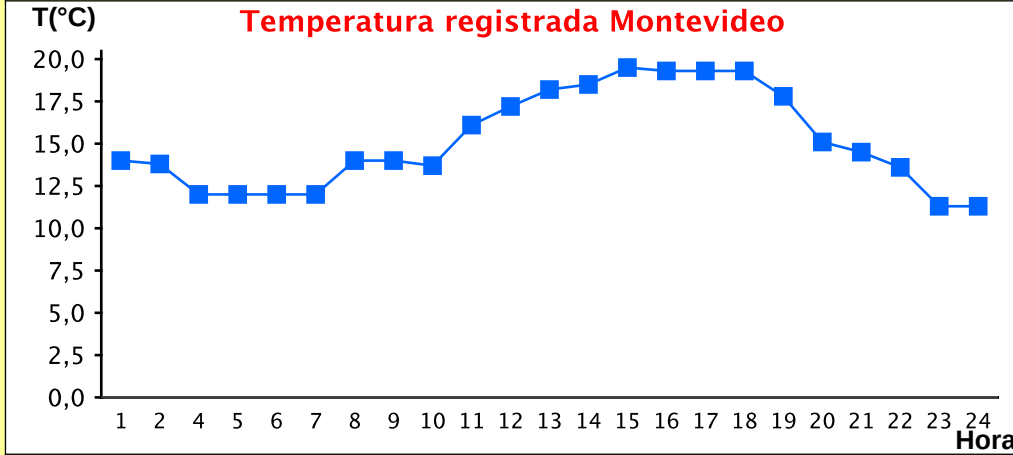



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1287 Hora 11:29
Potencia mínima:	890 Hora 03:24
Pico noche:	1516 Hora 20:52

Generación Media (MW)	
Eólica	172,1
Biomasa	101,1
Solar fotovoltaica	15,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

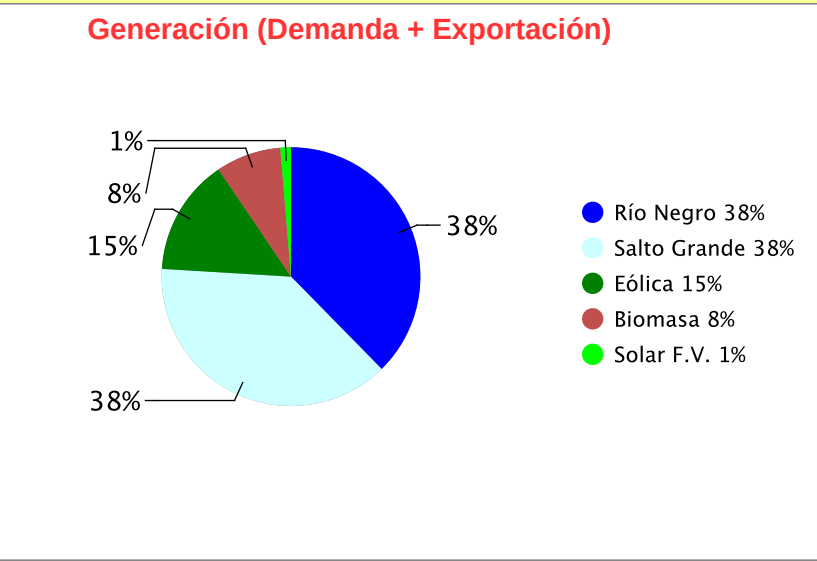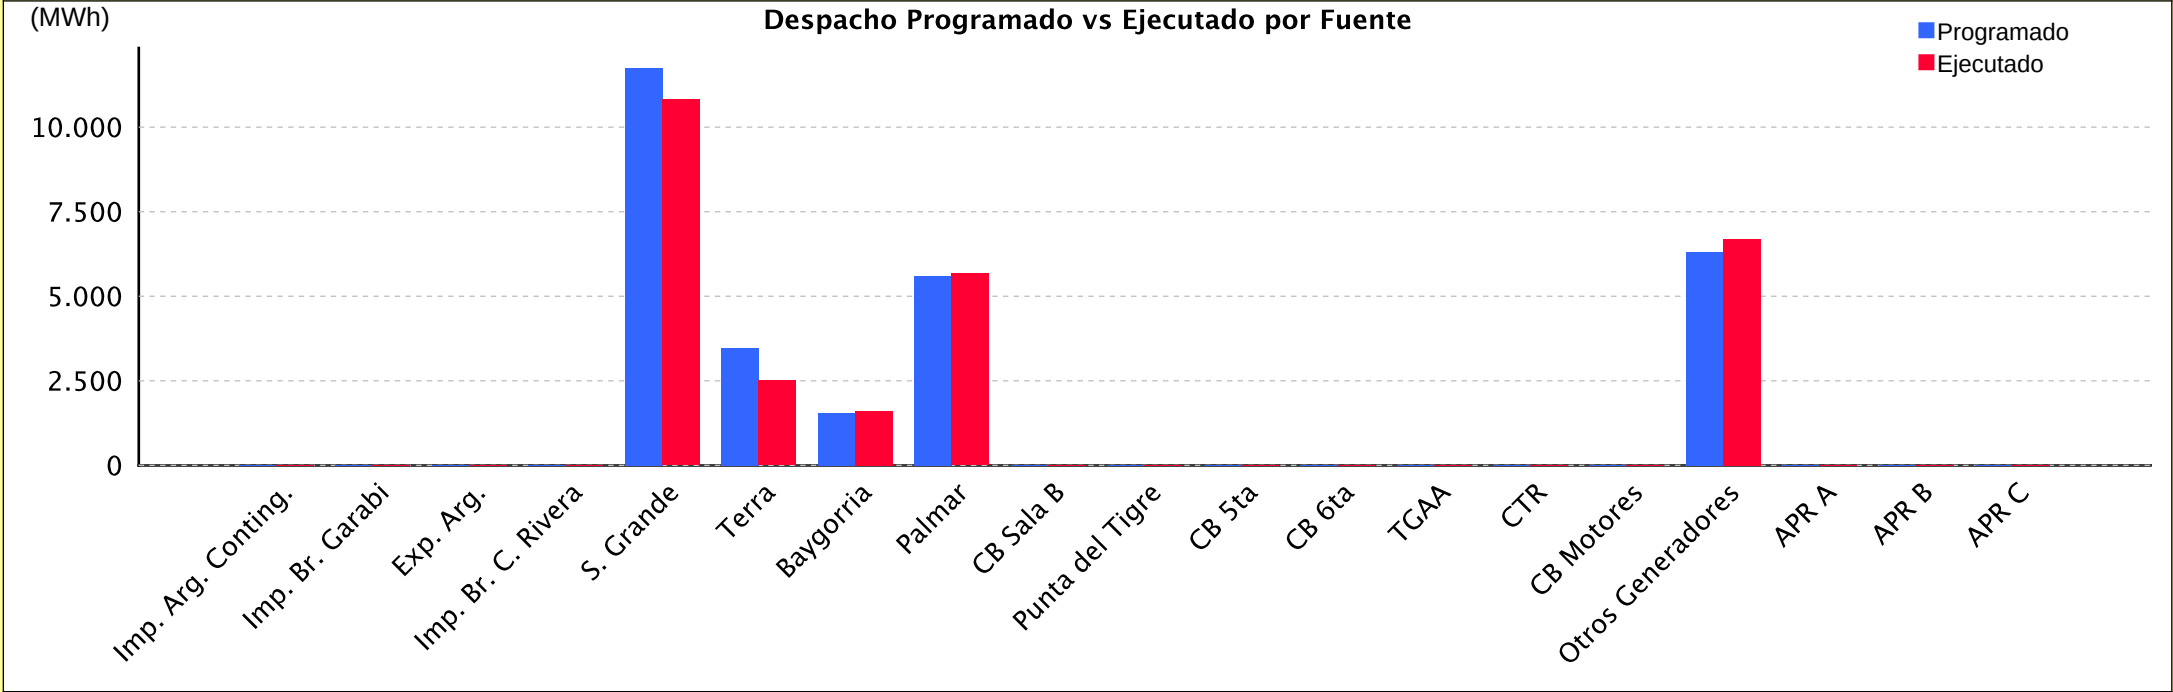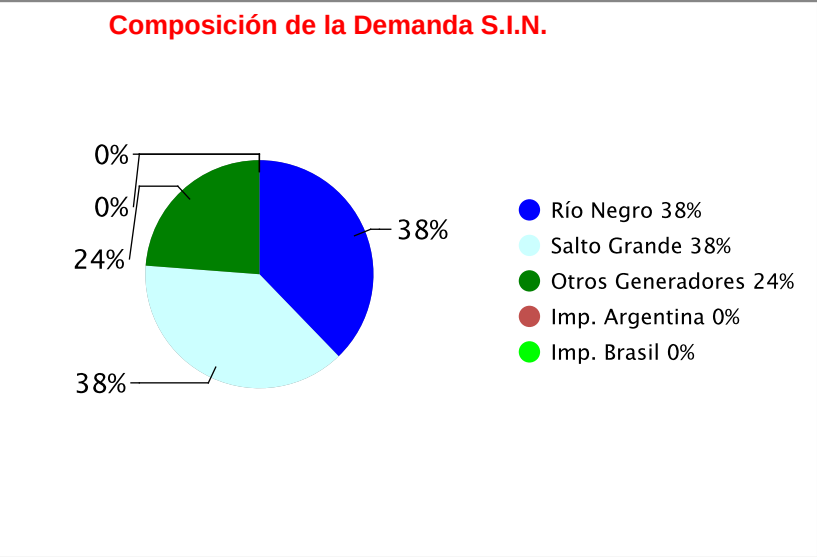



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

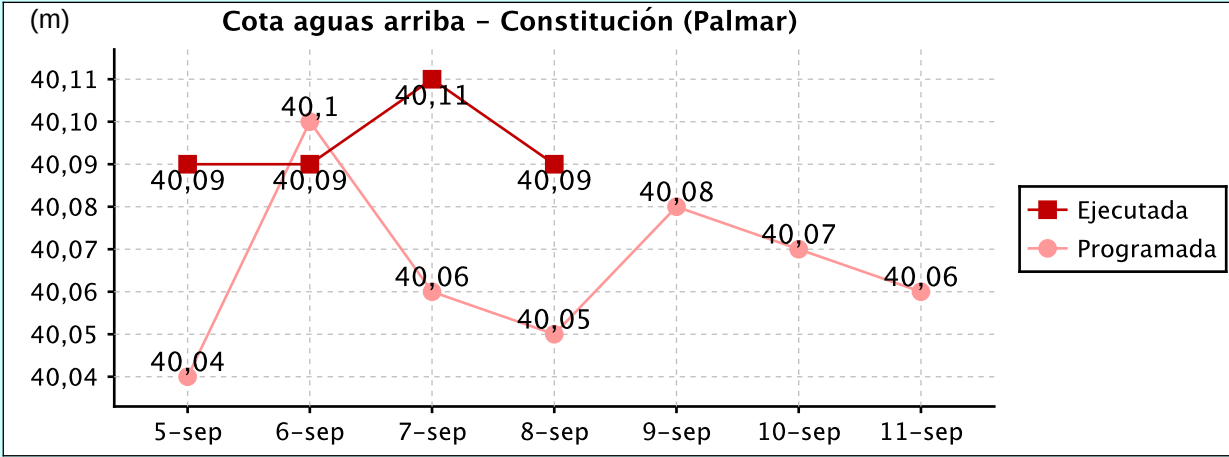
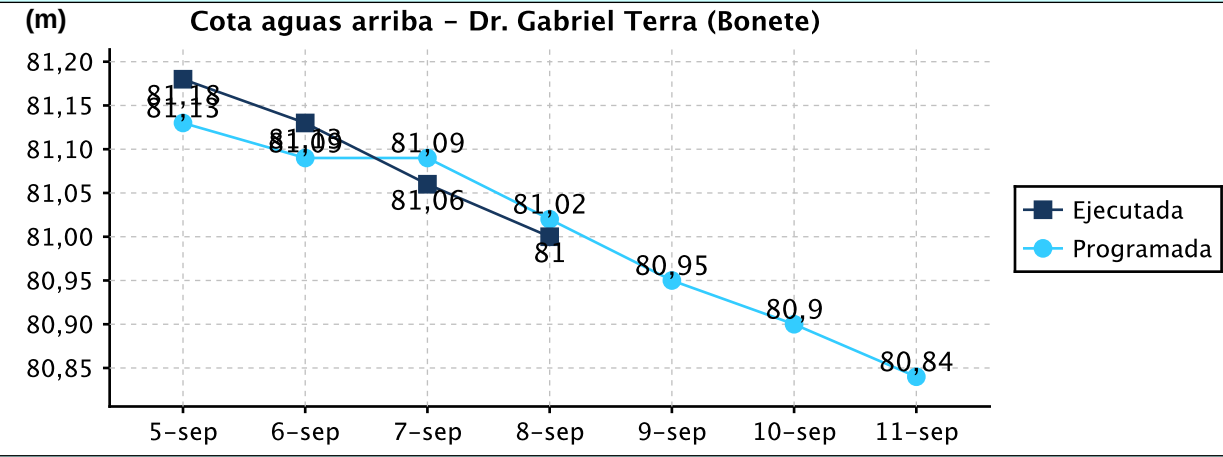


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,02	81
Baygorria	54,23	54,29
Palmar	40,05	40,09
SGU	36,03	36,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

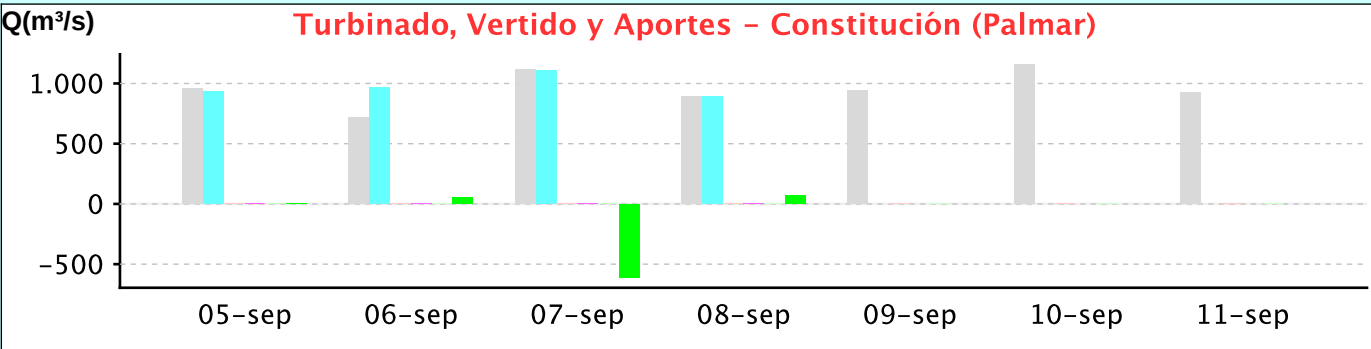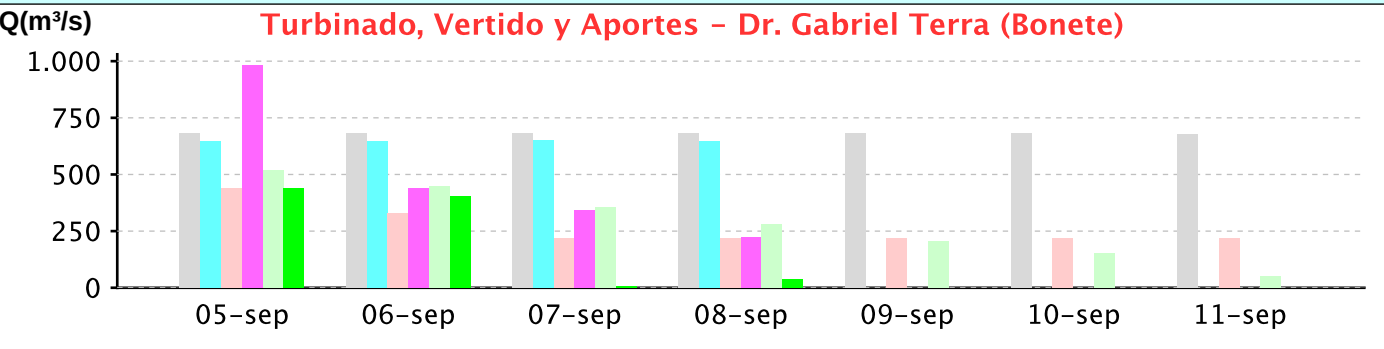

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

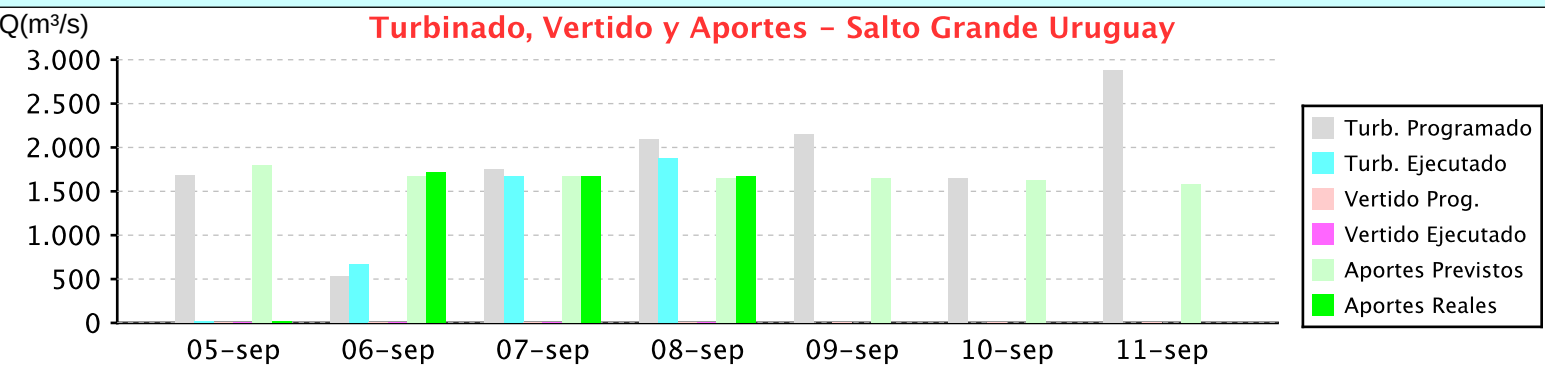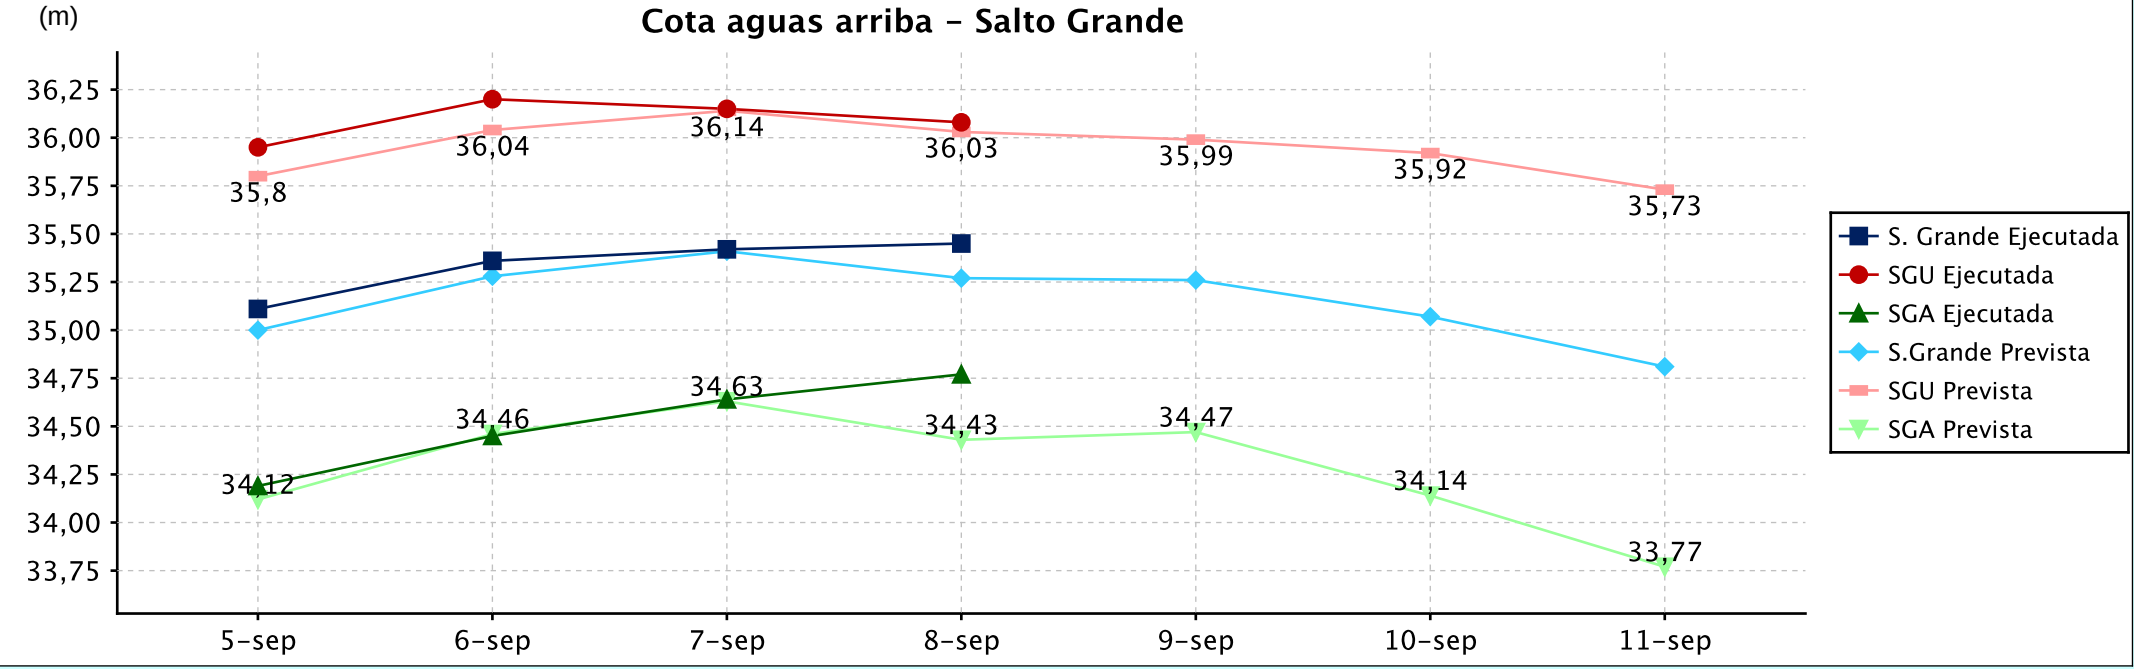

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,08
Cota Vista Arg	34,77
Cota real	35,45

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	32.070
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	647
Baygorria	582	583
Palmar	893	895
SGU	2.092	1.877

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	281	36
Baygorria	0	-15
Palmar	0	70
SGU	1.650	1.669

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	222
Baygorria	300	192
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
