




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 09 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-6
Central P. del Tigre	-6
APR A	-1
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.349
Baygorria	1.620
Palmar	6.501
Salto Grande	12.398
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	5.512
TOTAL Generación	29.362

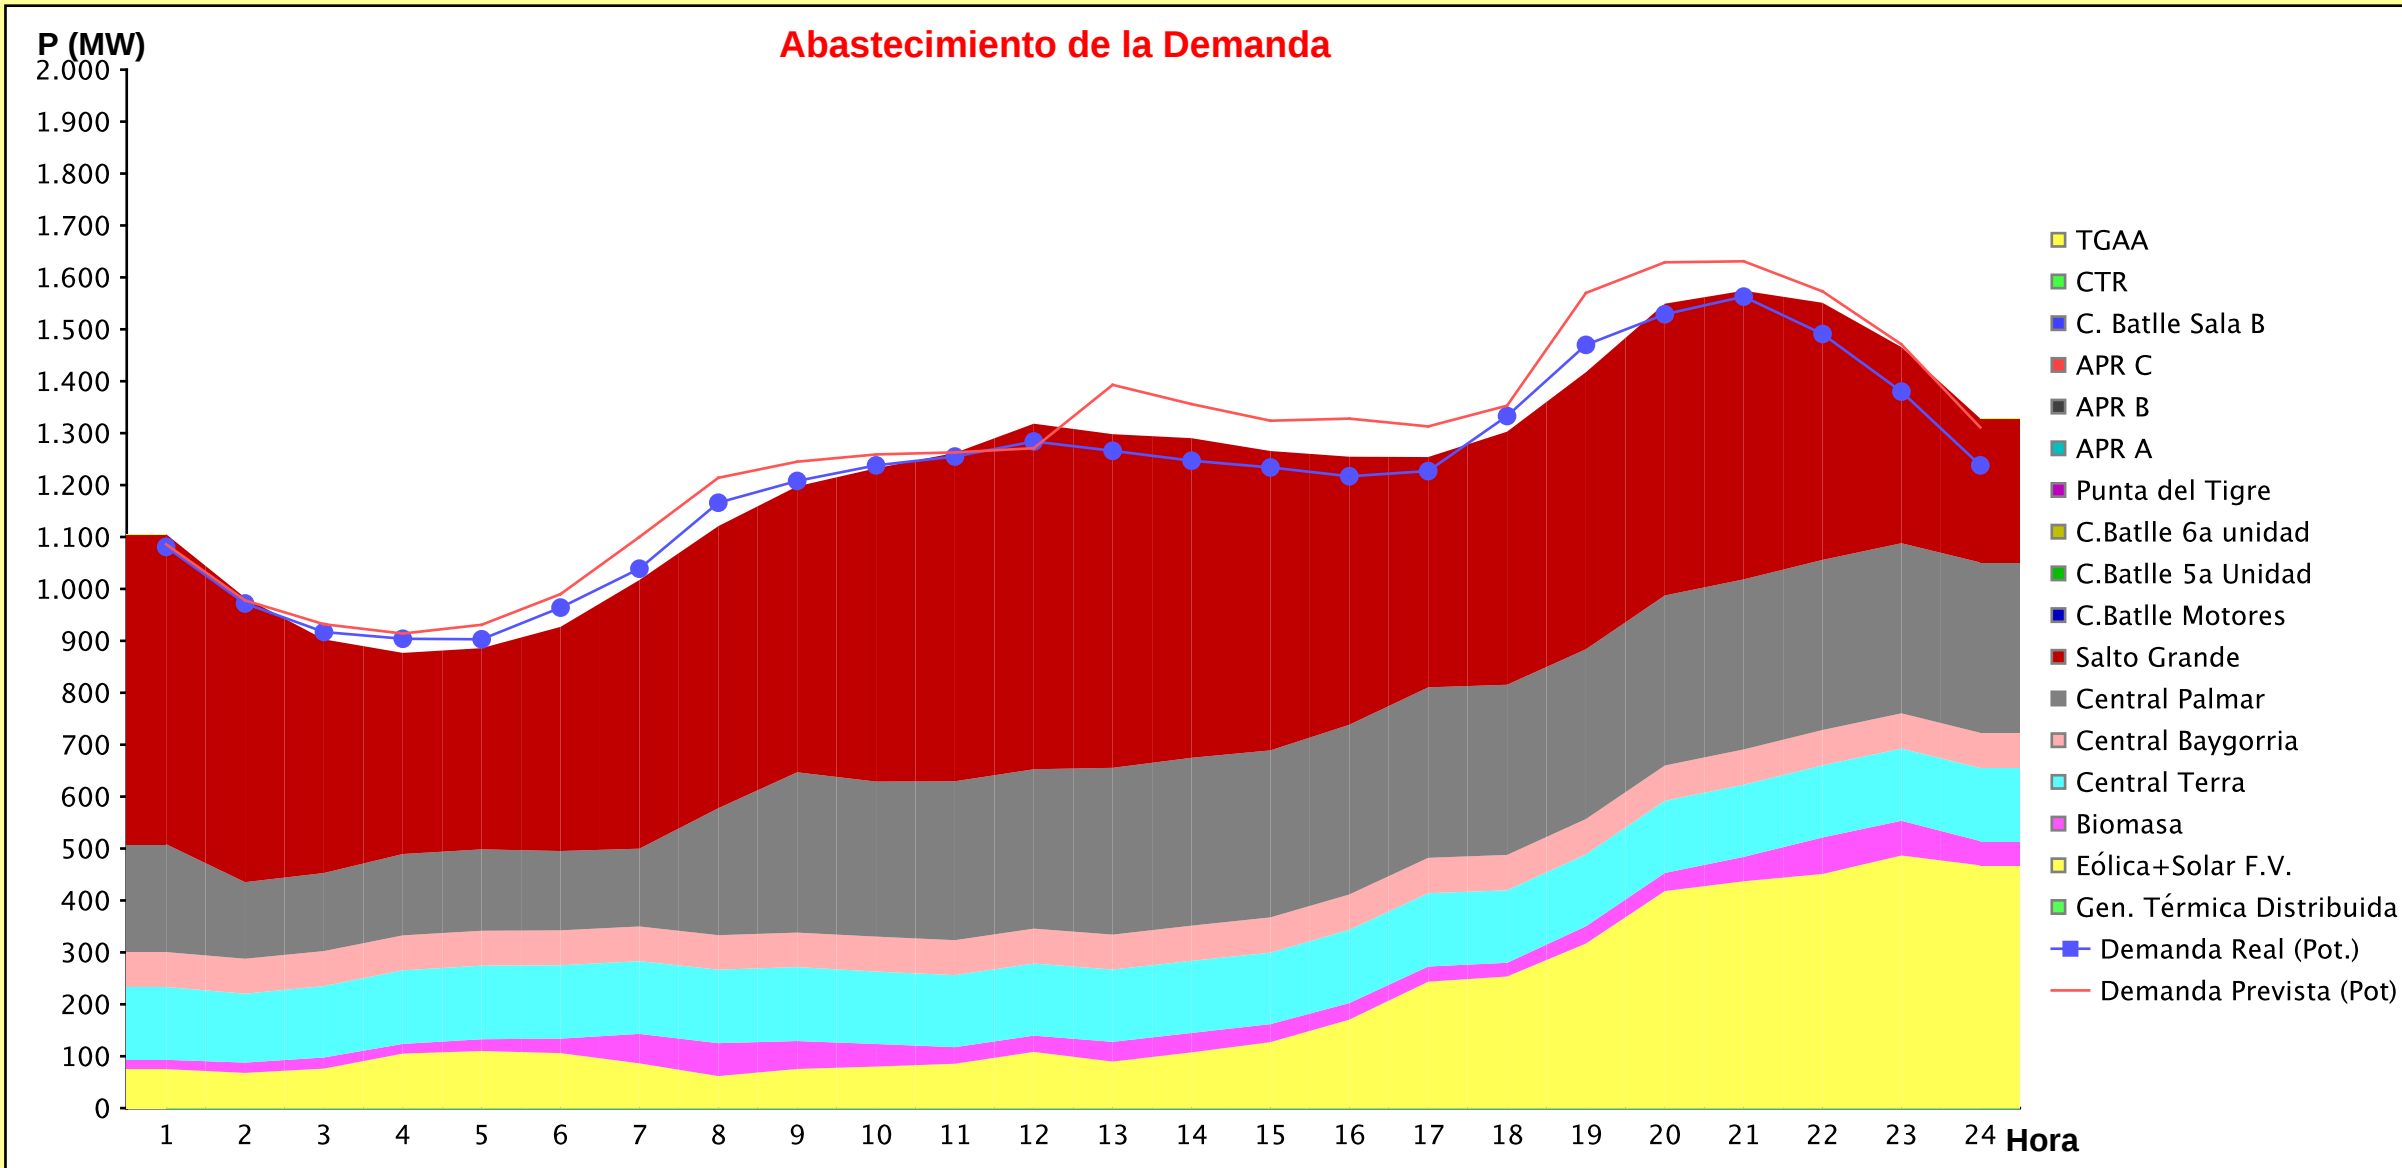

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.362
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.435
Diferencia (MWh)	-1.073
Ejecutada - Programada	-3,53 %

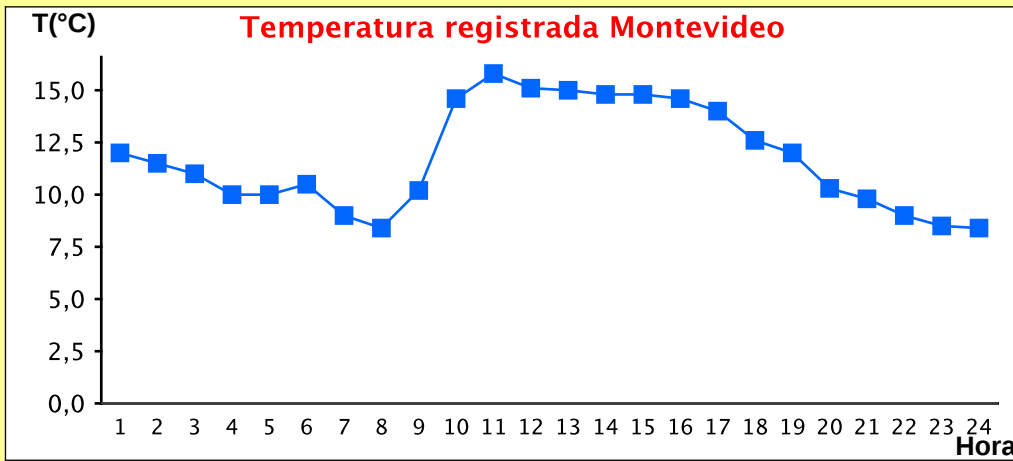



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1329 Hora 11:27
Potencia mínima:	886 Hora 03:52
Pico noche:	1626 Hora 20:37

Generación Media (MW)	
Eólica	178,6
Biomasa	43,4
Solar fotovoltaica	13,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

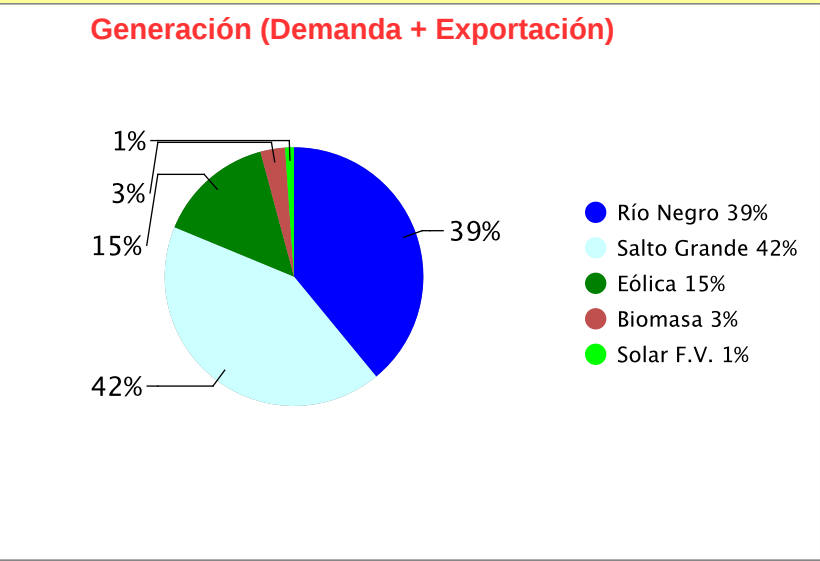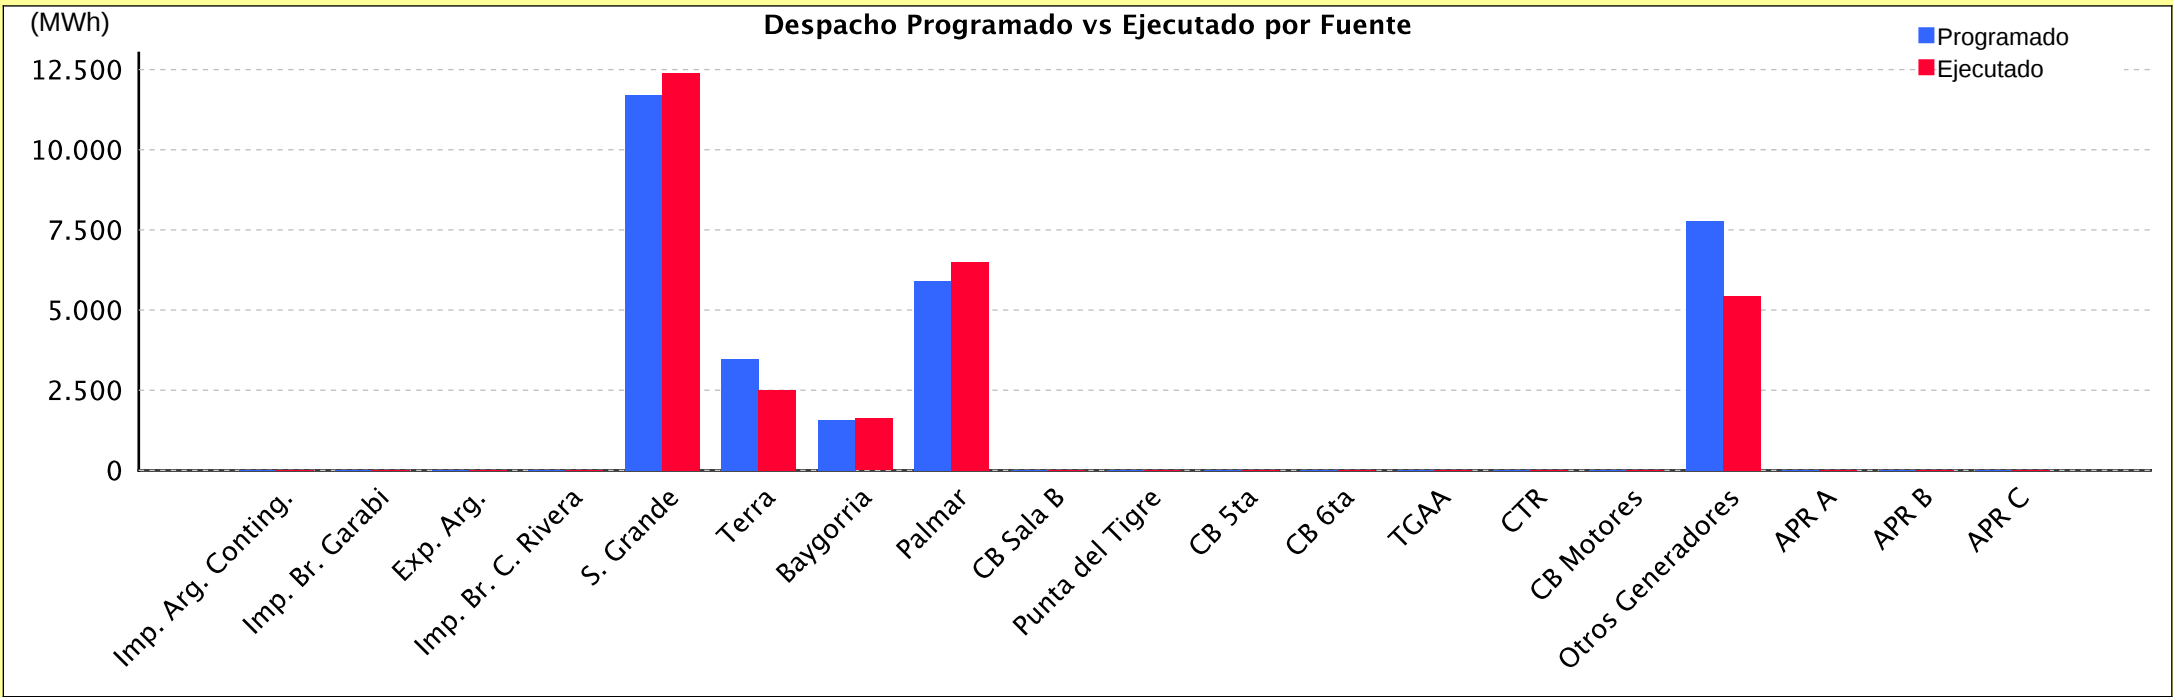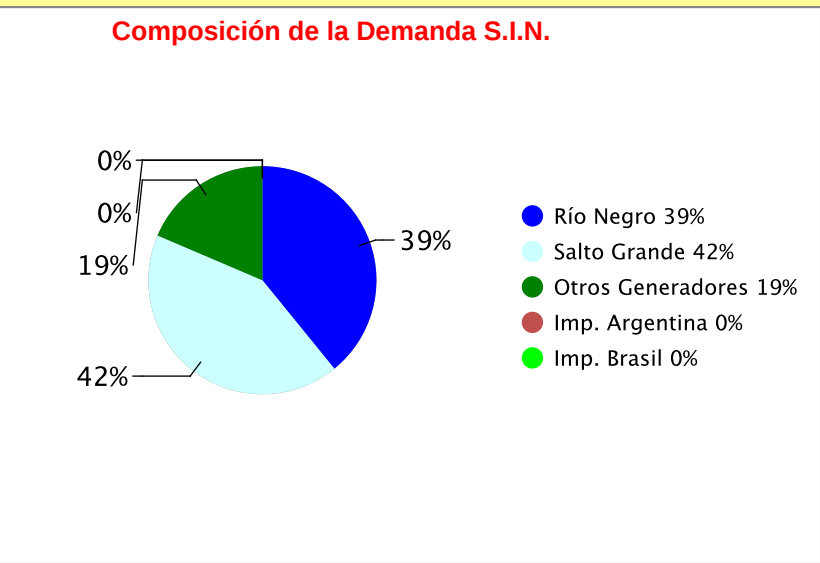



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

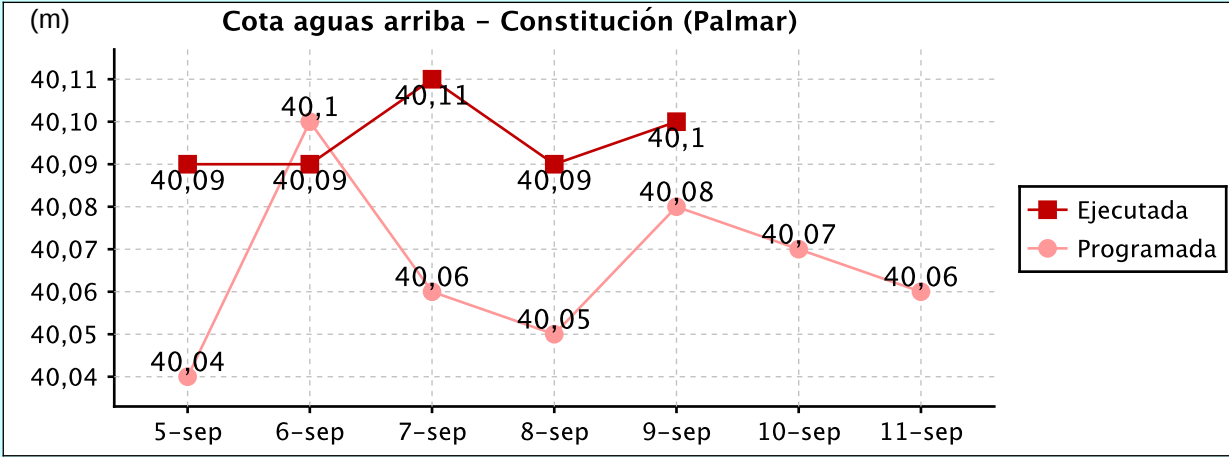
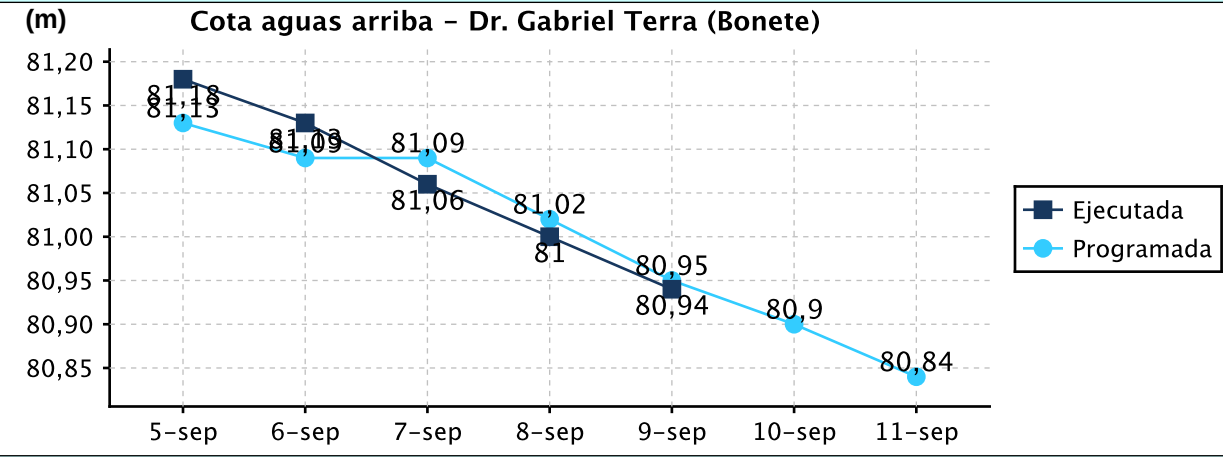


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,95	80,94
Baygorria	54,29	54,26
Palmar	40,08	40,1
SGU	35,99	35,86

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

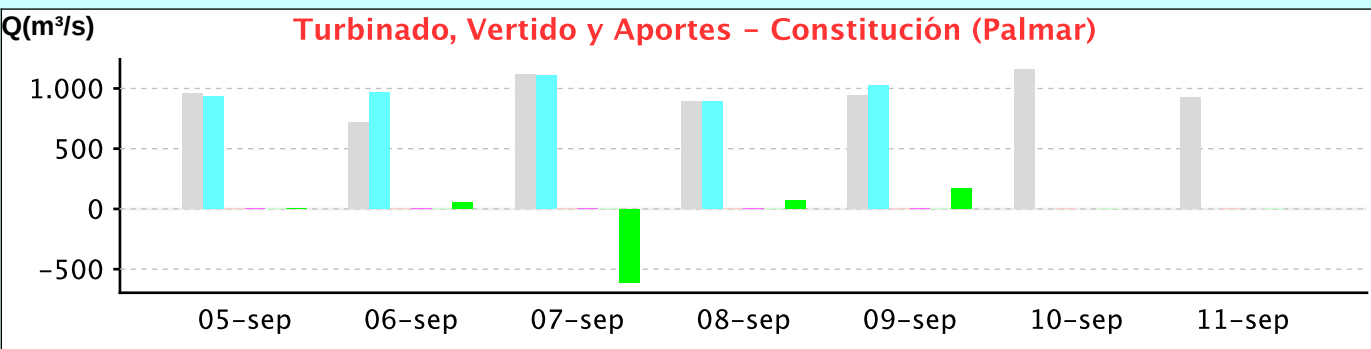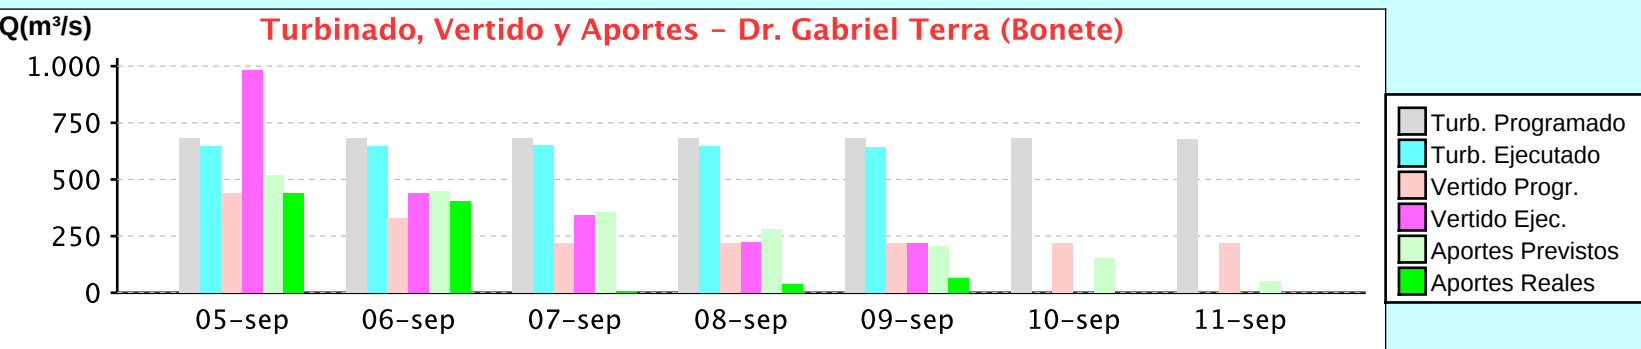

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

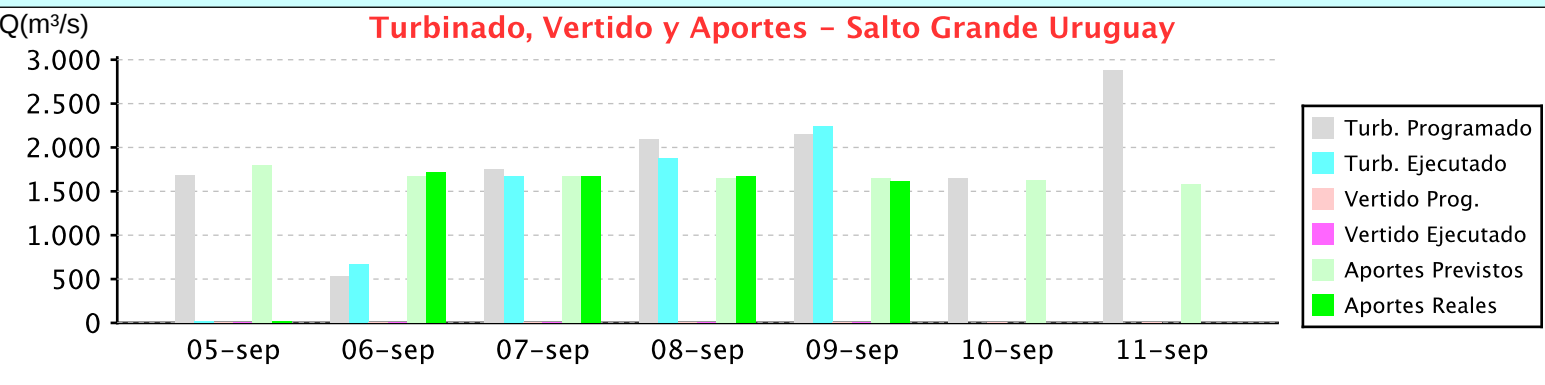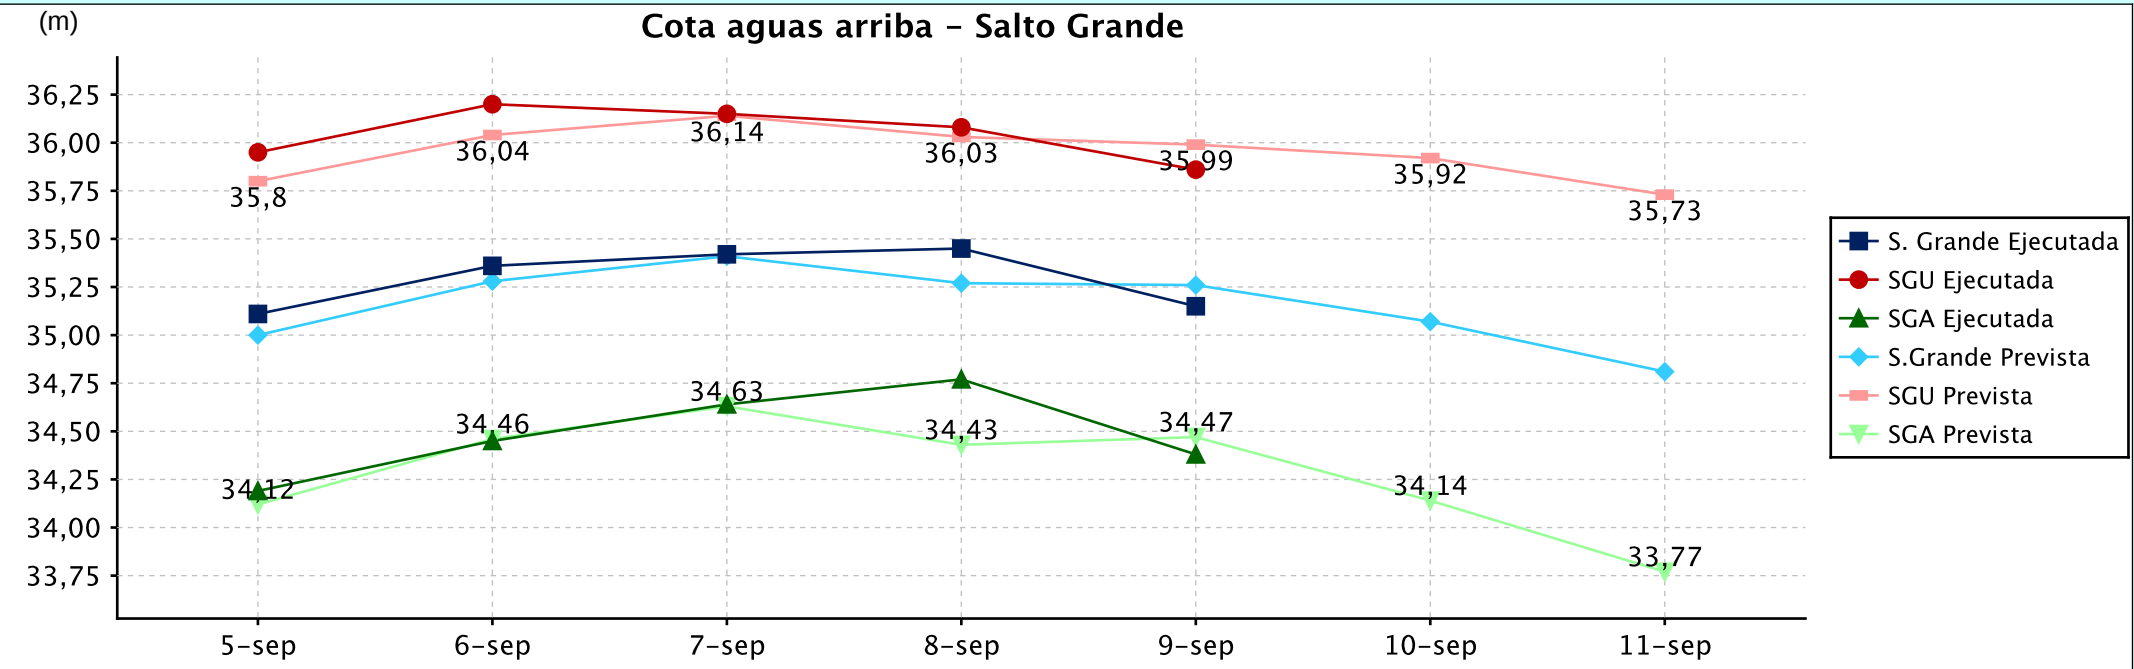

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,86
Cota Vista Arg	34,38
Cota real	35,15
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	35.009

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	642
Baygorria	582	594
Palmar	942	1.025
SGU	2.147	2.239

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	205	65
Baygorria	0	25
Palmar	0	167
SGU	1.650	1.613

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	220
Baygorria	300	319
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
