




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 12 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	112
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	116
Central La Tablada	-8
Central P. del Tigre	60
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.360
Baygorria	1.635
Palmar	5.421
Salto Grande	9.549
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	9.241
TOTAL Generación	29.366

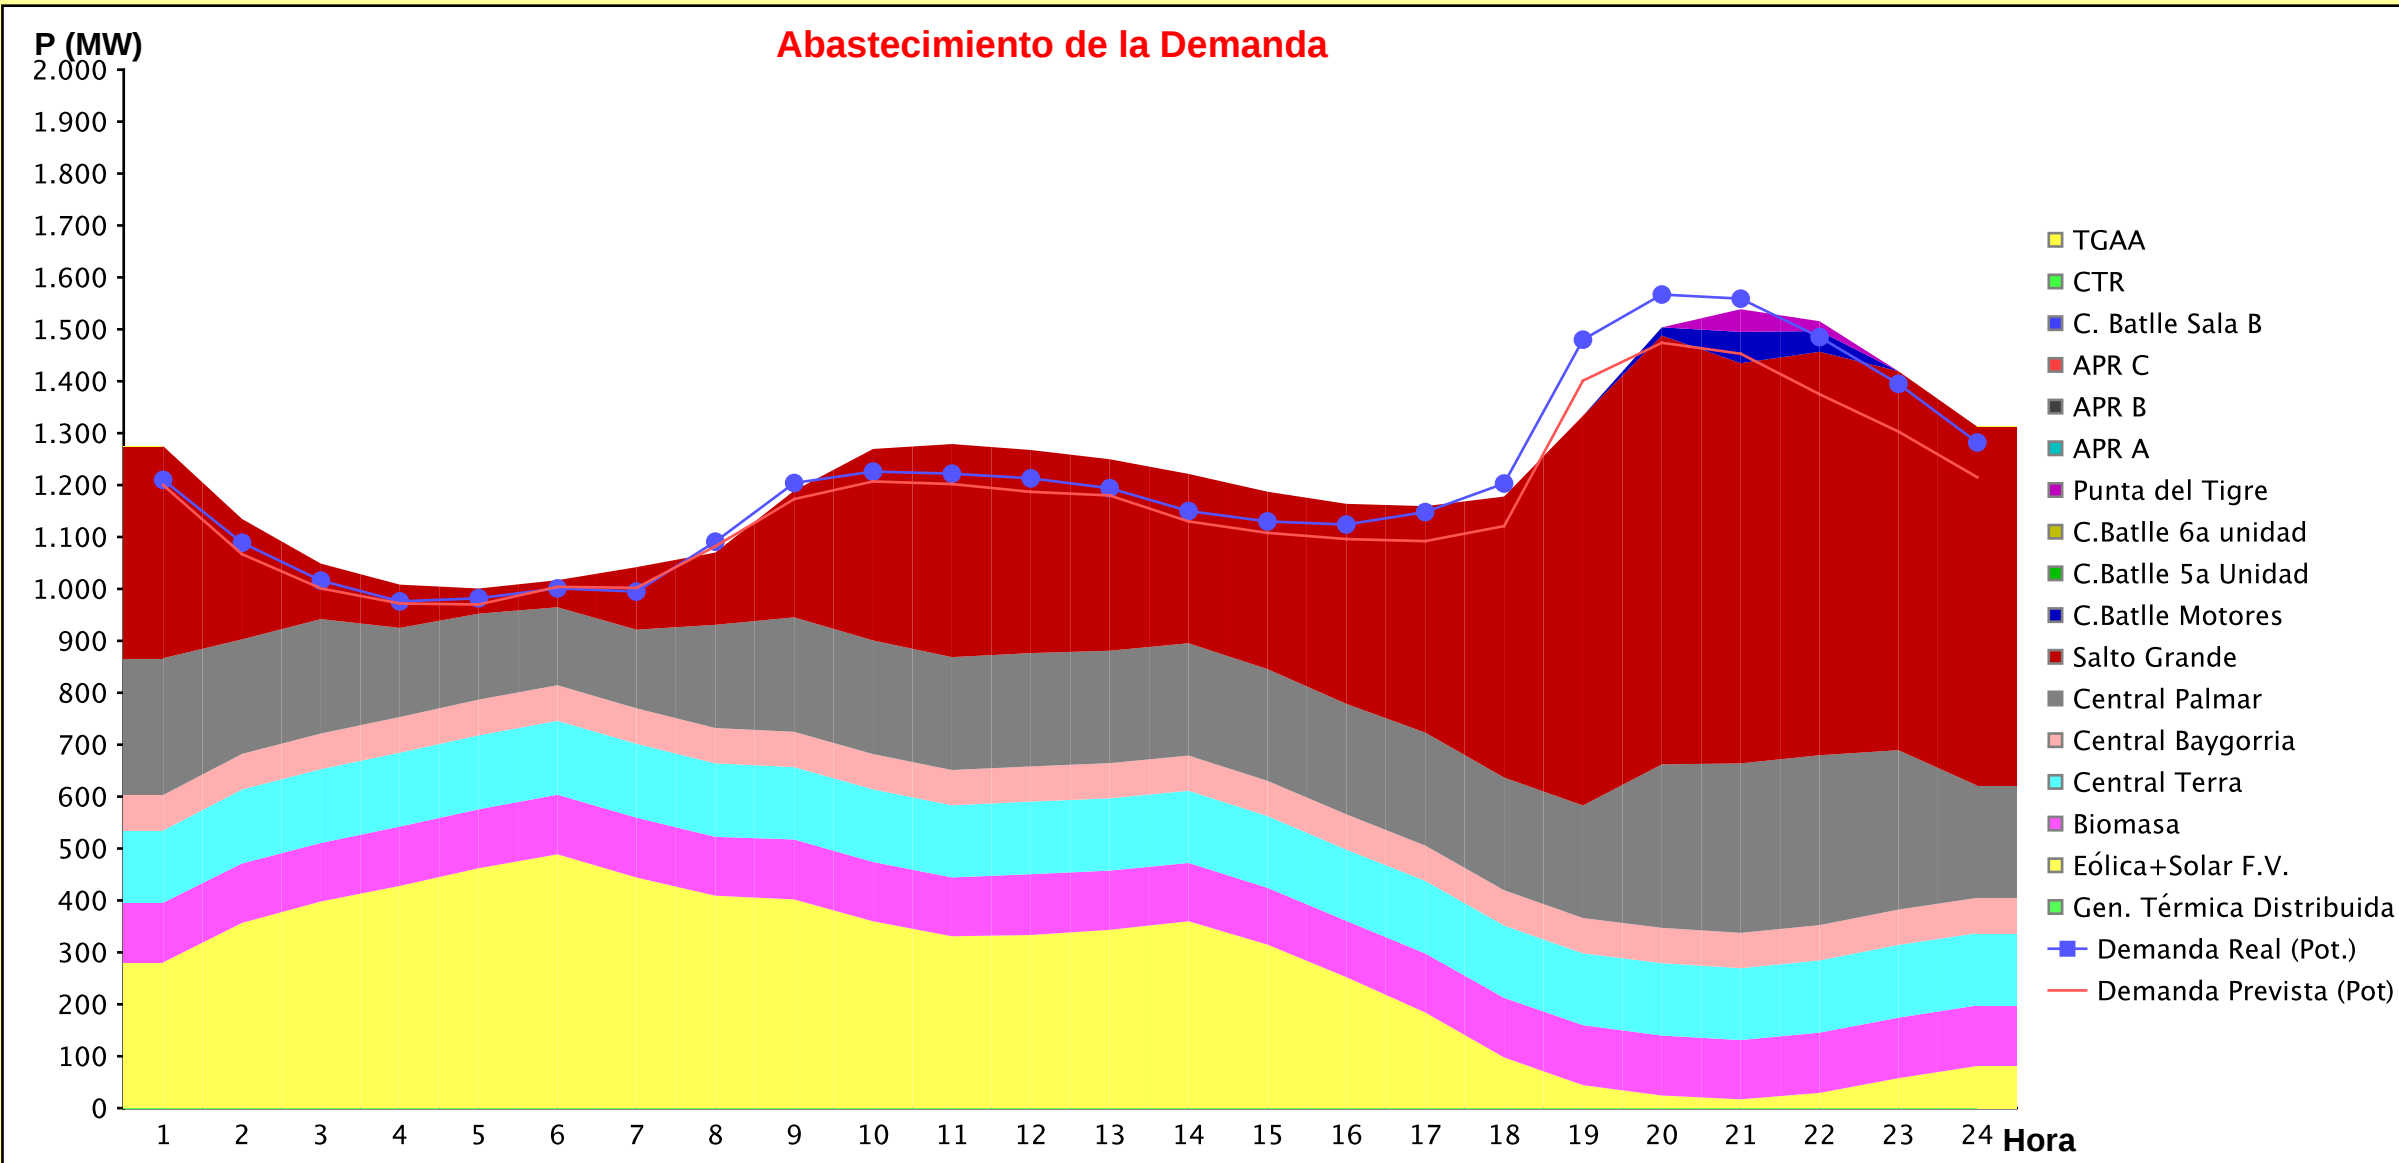

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.366
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.015
Diferencia (MWh)	1.351
Ejecutada - Programada	4,82 %


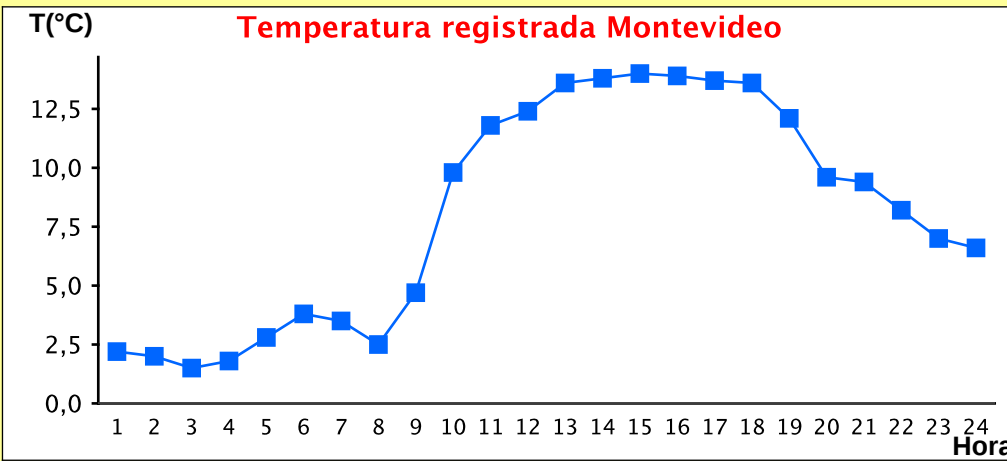


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1313 Hora 10:15
Potencia mínima:	1009 Hora 04:03
Pico noche:	1570 Hora 20:35

Generación Media (MW)	
Eólica	254,7
Biomasa	114,3
Solar fotovoltaica	15,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


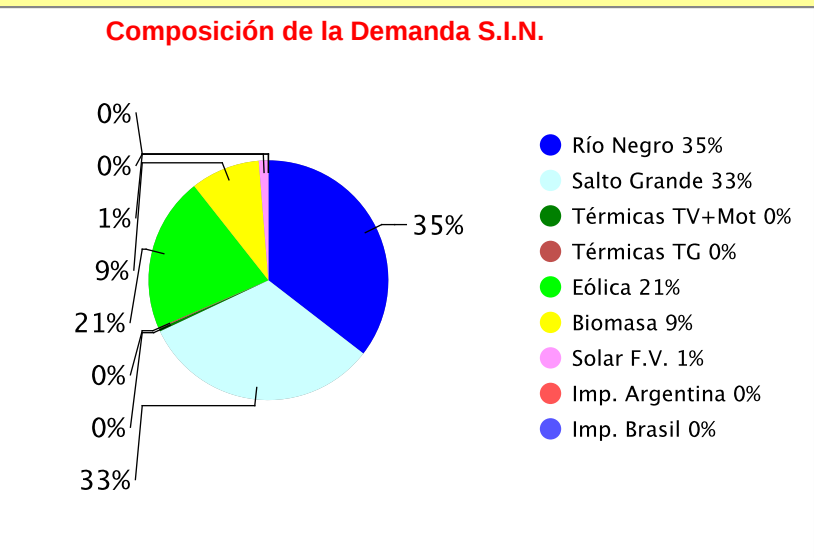


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

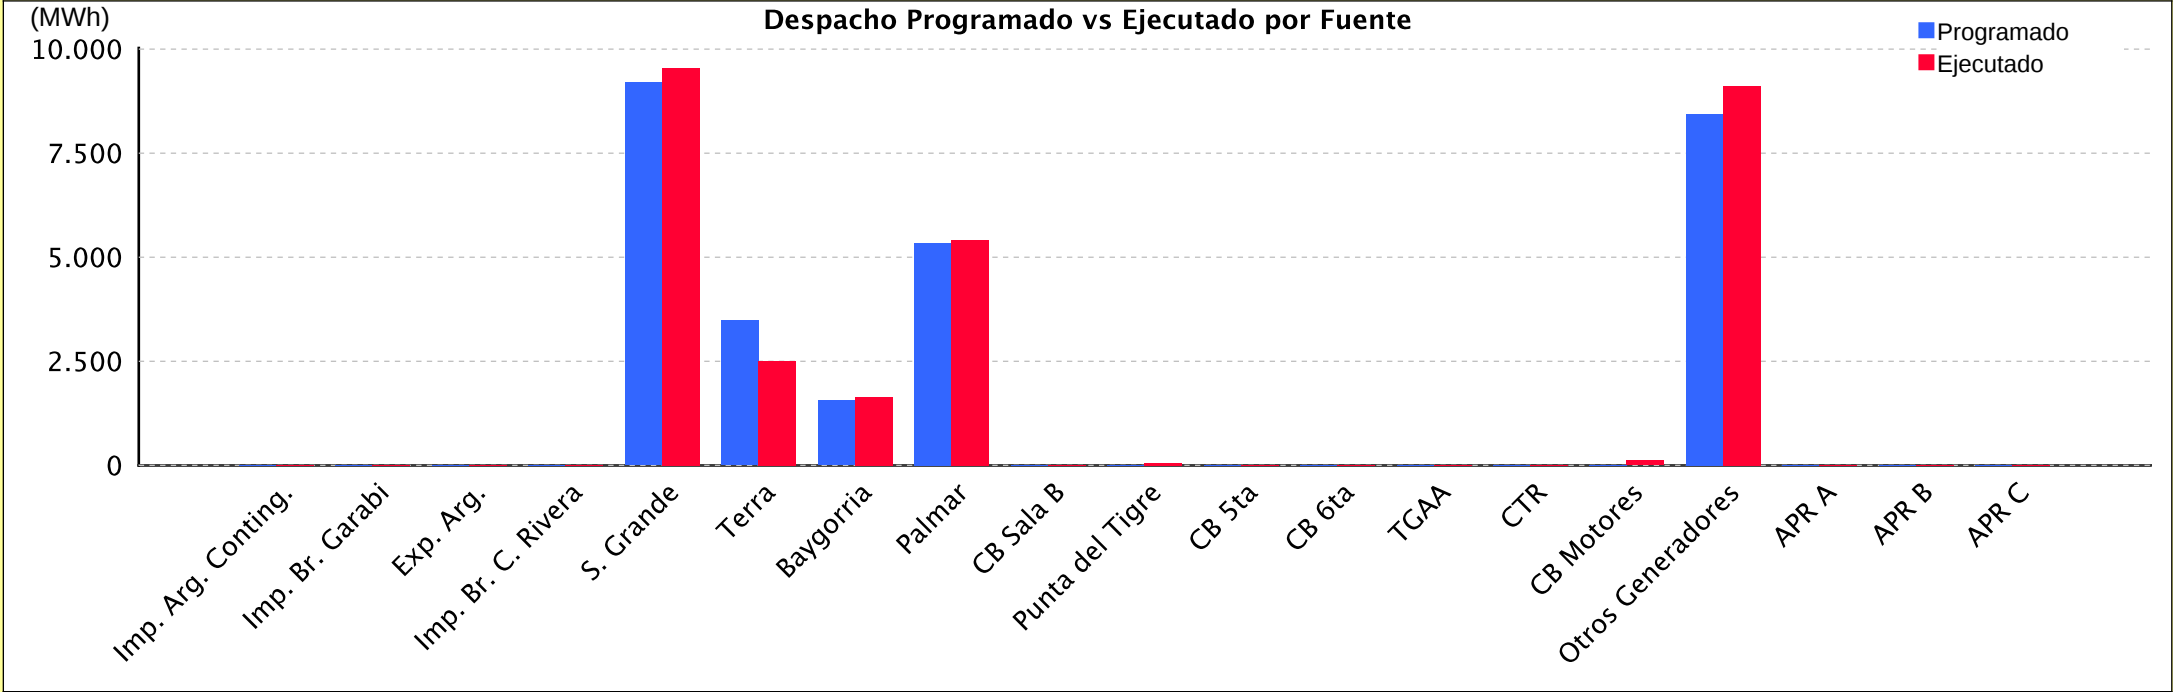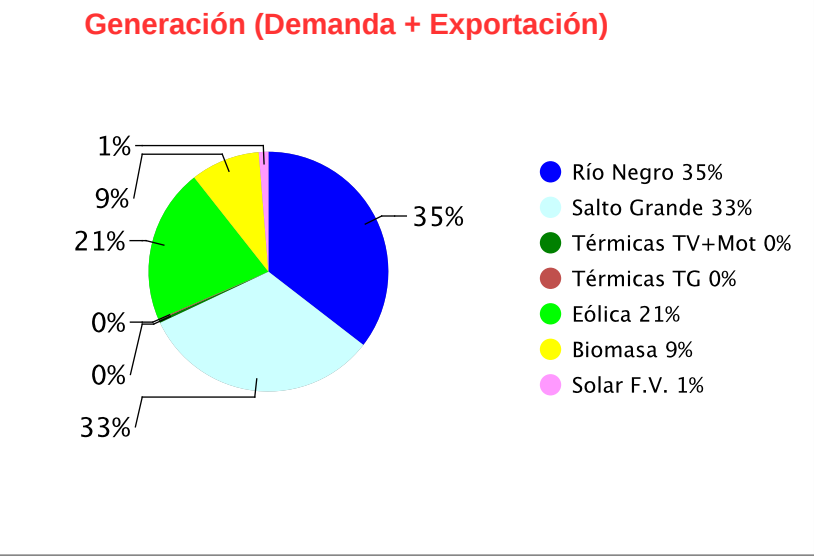



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

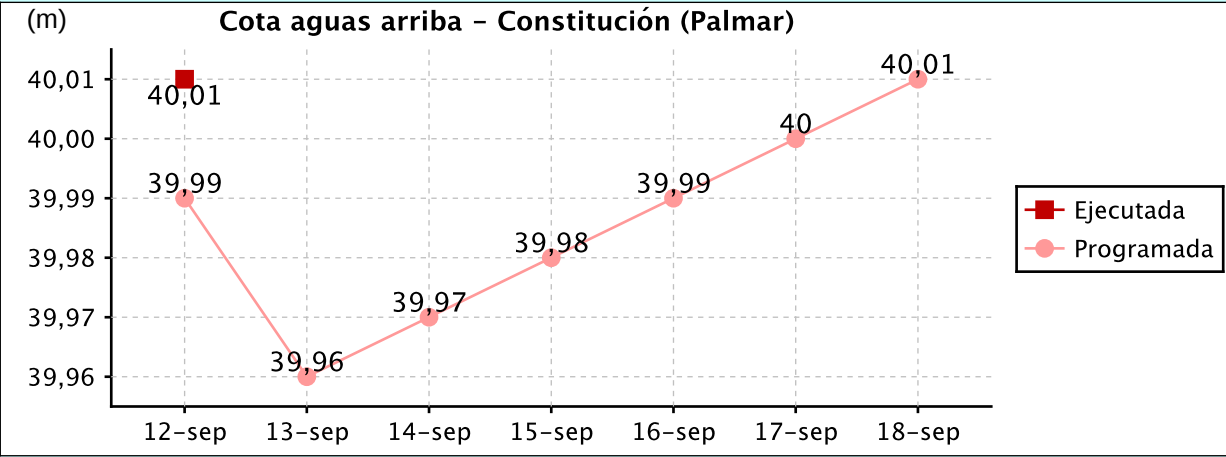
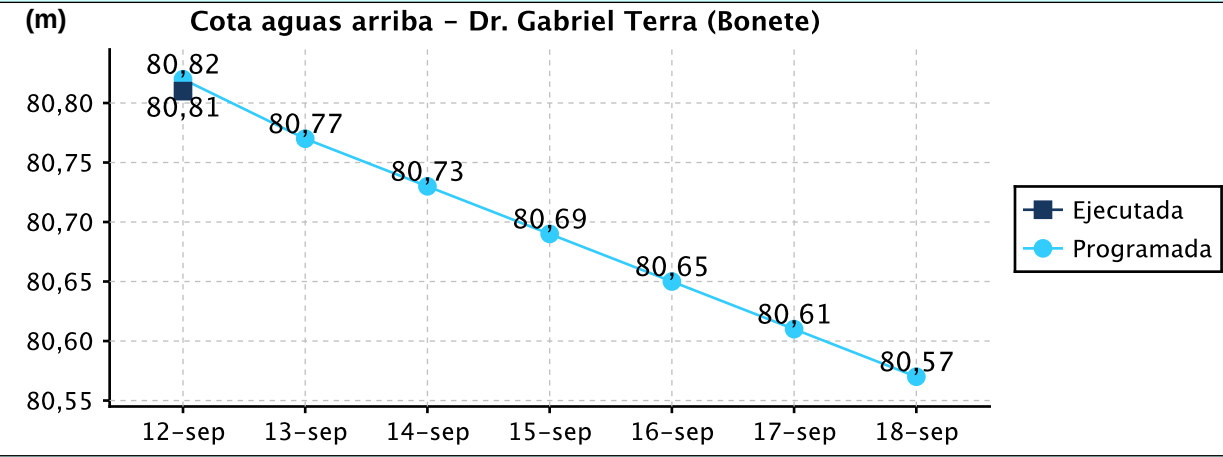


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,82	80,81
Baygorria	54,27	54,36
Palmar	39,99	40,01
SGU	35,70	35,7

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

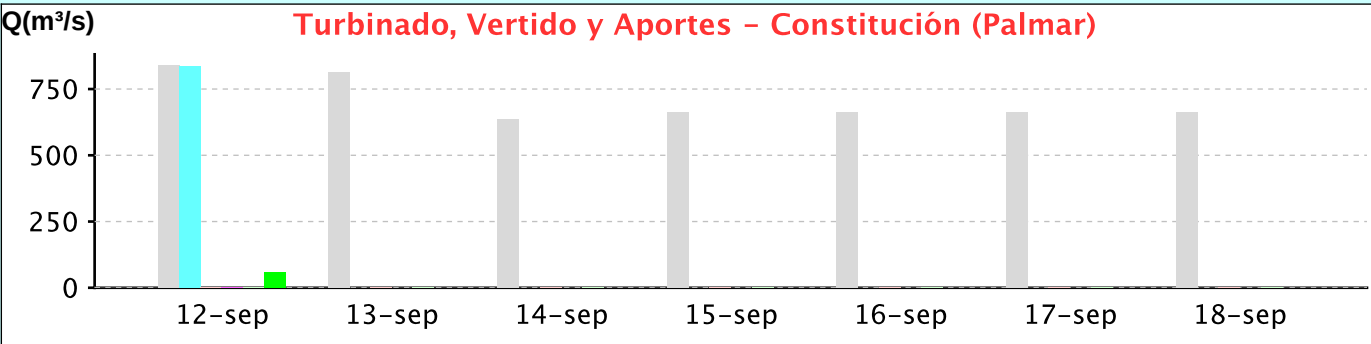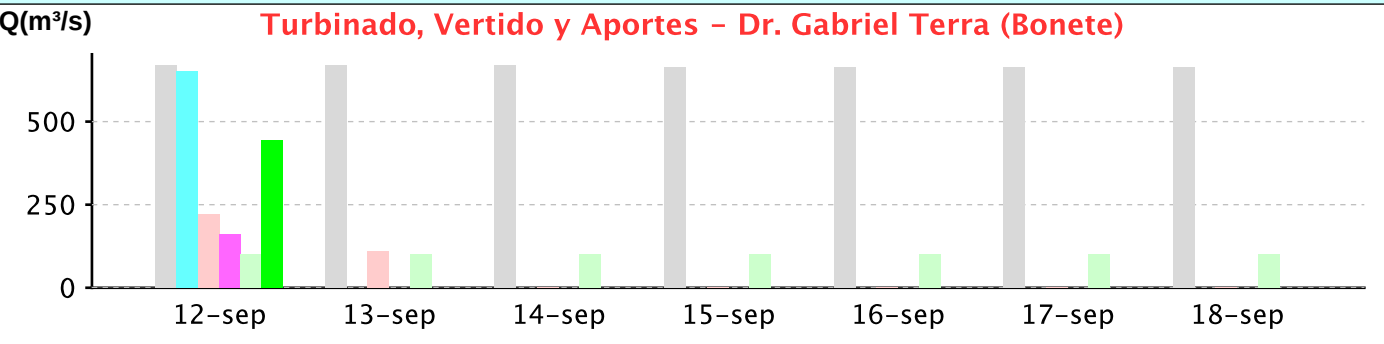

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

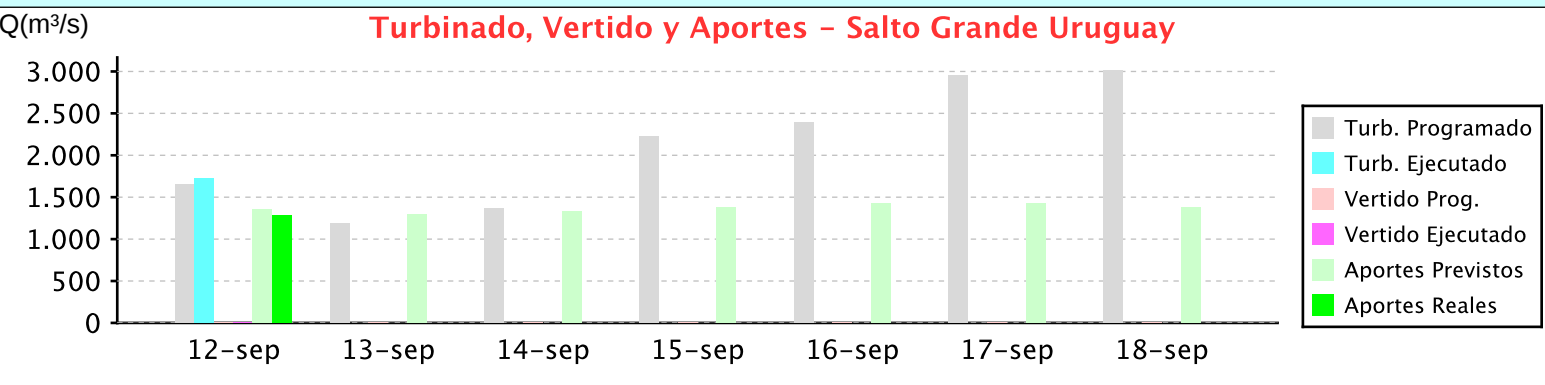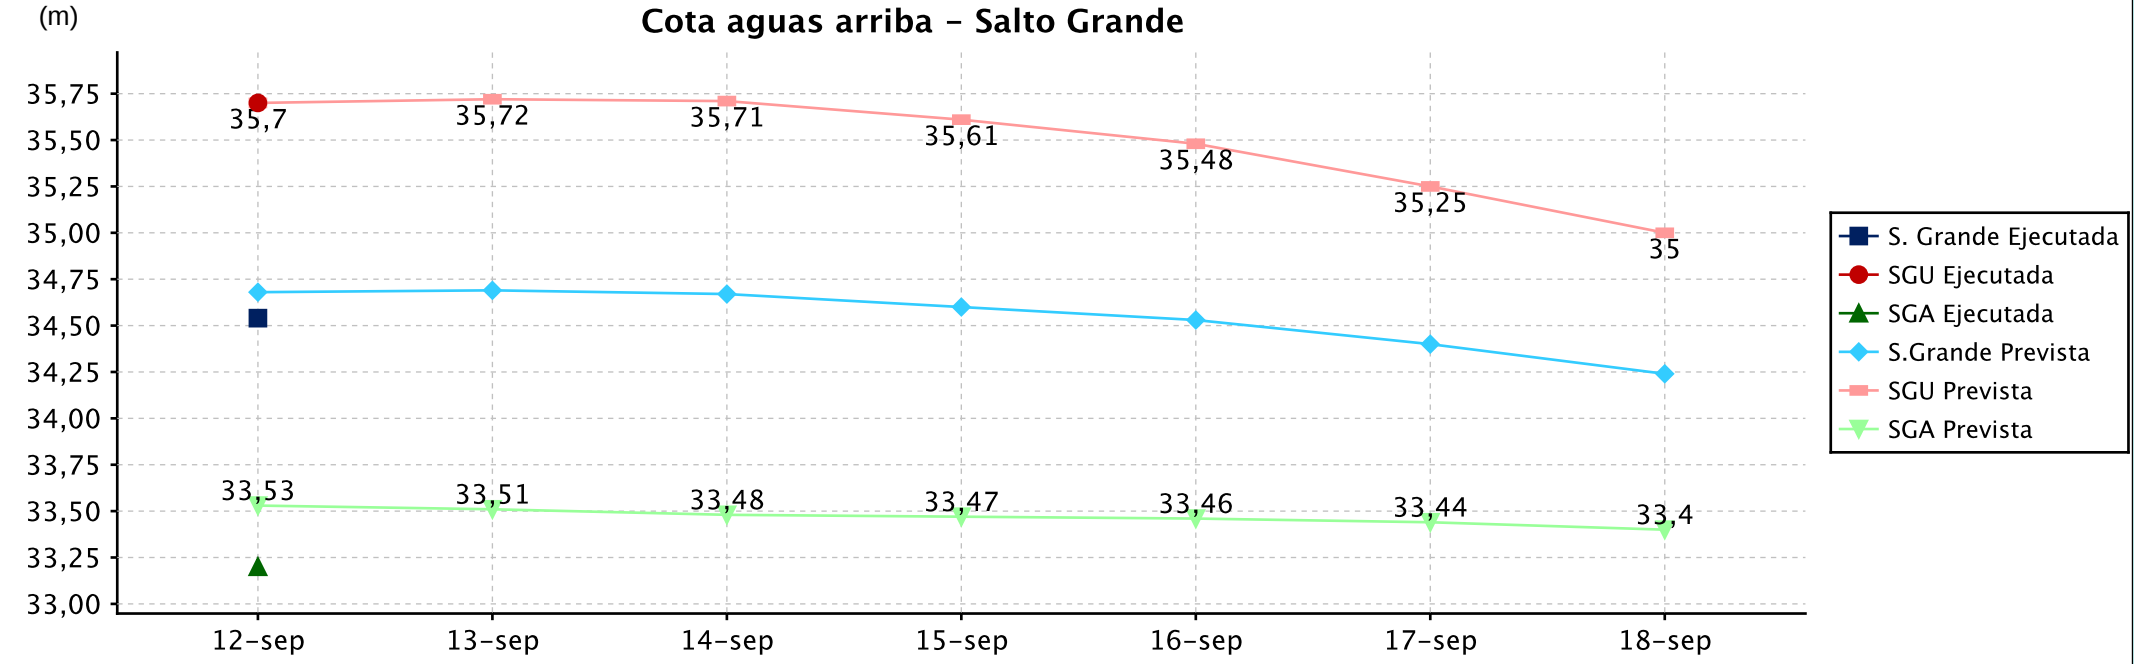

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,70
Cota Vista Arg	33,20
Cota real	34,54
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	54.887

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	651
Baygorria	577	583
Palmar	839	837
SGU	1.657	1.727

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	443
Baygorria	0	77
Palmar	0	59
SGU	1.350	1.280

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	161
Baygorria	200	215
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
