




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 15 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-4
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.865
Baygorria	1.619
Palmar	3.752
Salto Grande	4.854
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.993
TOTAL Generación	27.068

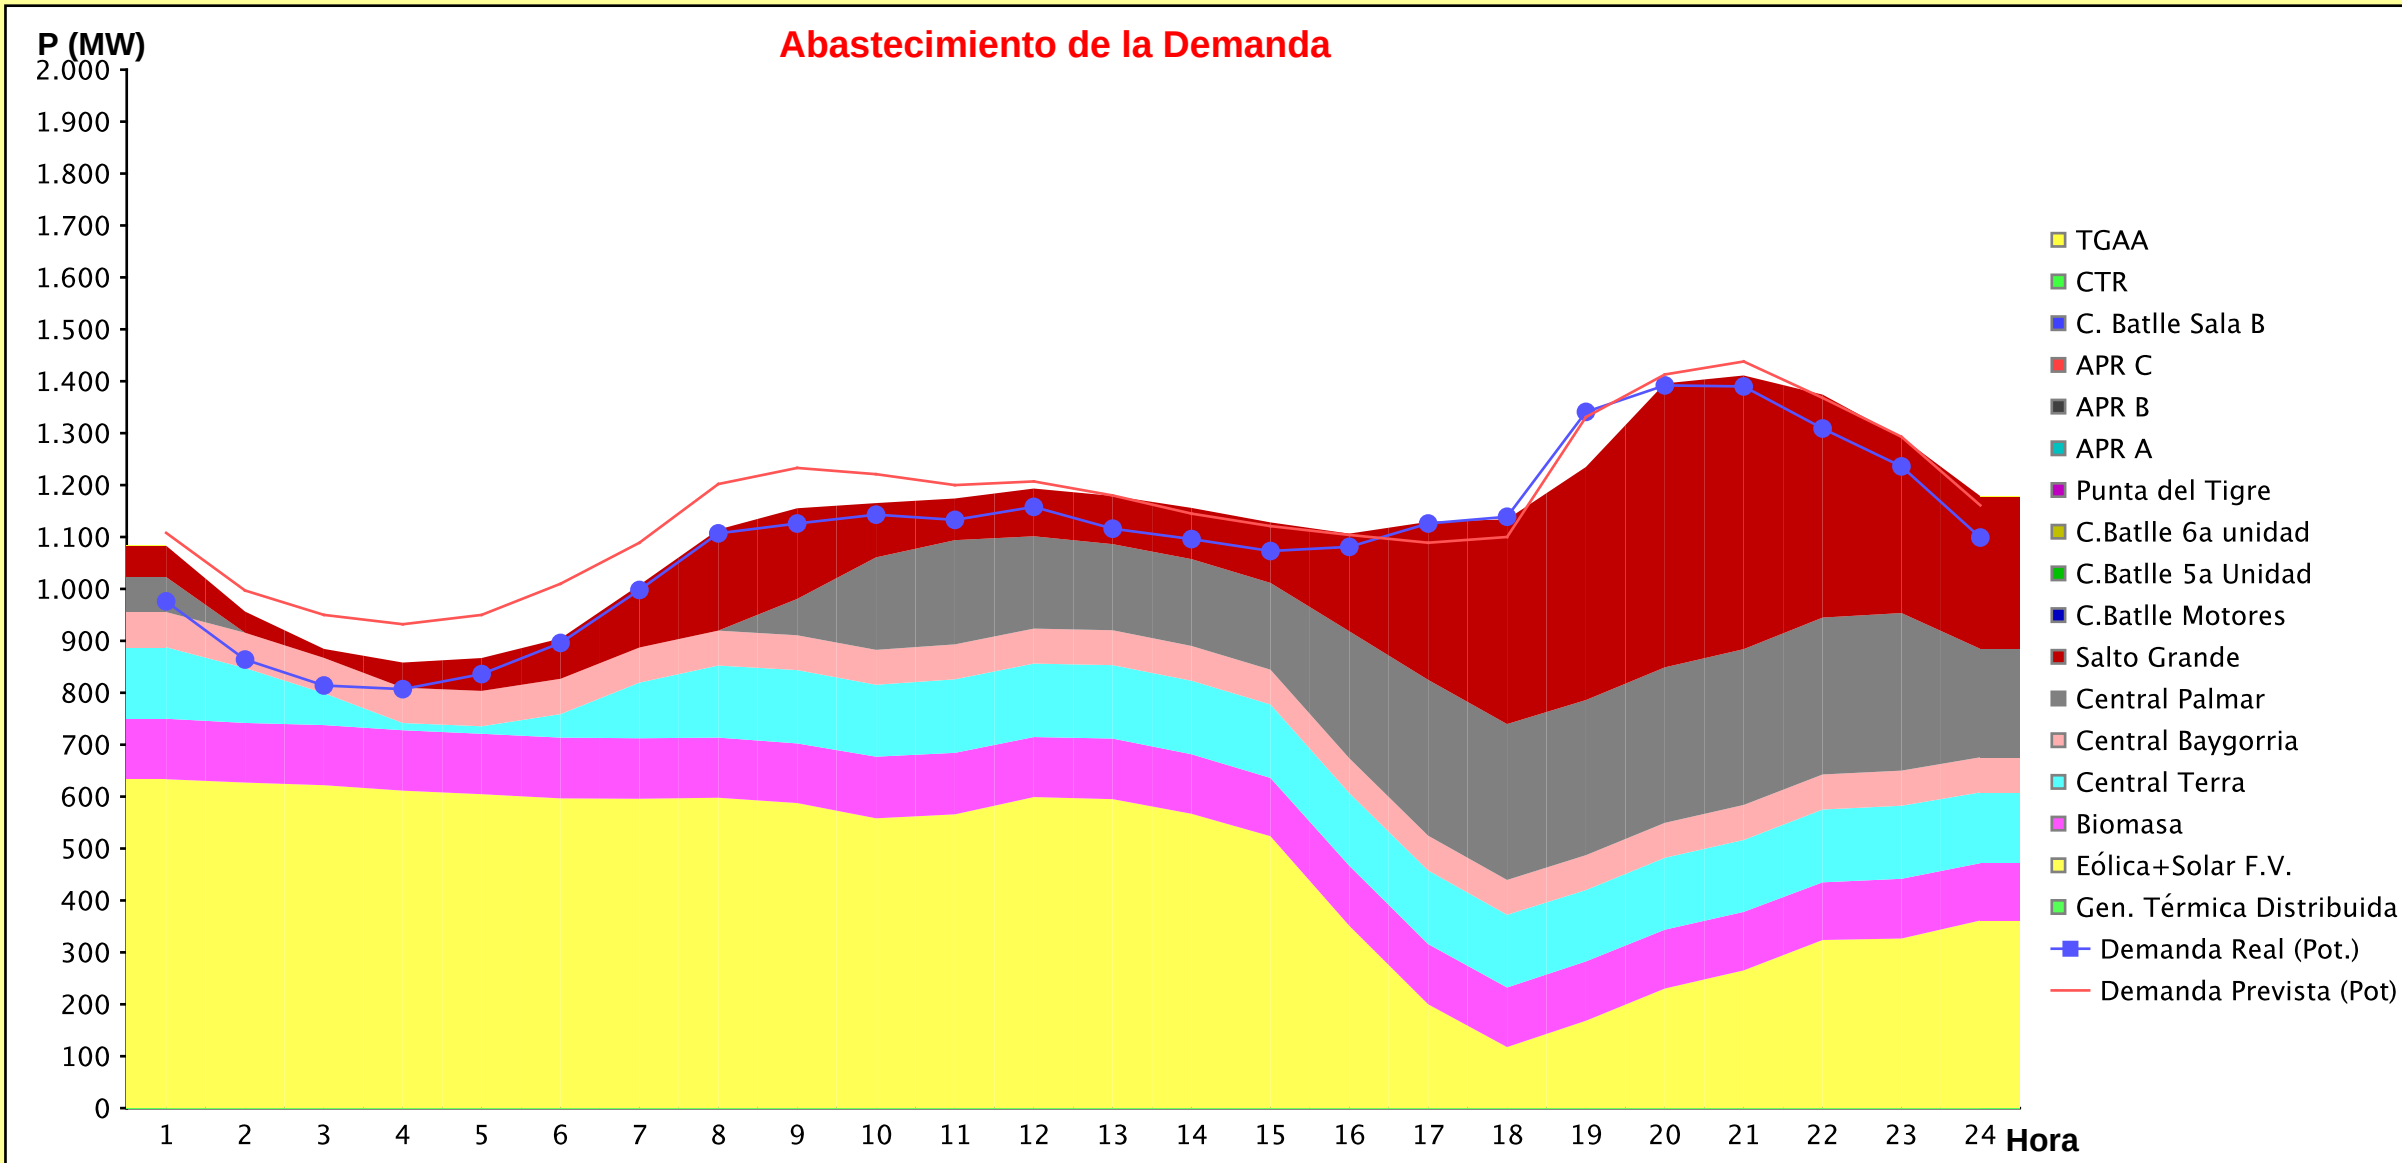

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.068
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	27.842
Diferencia (MWh)	-774
Ejecutada - Programada	-2,78 %

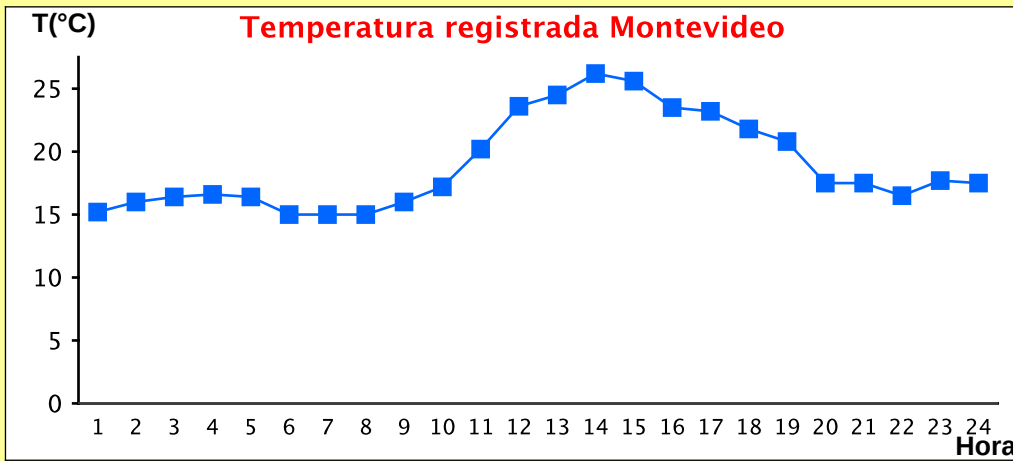

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1274 Hora 11:48
Potencia mínima:	862 Hora 03:59
Pico noche:	1454 Hora 20:28


Generación Media (MW)	
Eólica	466,1
Biomasa	115,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

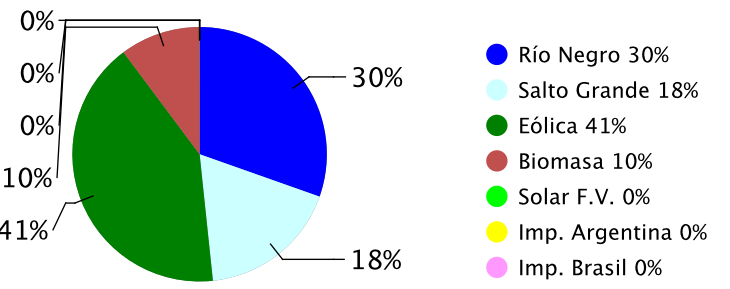



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)





EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

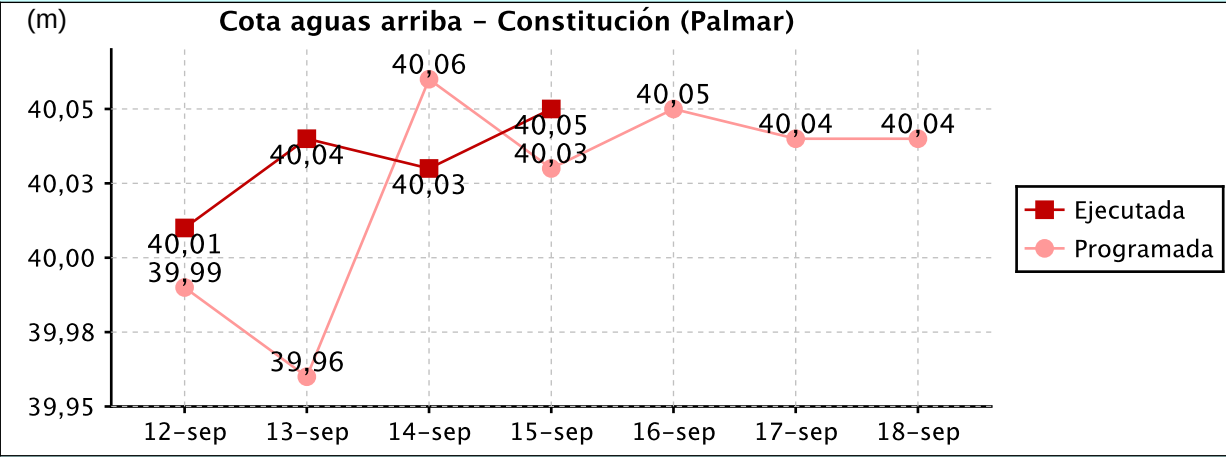
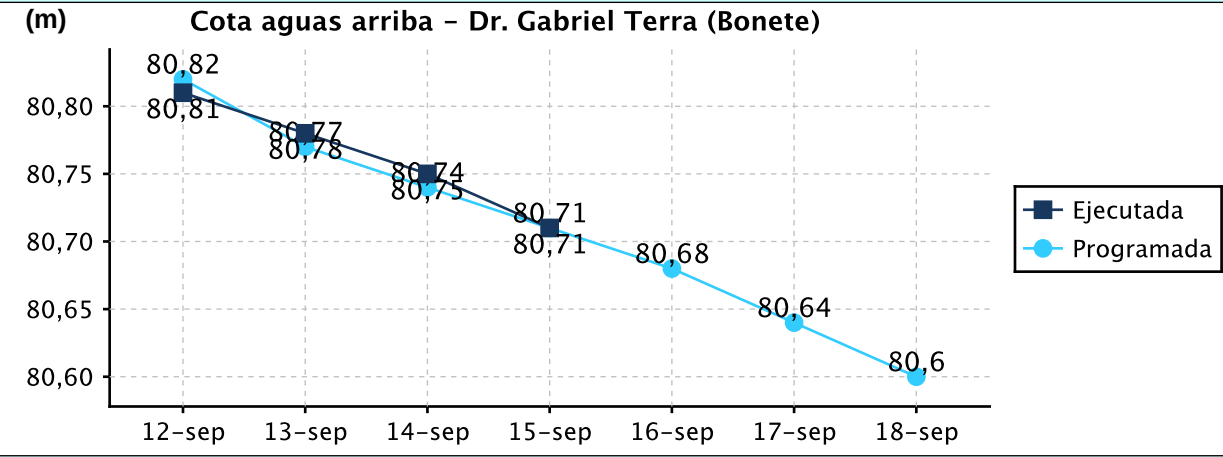


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,71	80,71
Baygorria	54,19	54,2
Palmar	40,03	40,05
SGU	35,91	35,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

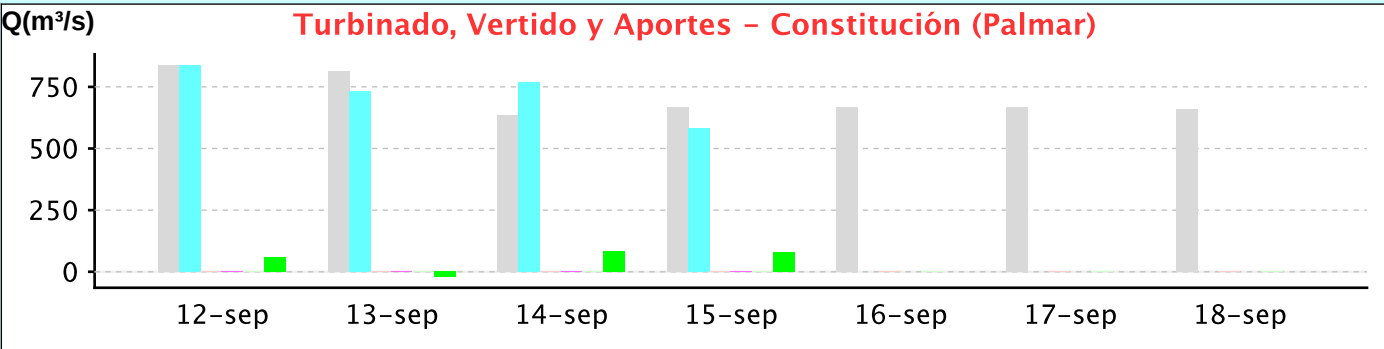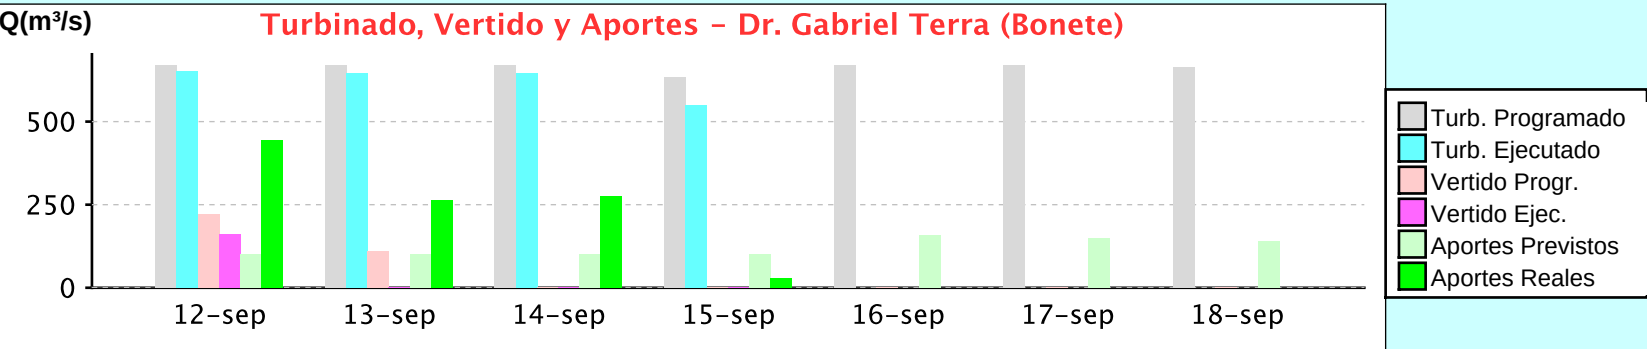

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

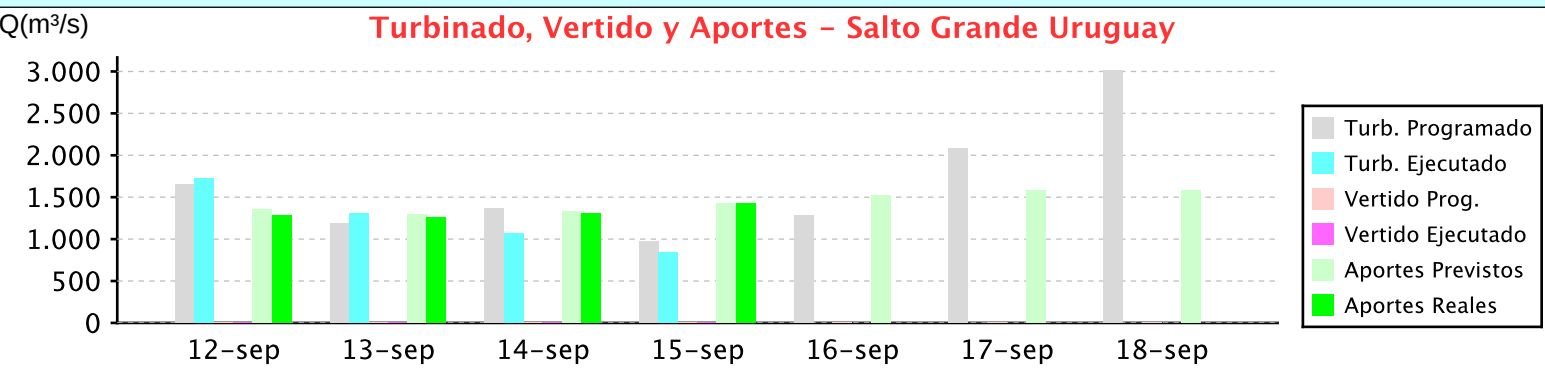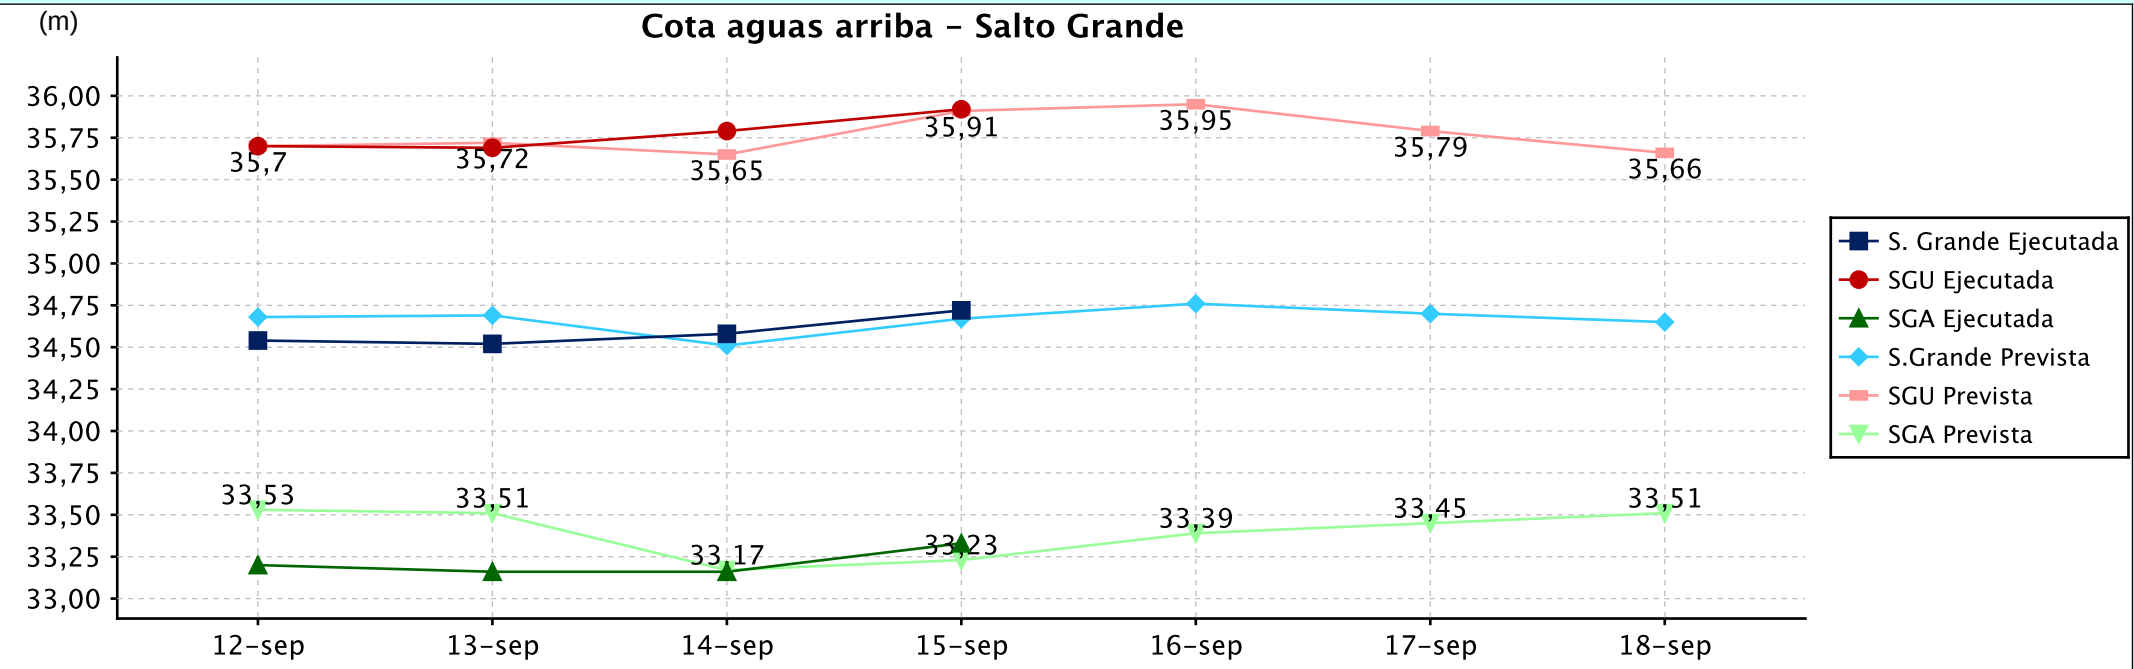

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,92
Cota Vista Arg	33,33
Cota real	34,72
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	57.849

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	633	550
Baygorria	577	591
Palmar	667	581
SGU	975	842

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	30
Baygorria	0	26
Palmar	0	80
SGU	1.425	1.420

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	100	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
