




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 16 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-6
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.936
Baygorria	1.693
Palmar	4.157
Salto Grande	8.350
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	10.962
TOTAL Generación	28.080

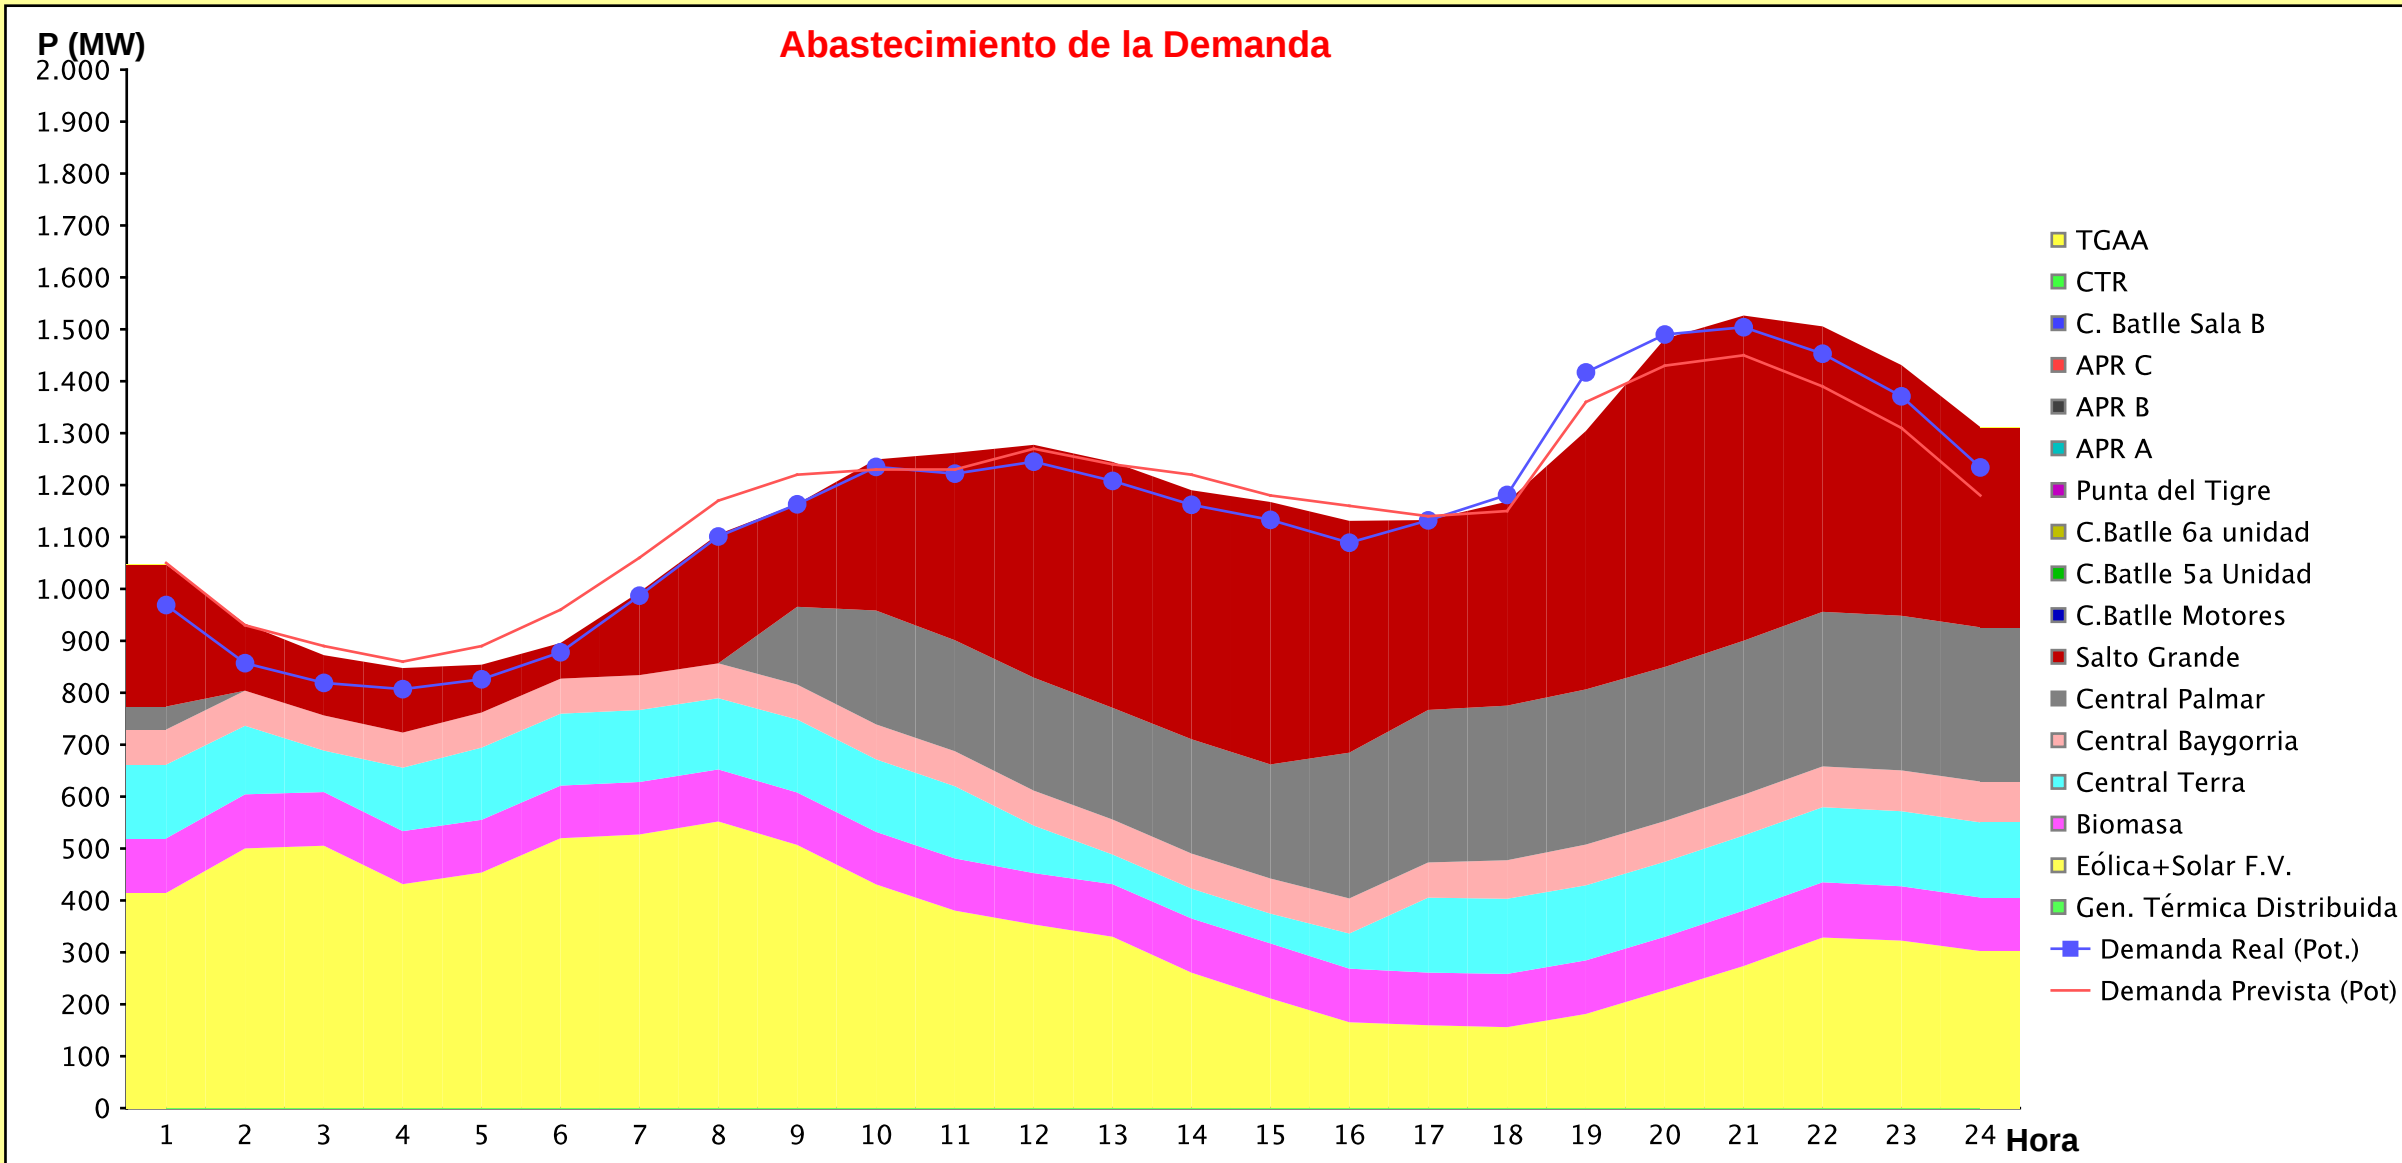

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.080
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.970
Diferencia (MWh)	110
Ejecutada - Programada	0,39 %

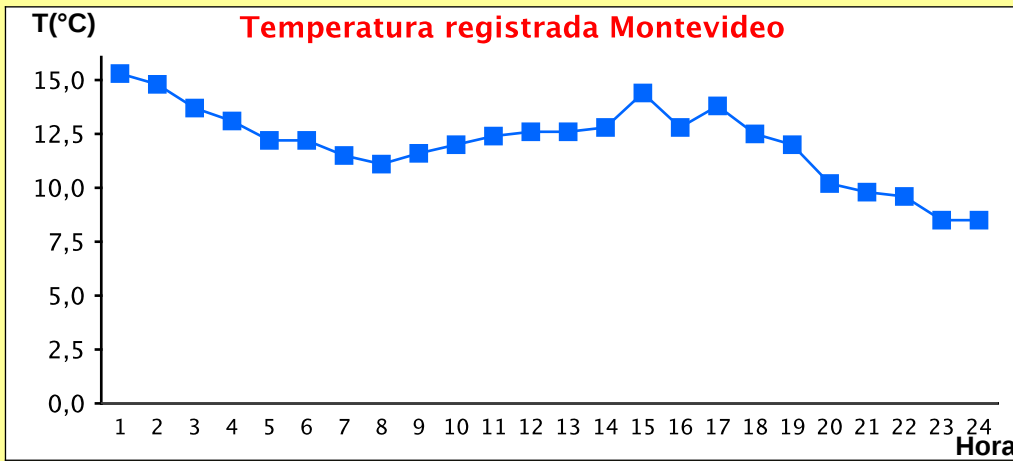


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1334 Hora 11:44
Potencia mínima:	848 Hora 03:35
Pico noche:	1547 Hora 20:37

Generación Media (MW)	
Eólica	353,5
Biomasa	103,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

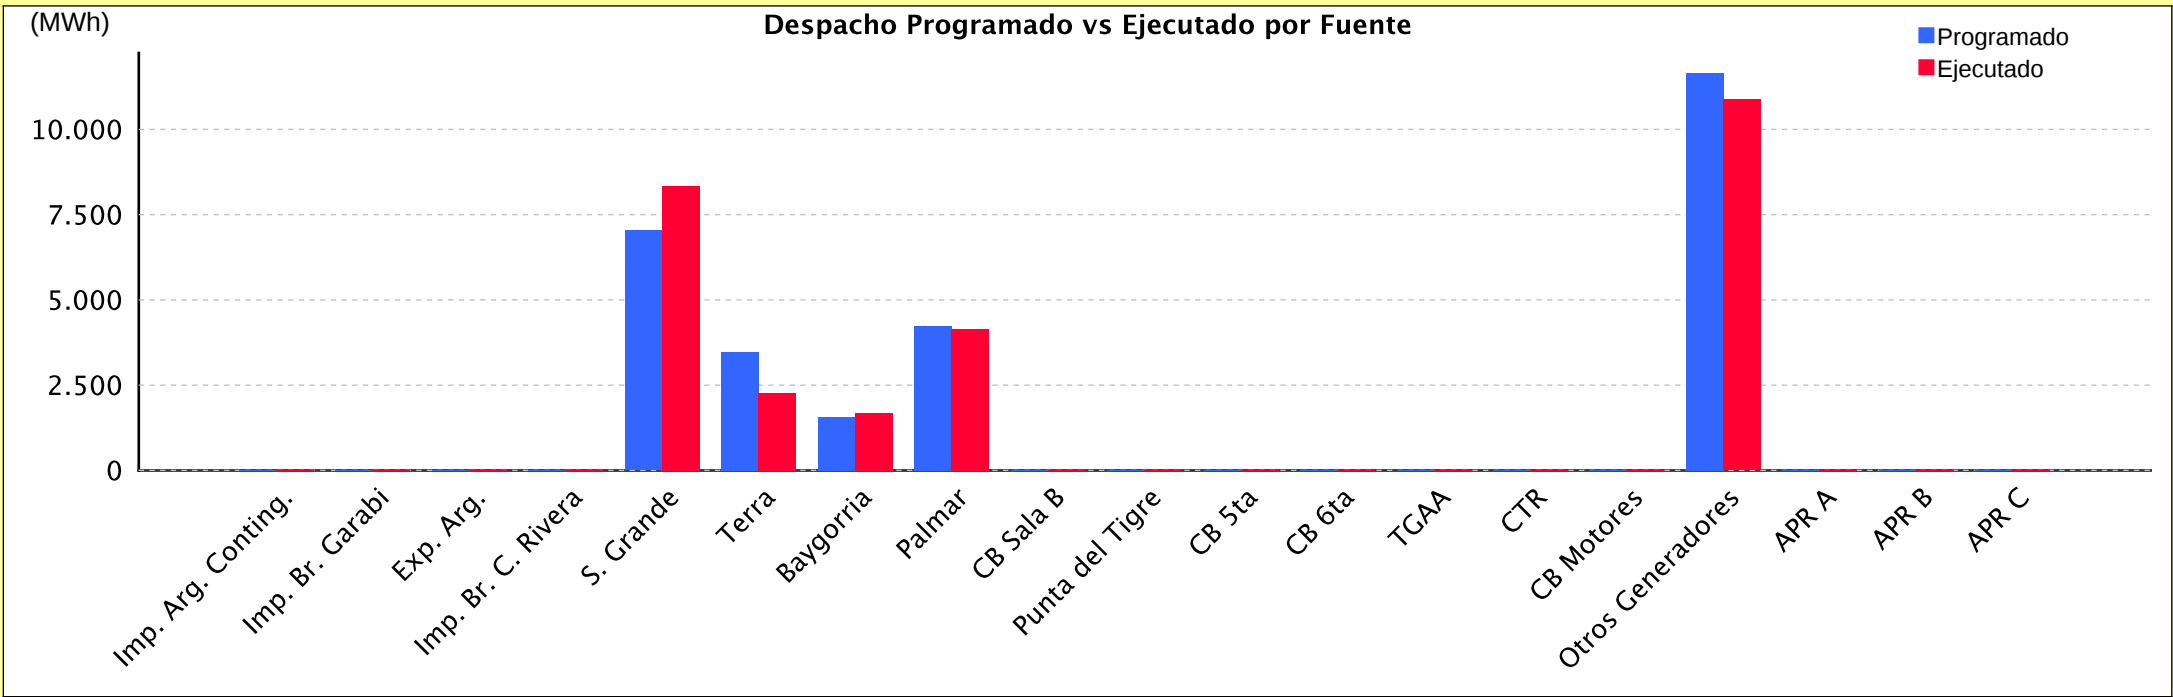
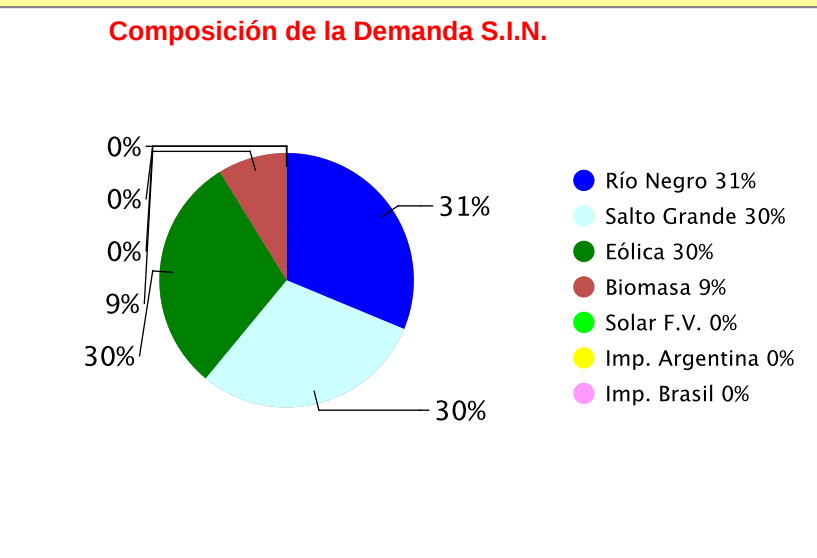


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

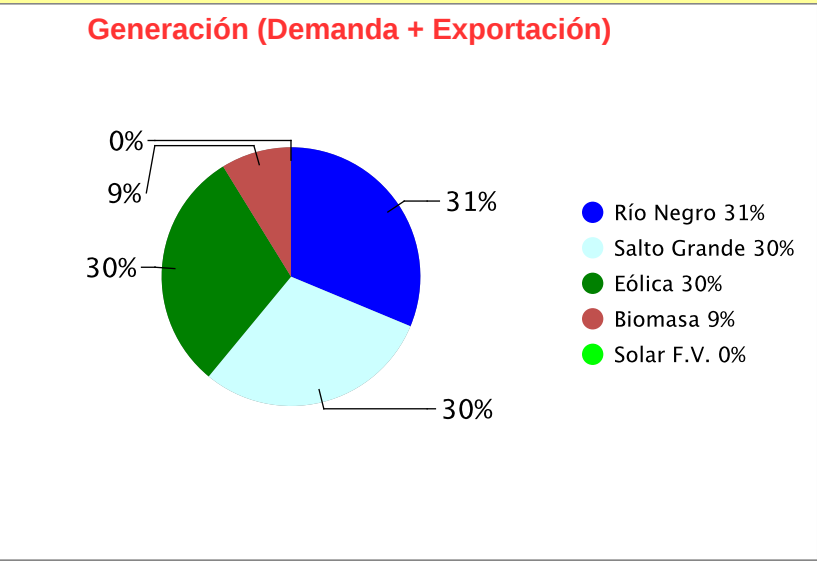



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

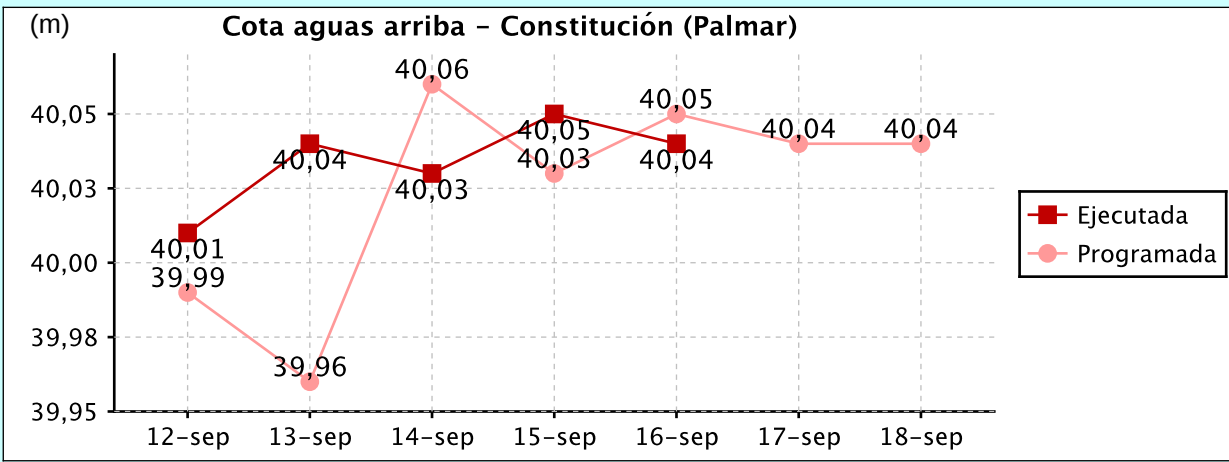
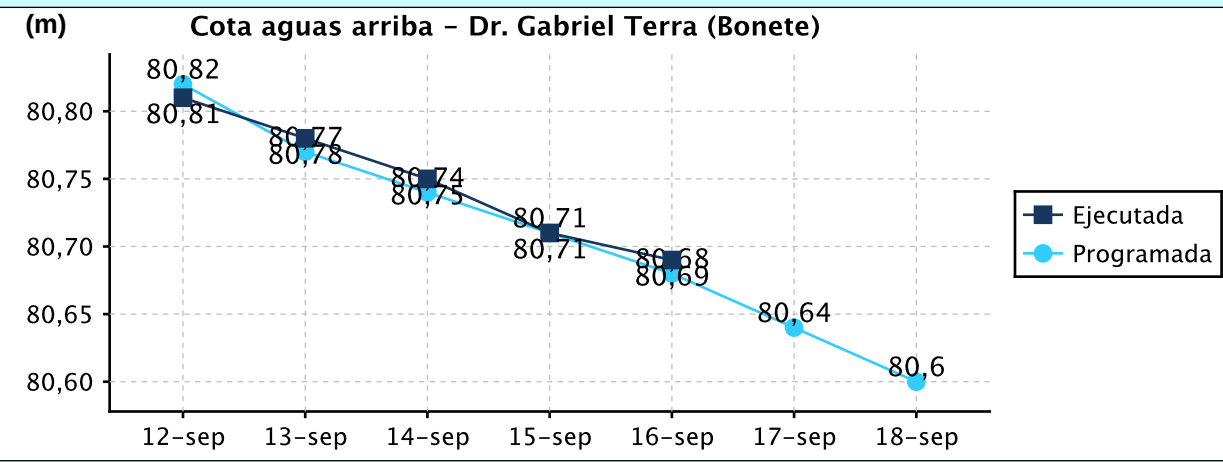


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,68	80,69
Baygorria	54,21	54,17
Palmar	40,05	40,04
SGU	35,95	35,9

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

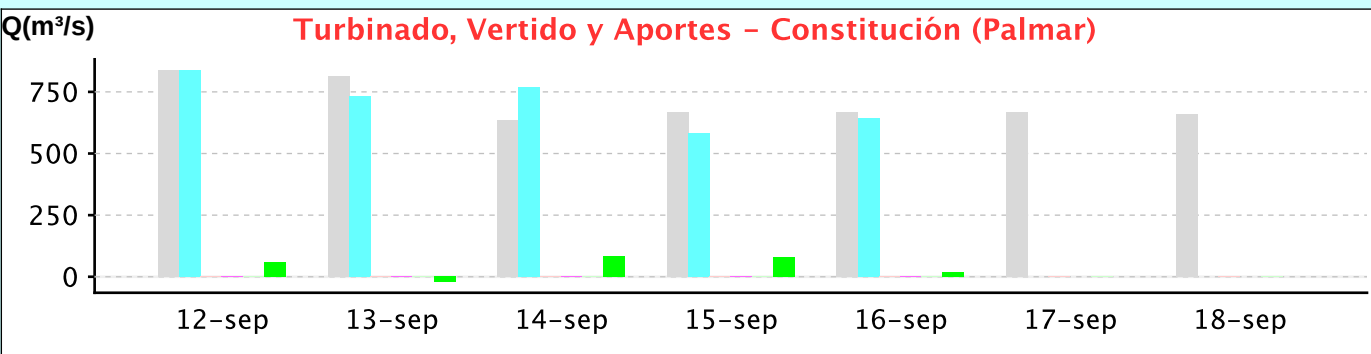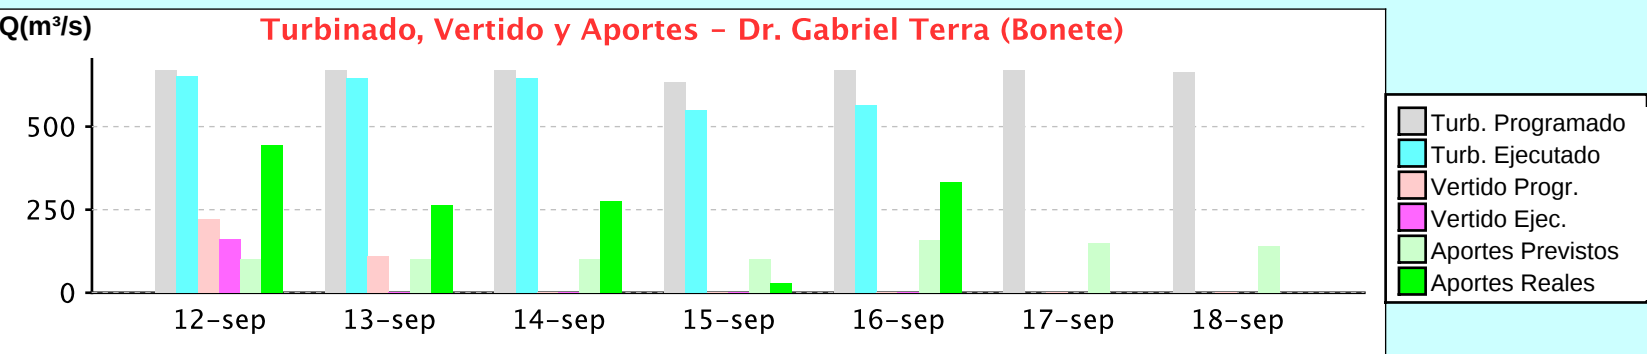

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

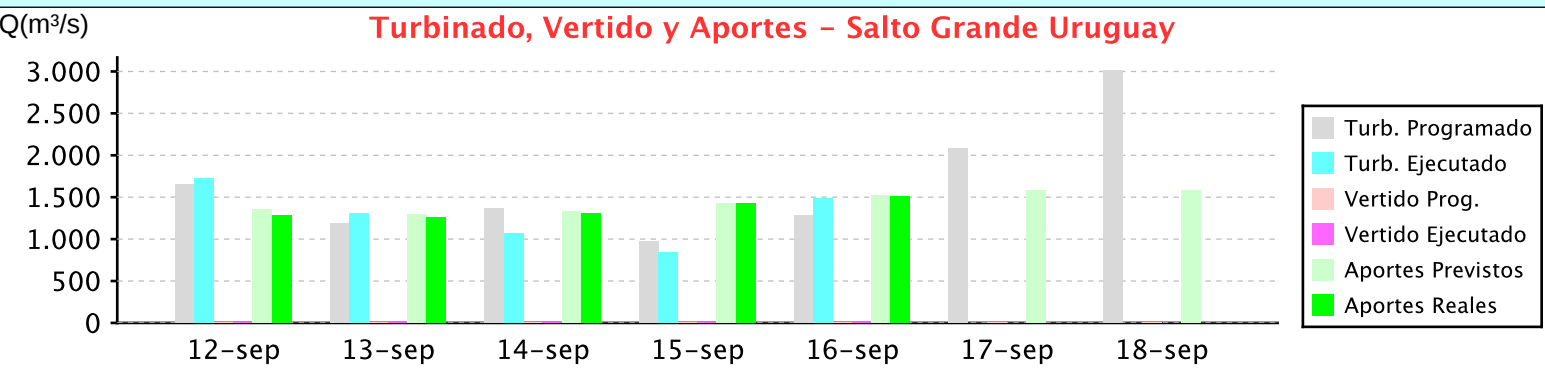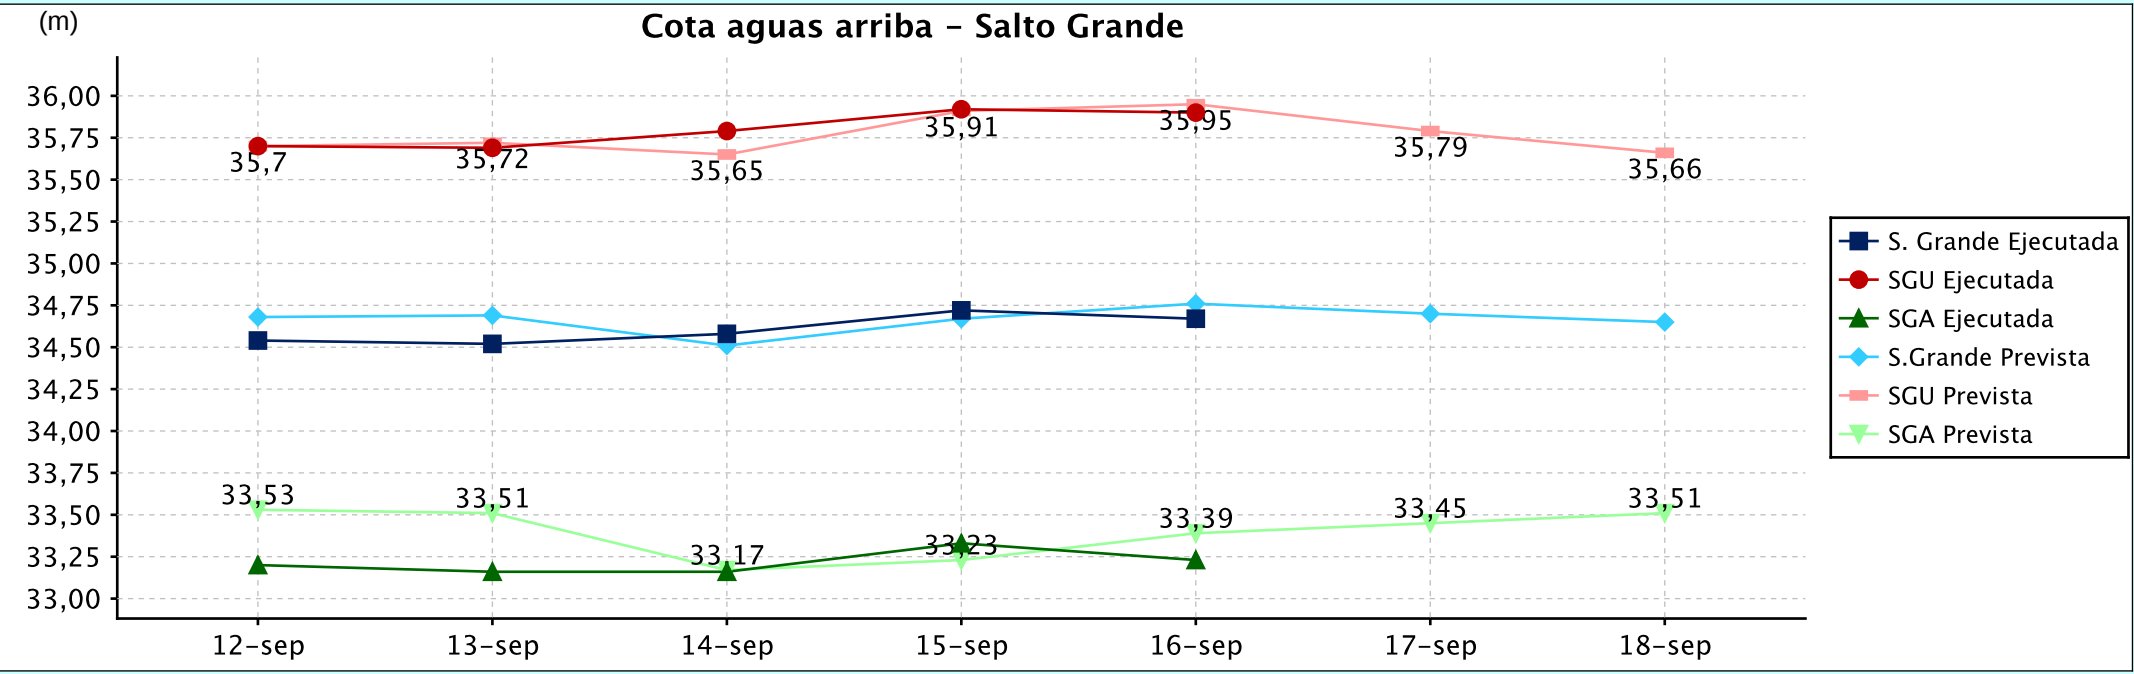

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,90
Cota Vista Arg	33,23
Cota real	34,67
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	59.388

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	564
Baygorria	577	609
Palmar	667	641
SGU	1.288	1.487

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	157	332
Baygorria	0	7
Palmar	0	18
SGU	1.525	1.506

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	60	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
