




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 17 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-8
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.434
Baygorria	1.911
Palmar	4.406
Salto Grande	11.822
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	7.500
TOTAL Generación	29.055

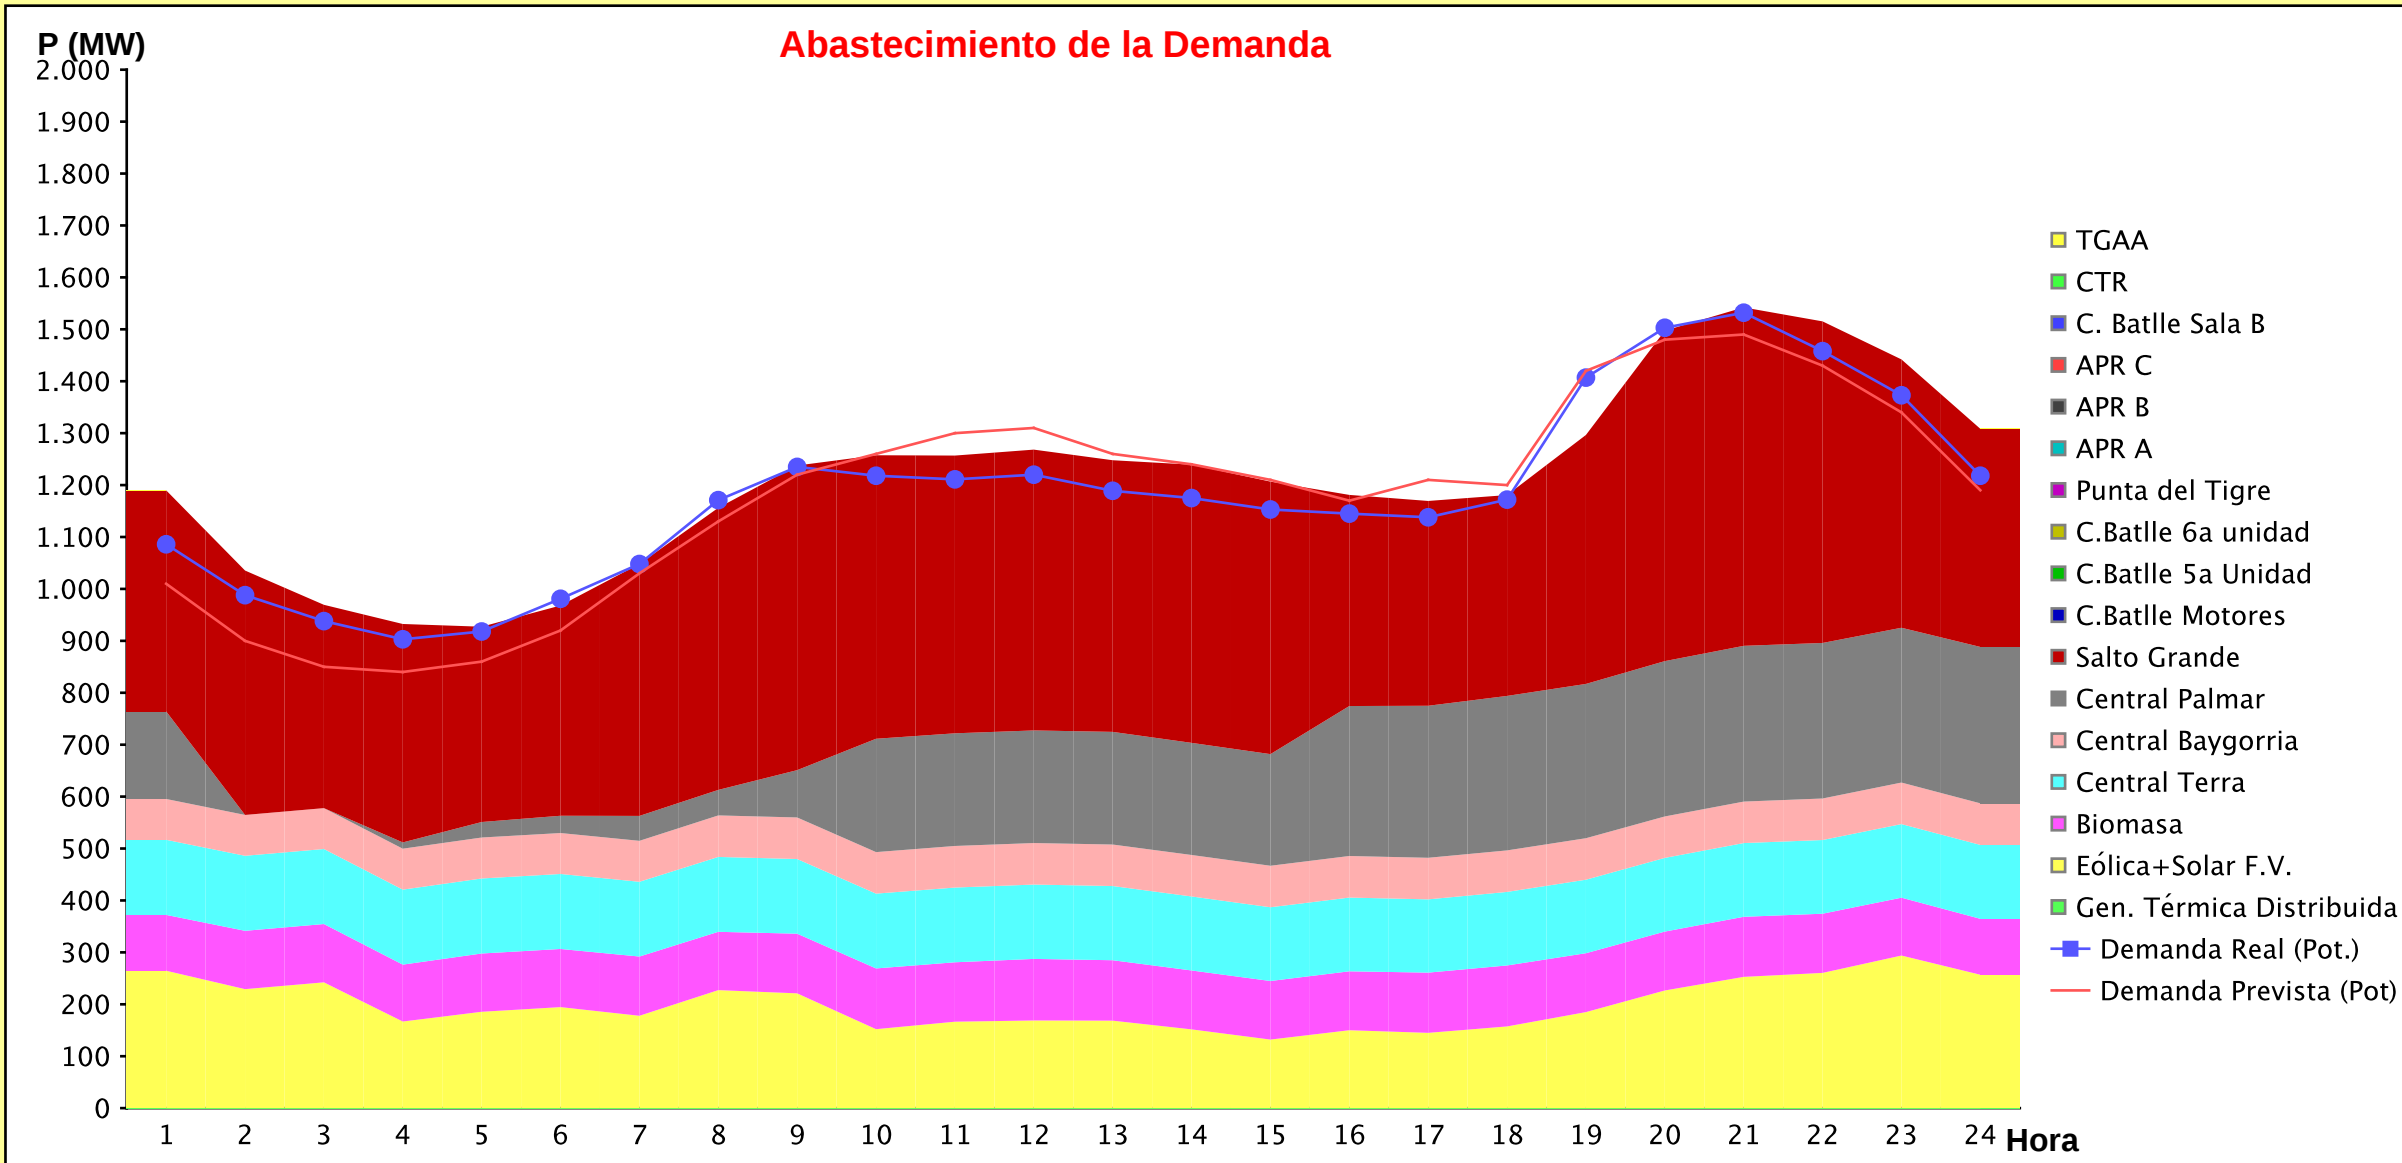

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.055
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.270
Diferencia (MWh)	785
Ejecutada - Programada	2,78 %


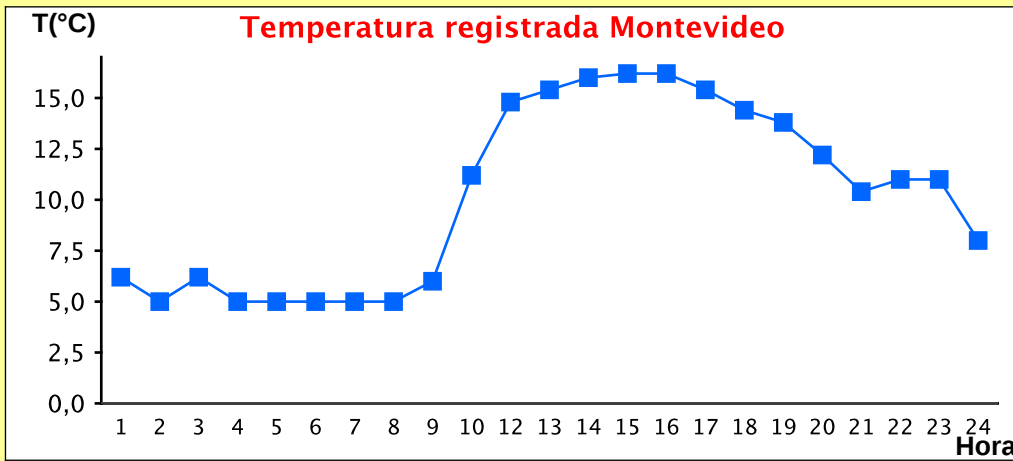


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1283 Hora 11:36
Potencia mínima:	914 Hora 03:54
Pico noche:	1556 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	187,0
Biomasa	113,7
Solar fotovoltaica	13,4
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


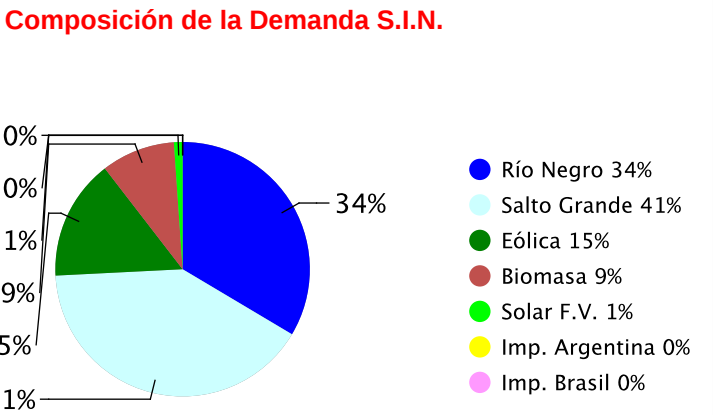


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

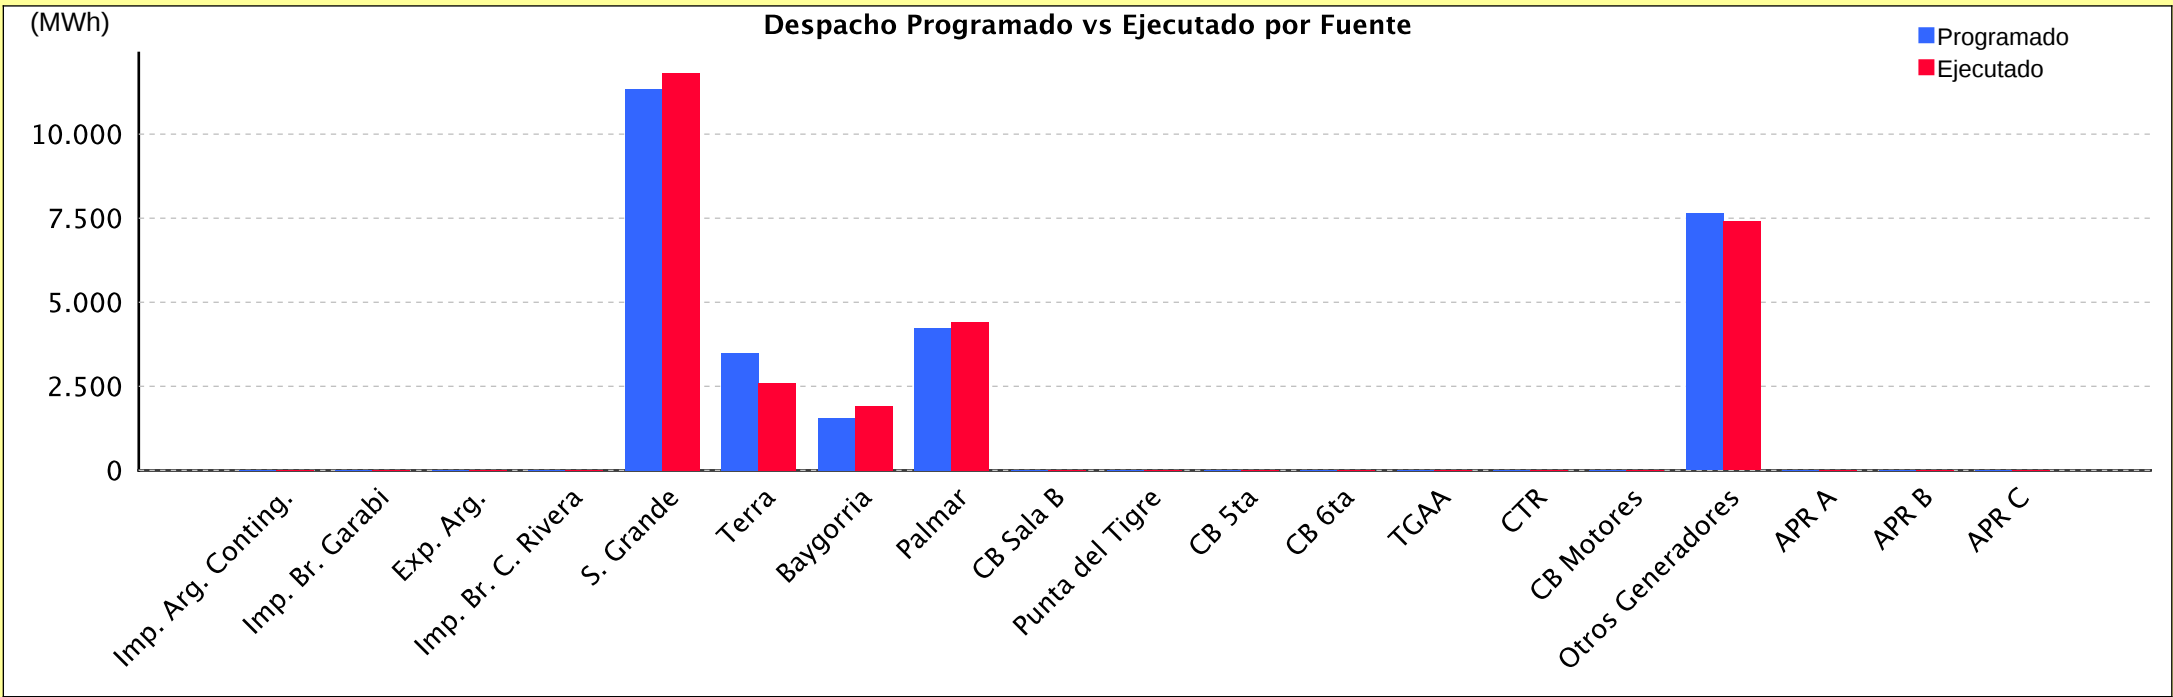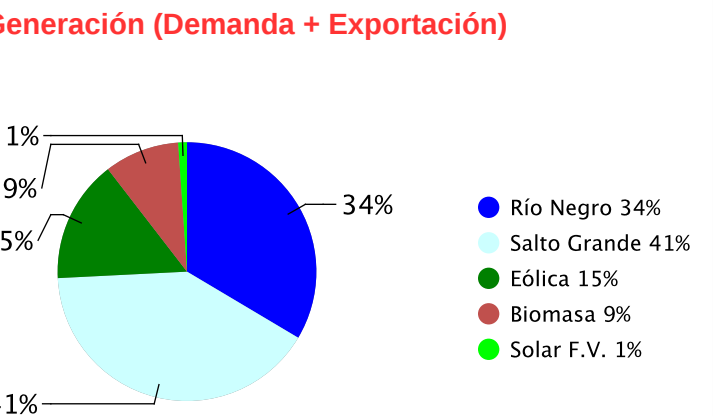



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

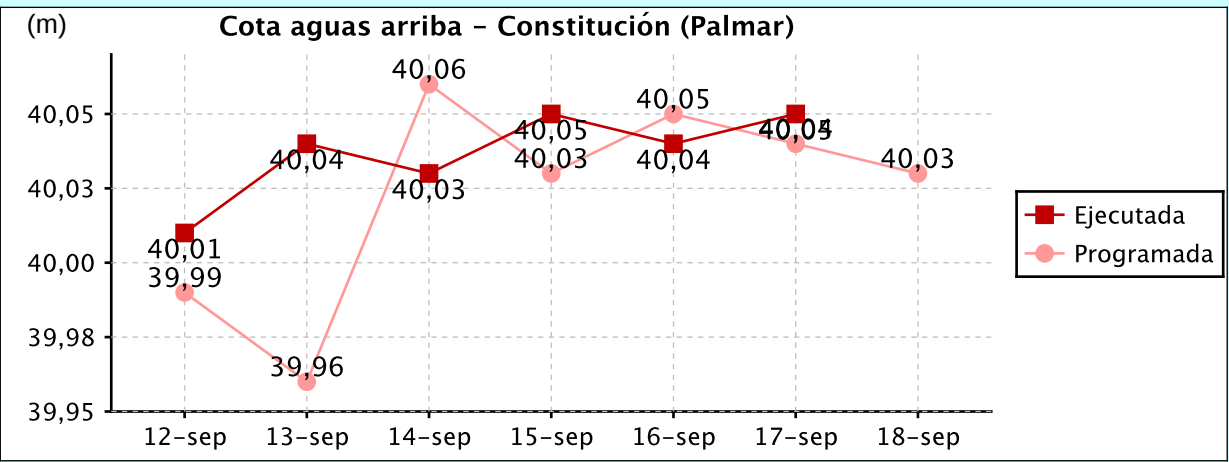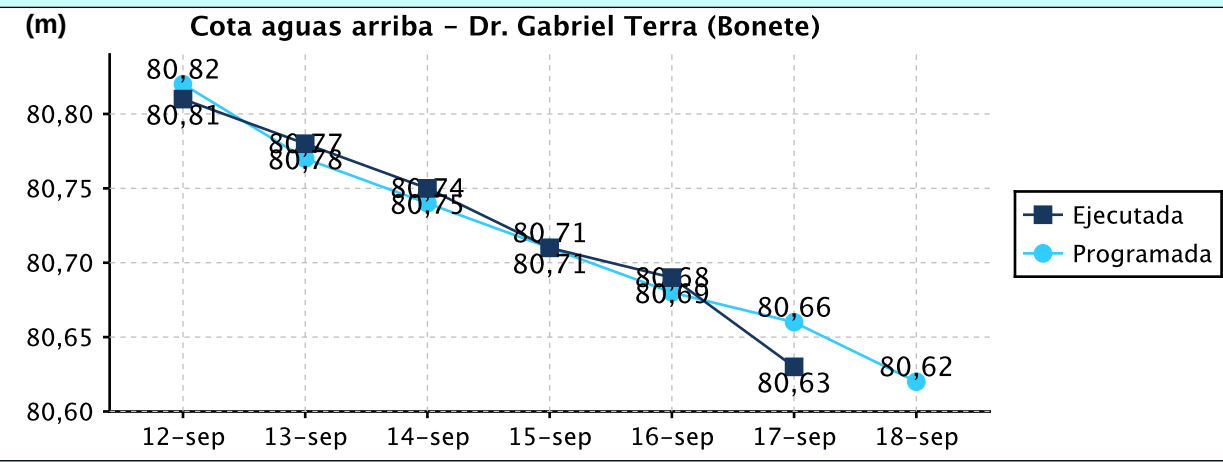


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,63
Baygorria	54,18	54,16
Palmar	40,04	40,05
SGU	35,78	35,76

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

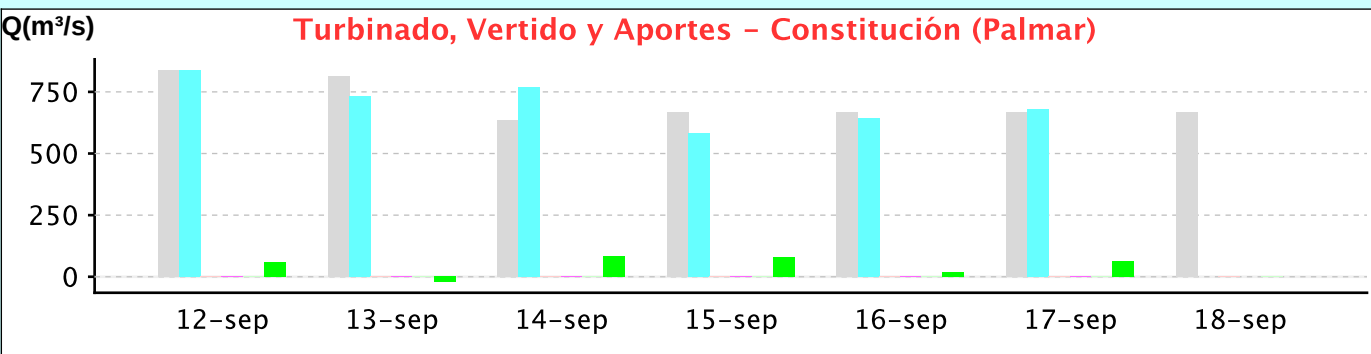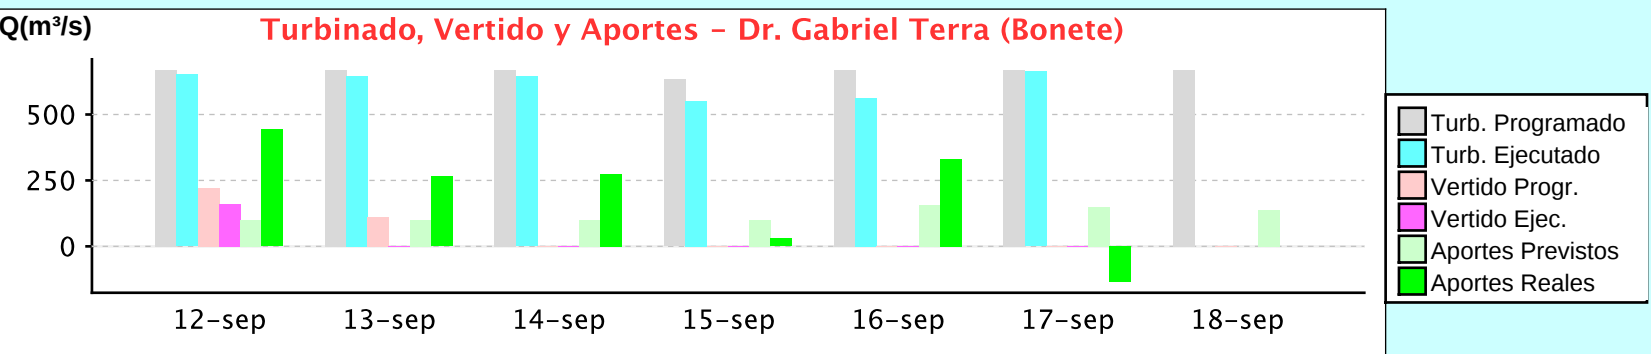

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

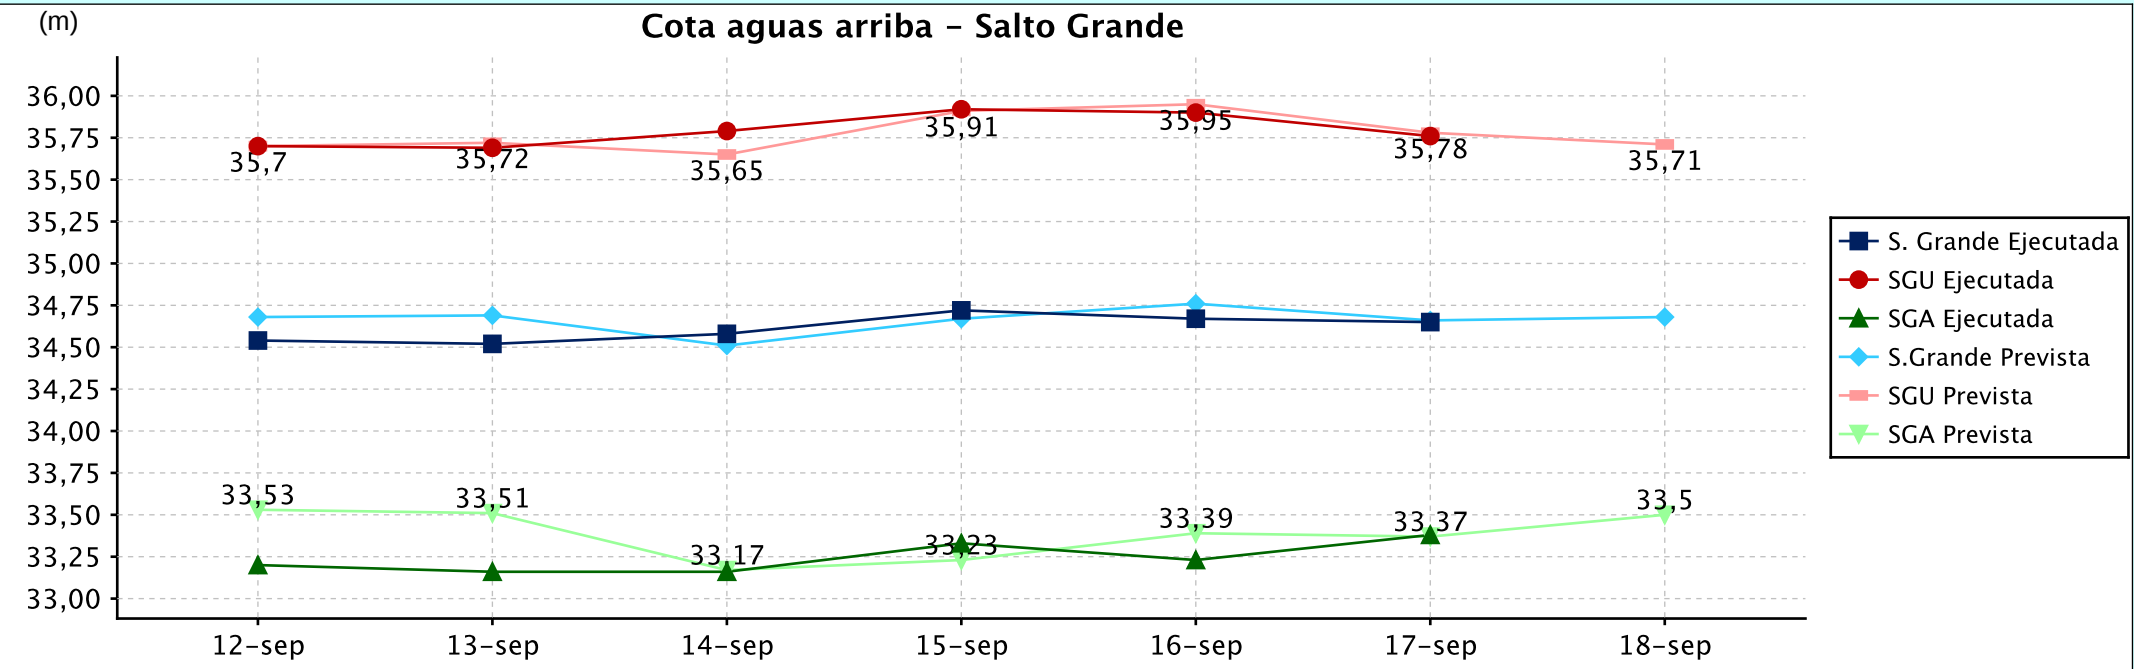


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	663
Baygorria	577	674
Palmar	667	681
SGU	2.085	2.126

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	149	-136
Baygorria	0	9
Palmar	0	62
SGU	1.575	1.582

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	60	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

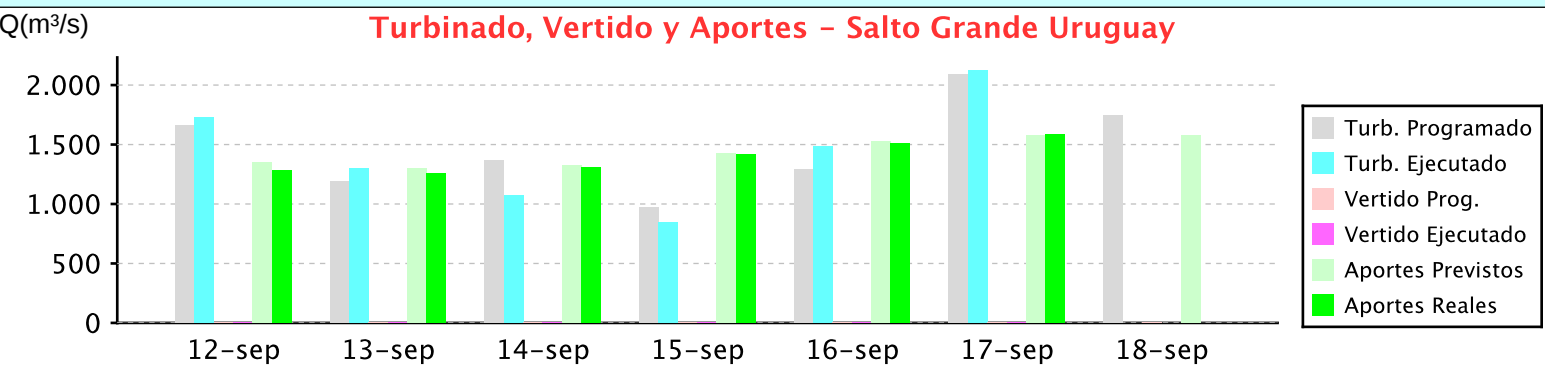

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,76
Cota Vista Arg	33,38
Cota real	34,65
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	52.911

OBSERVACIONES
