




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 18 de septiembre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-8
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.418
Baygorria	1.934
Palmar	4.528
Salto Grande	10.131
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	9.053
TOTAL Generación	29.044



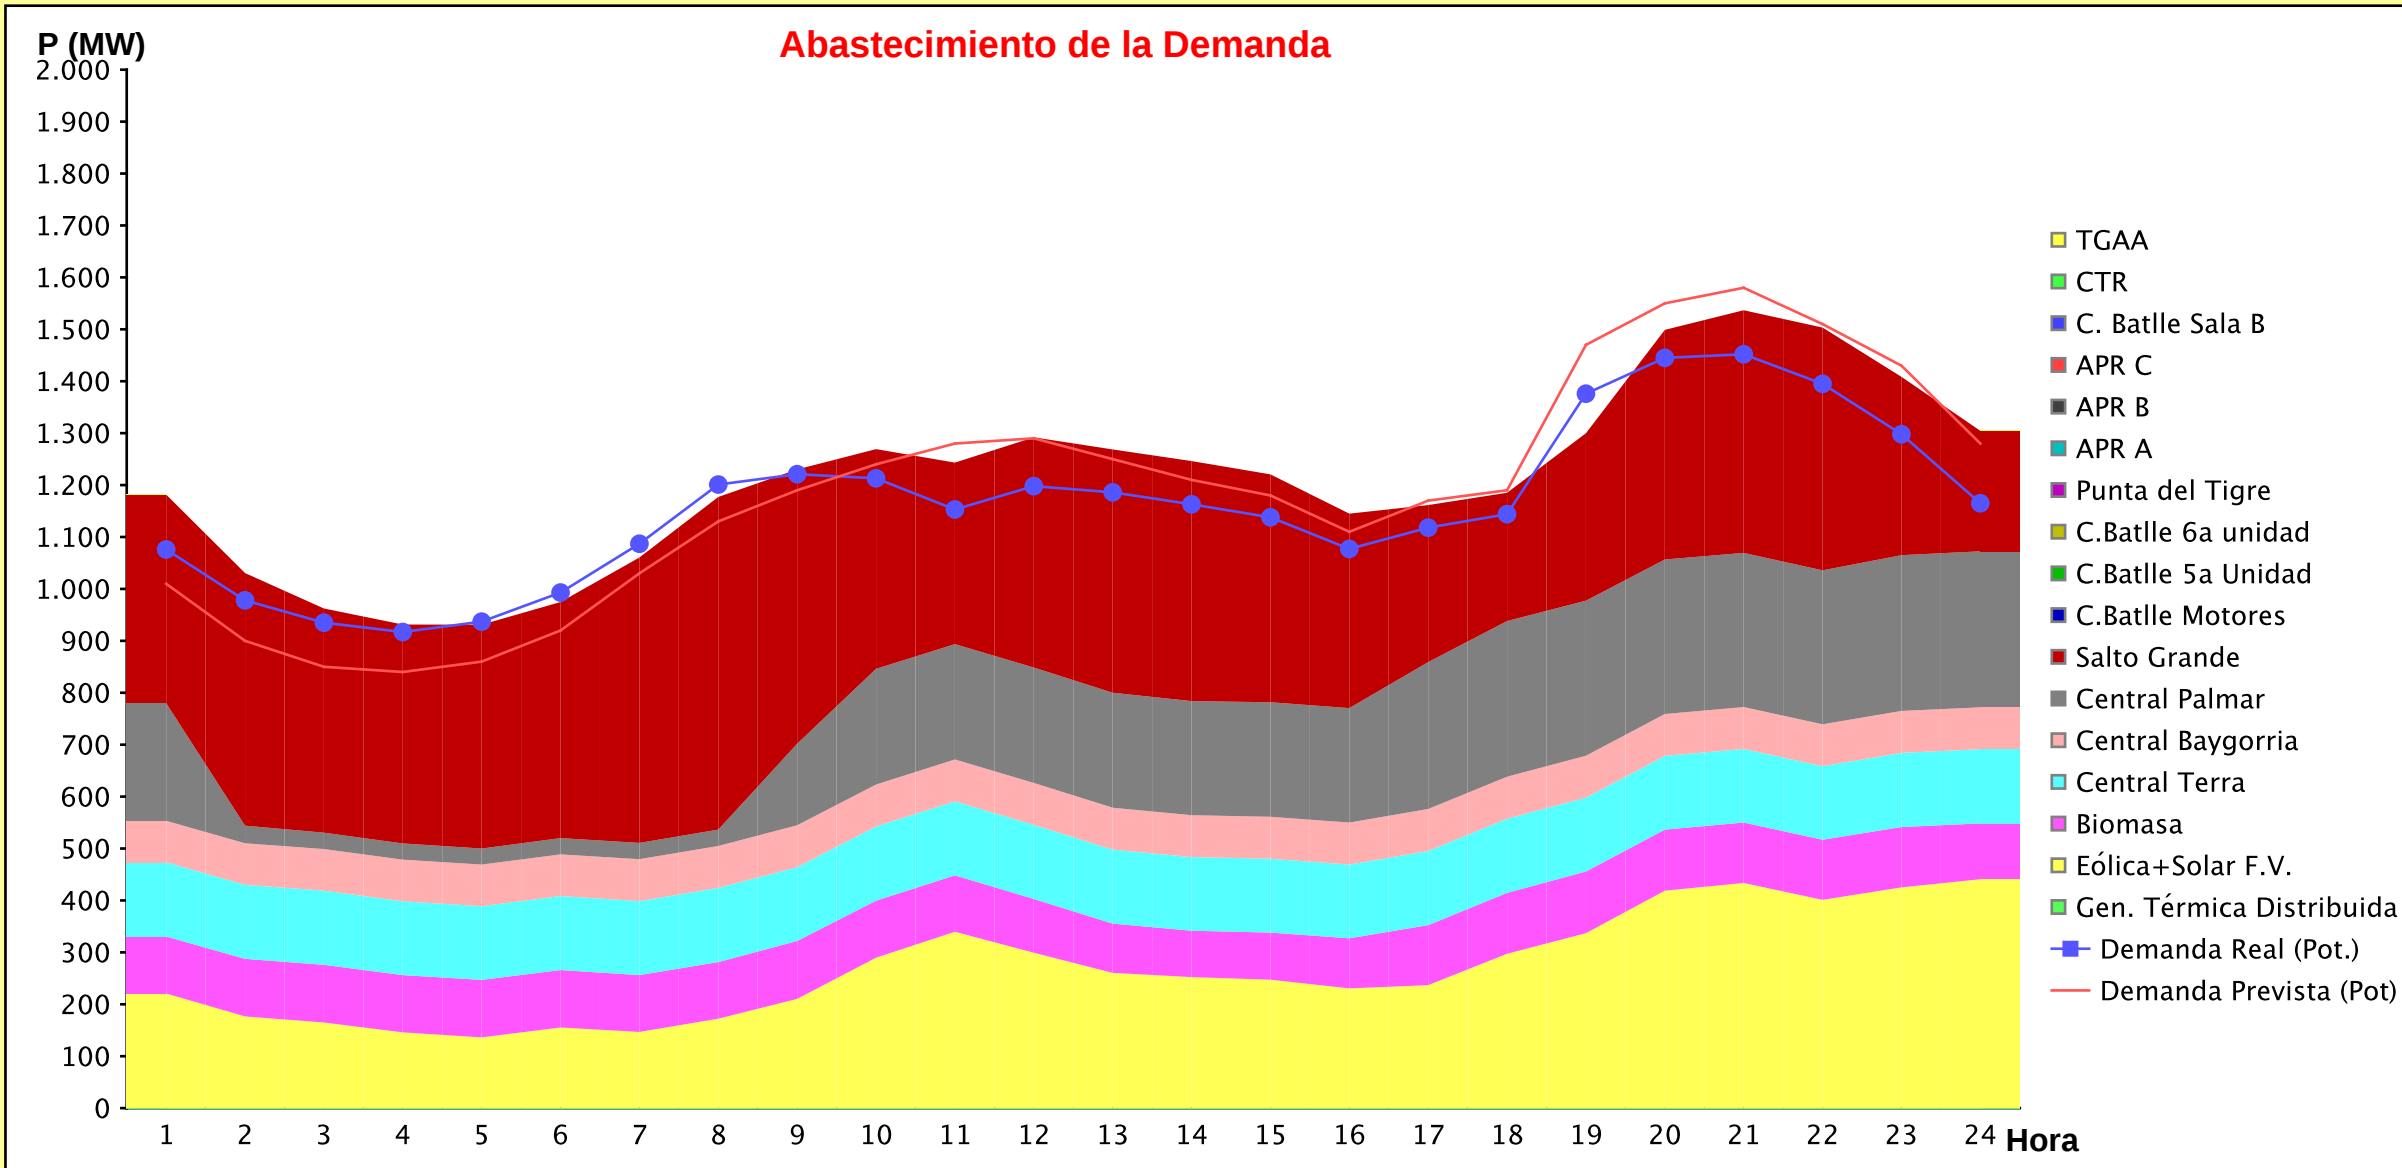


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.044
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.470
Diferencia (MWh)	574
Ejecutada - Programada	2,02 %


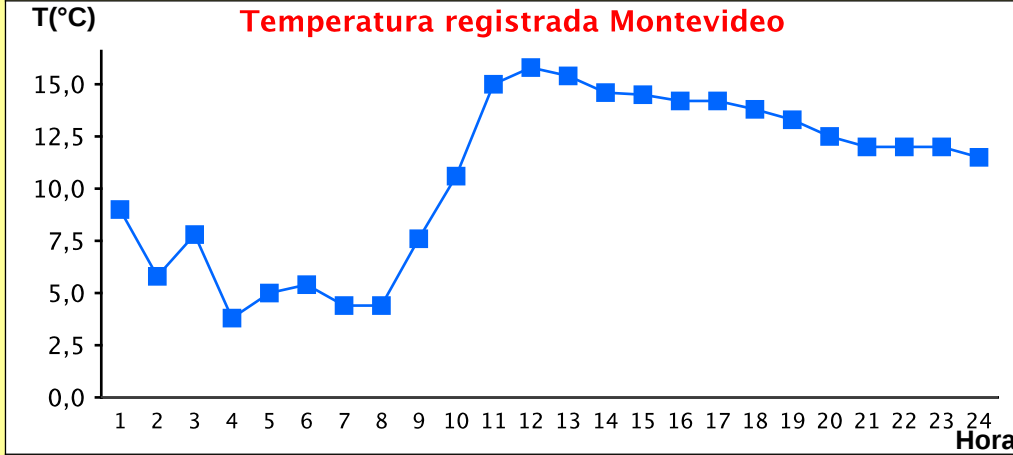


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1315 Hora 11:46
Potencia mínima:	923 Hora 03:47
Pico noche:	1565 Hora 20:33
Generación Media (MW)	
Eólica	253,4
Biomasa	109,3
Solar fotovoltaica	15,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

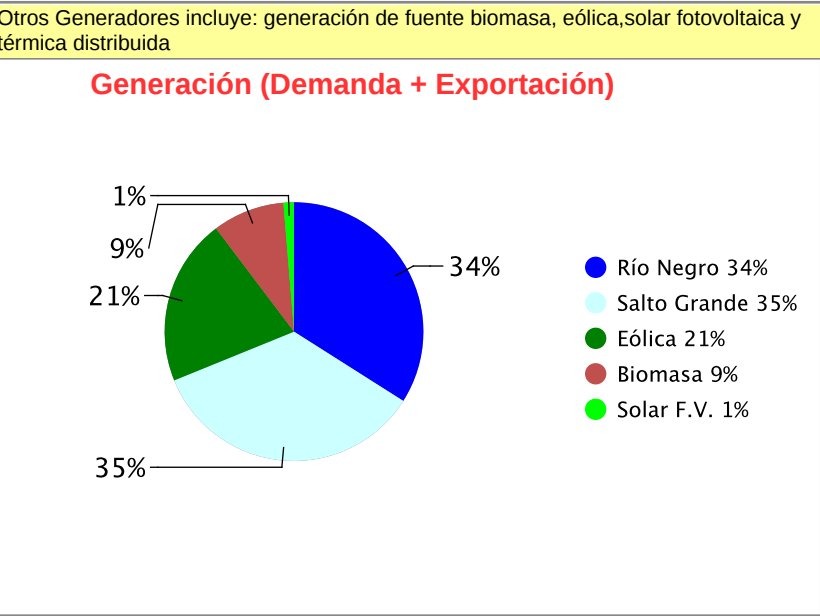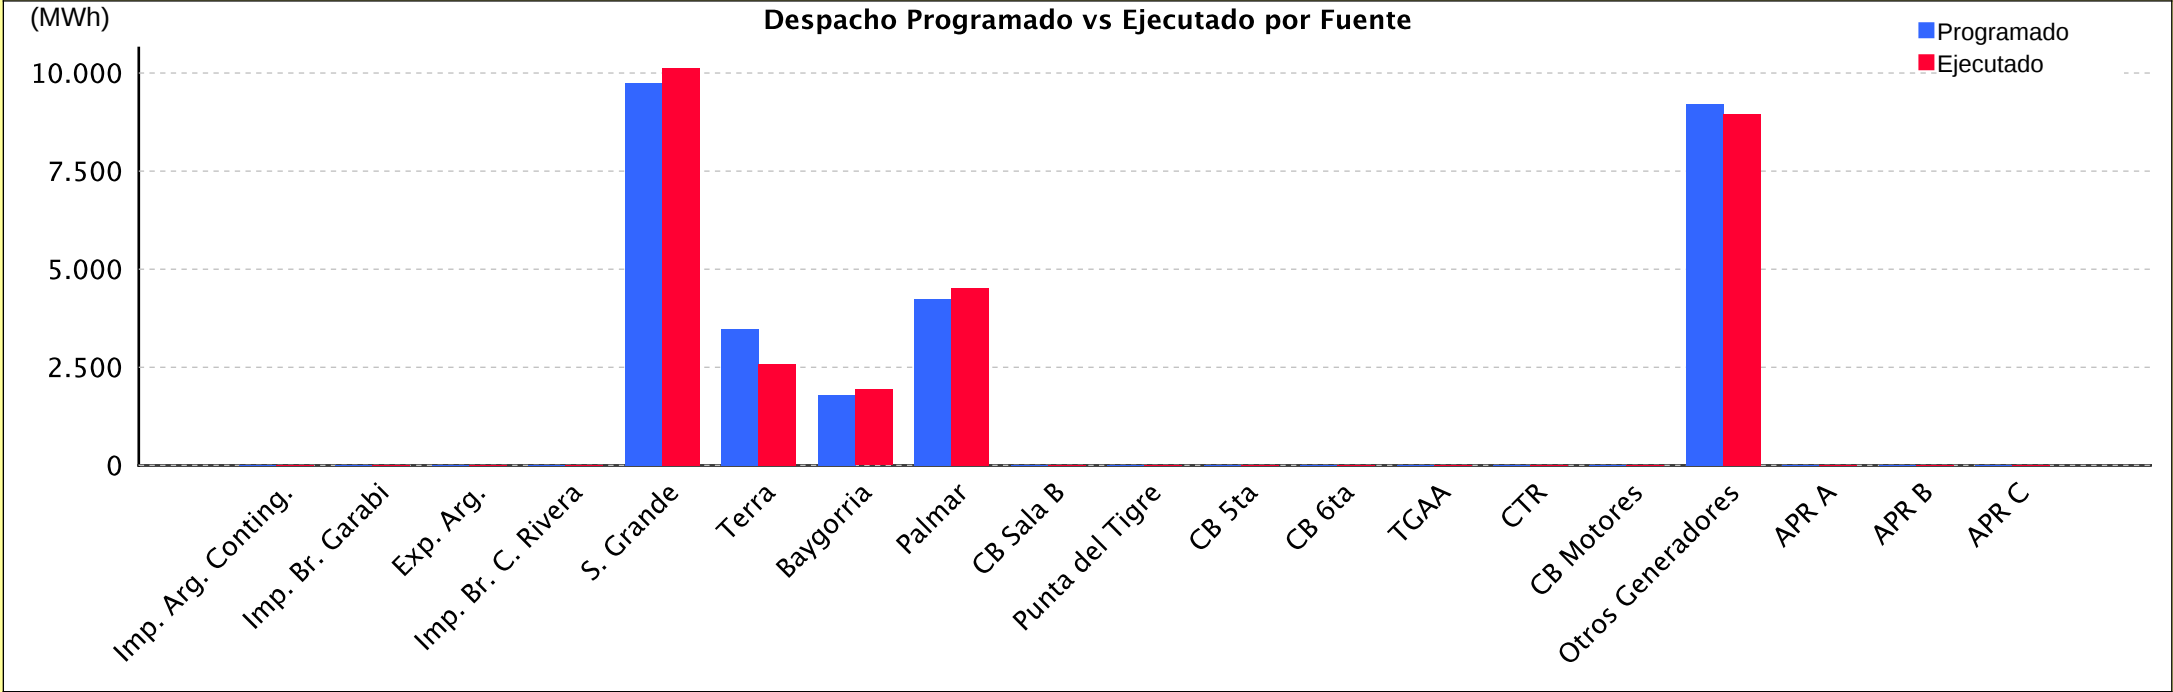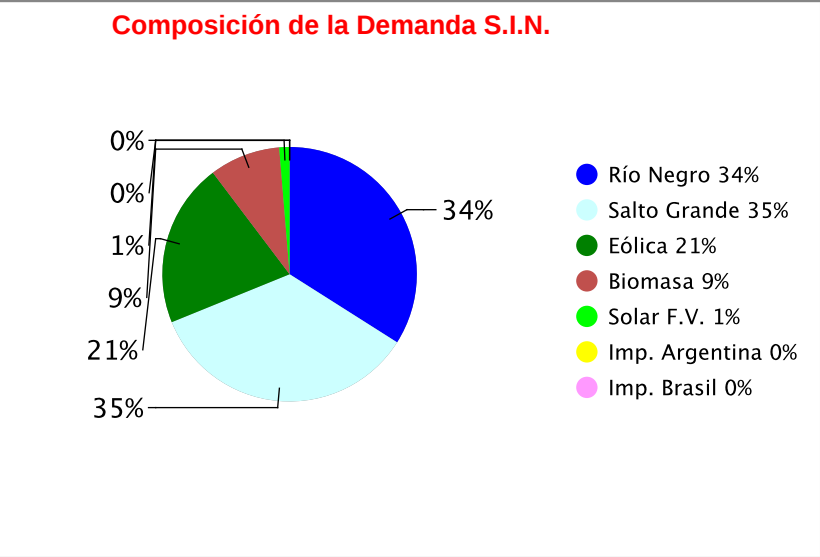



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

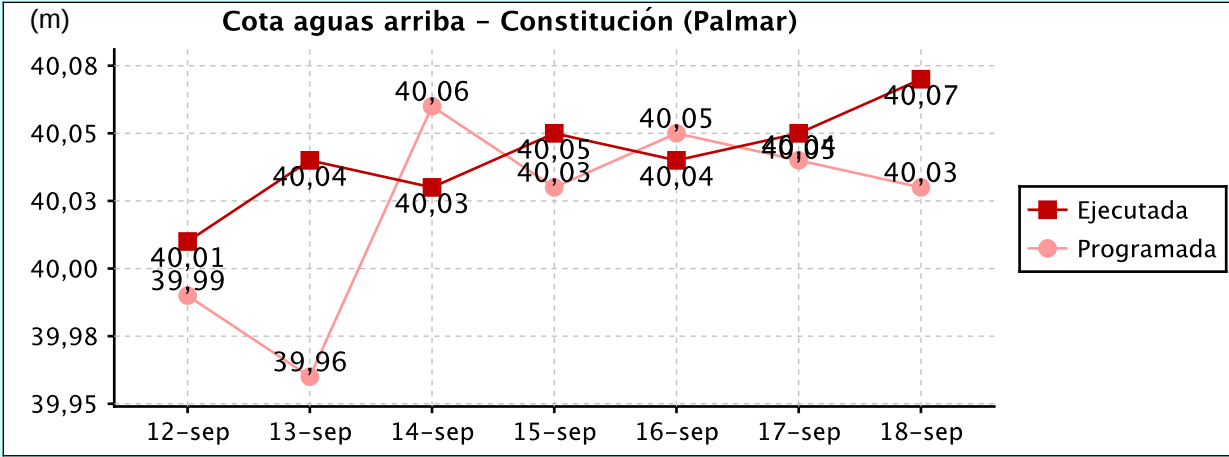
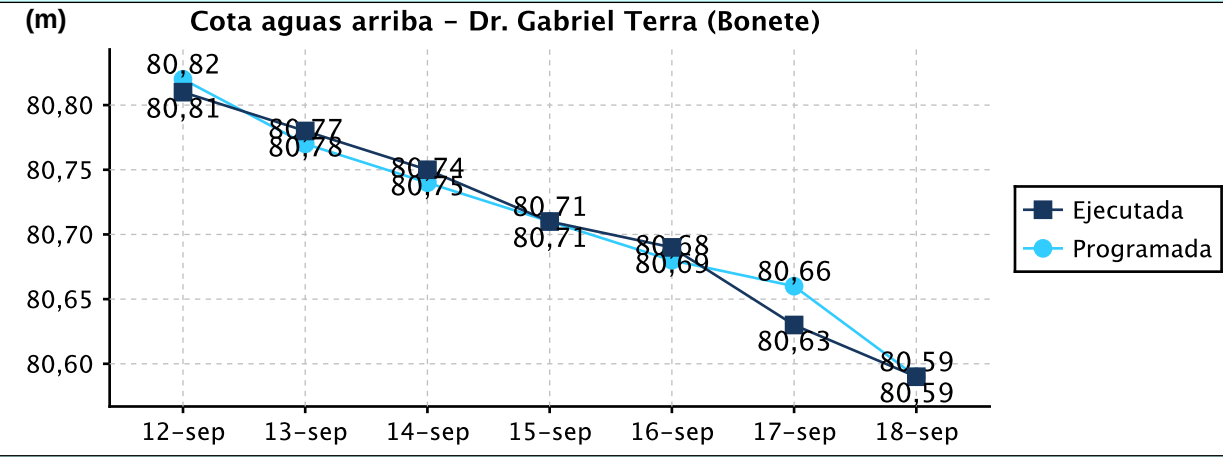


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,59	80,59
Baygorria	54,22	54,15
Palmar	40,03	40,07
SGU	35,69	35,7

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

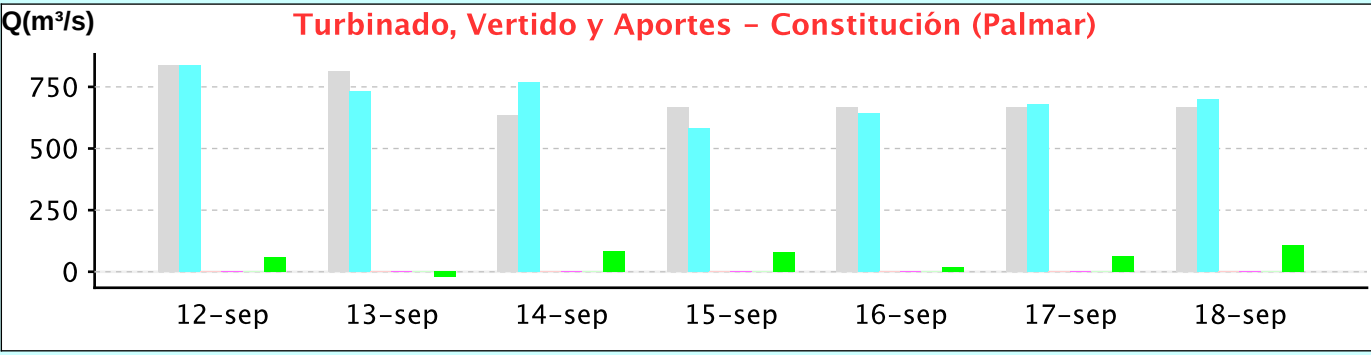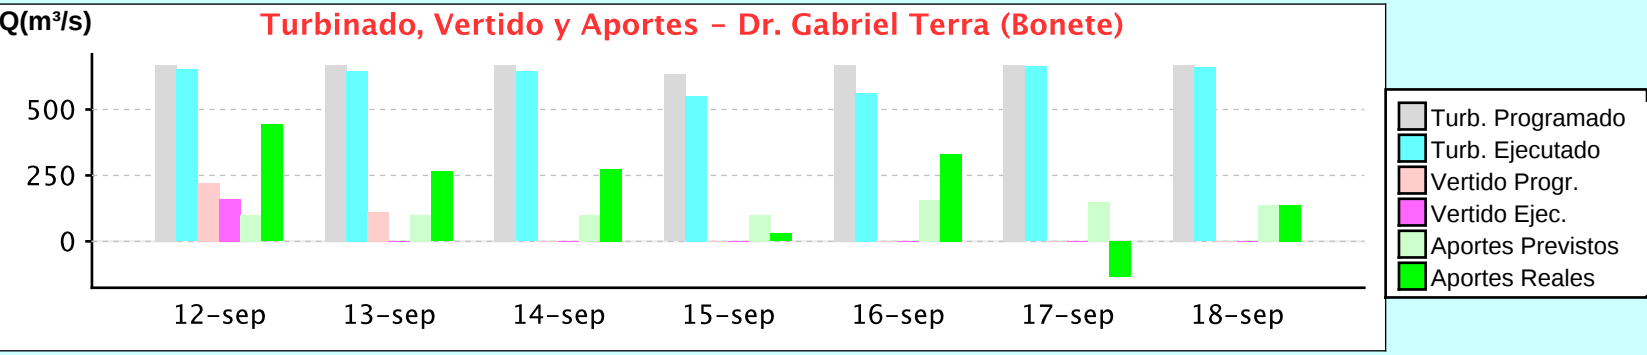

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

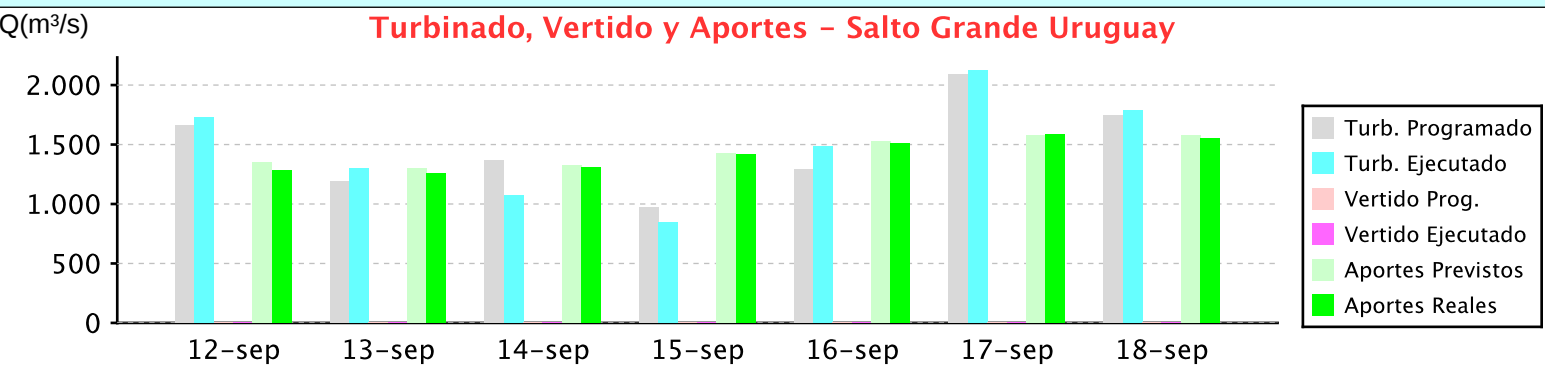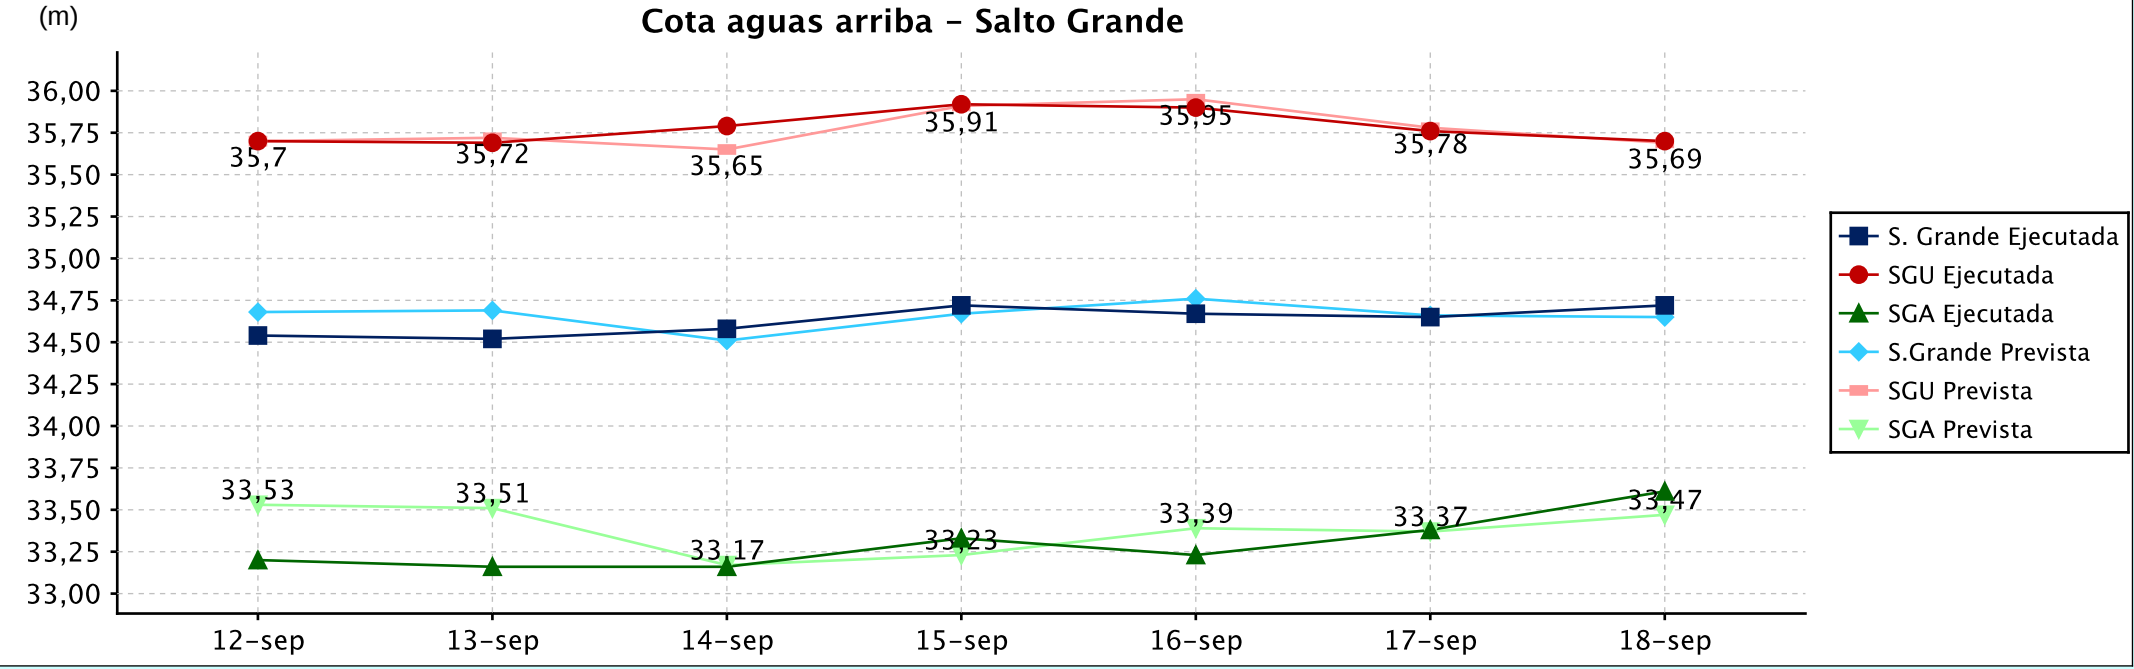

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,70
Cota Vista Arg	33,61
Cota real	34,72
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	47.107

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	660
Baygorria	666	684
Palmar	667	702
SGU	1.746	1.788

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	139	139
Baygorria	0	21
Palmar	0	107
SGU	1.575	1.554

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	60	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
