




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 19 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-8
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	52
Baygorria	6
Palmar	270
Salto Grande	16.046
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	10.341
TOTAL Generación	26.697

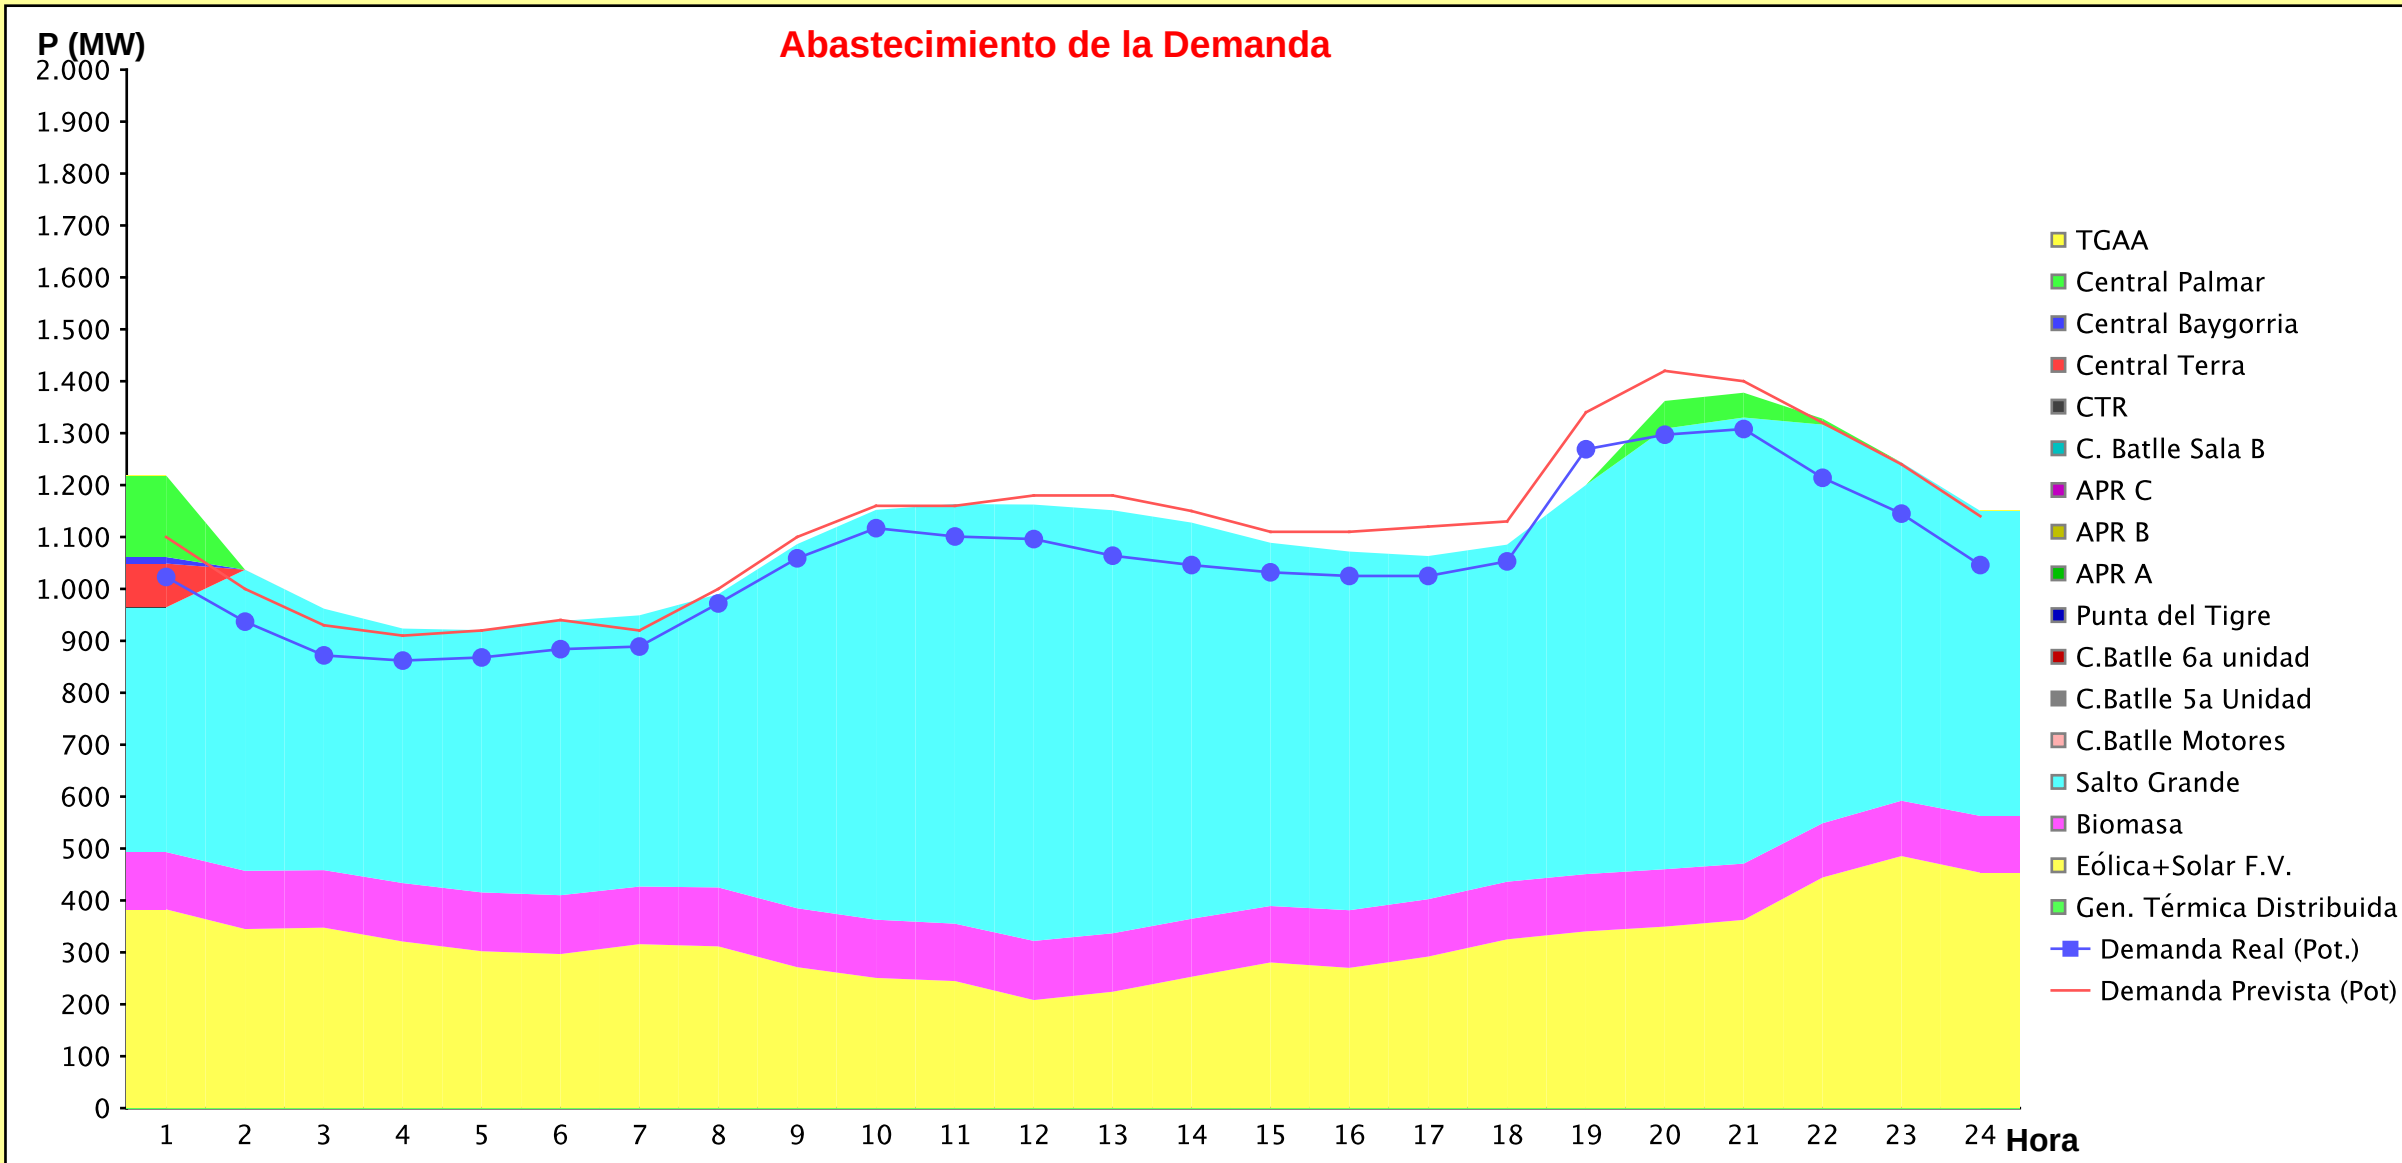

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.697
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.980
Diferencia (MWh)	-283
Ejecutada - Programada	-1,05 %

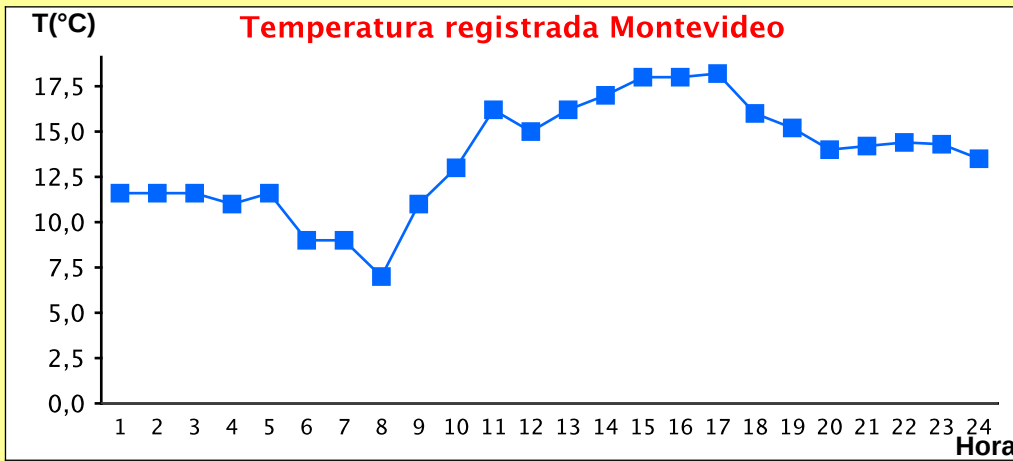



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1184 Hora 10:20
Potencia mínima:	925 Hora 04:27
Pico noche:	1425 Hora 19:47

Generación Media (MW)	
Eólica	312,0
Biomasa	112,2
Solar fotovoltaica	8,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

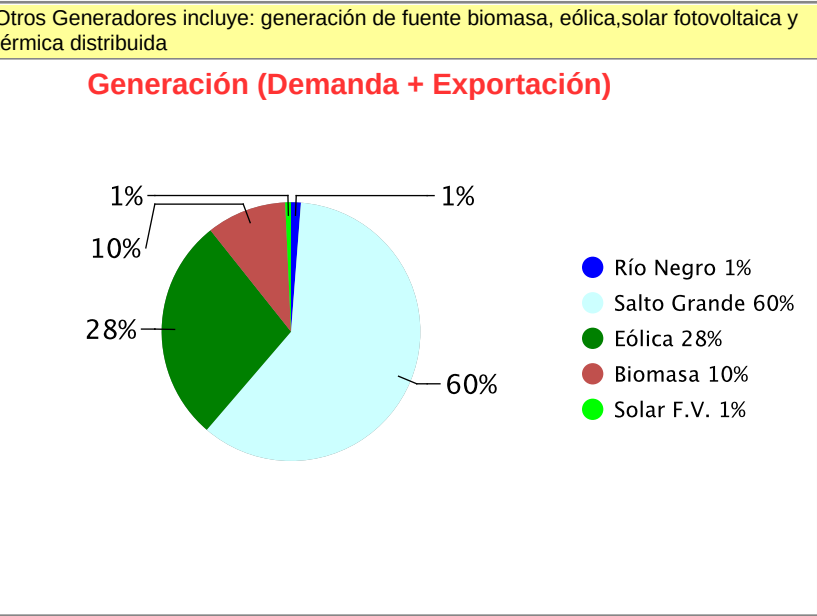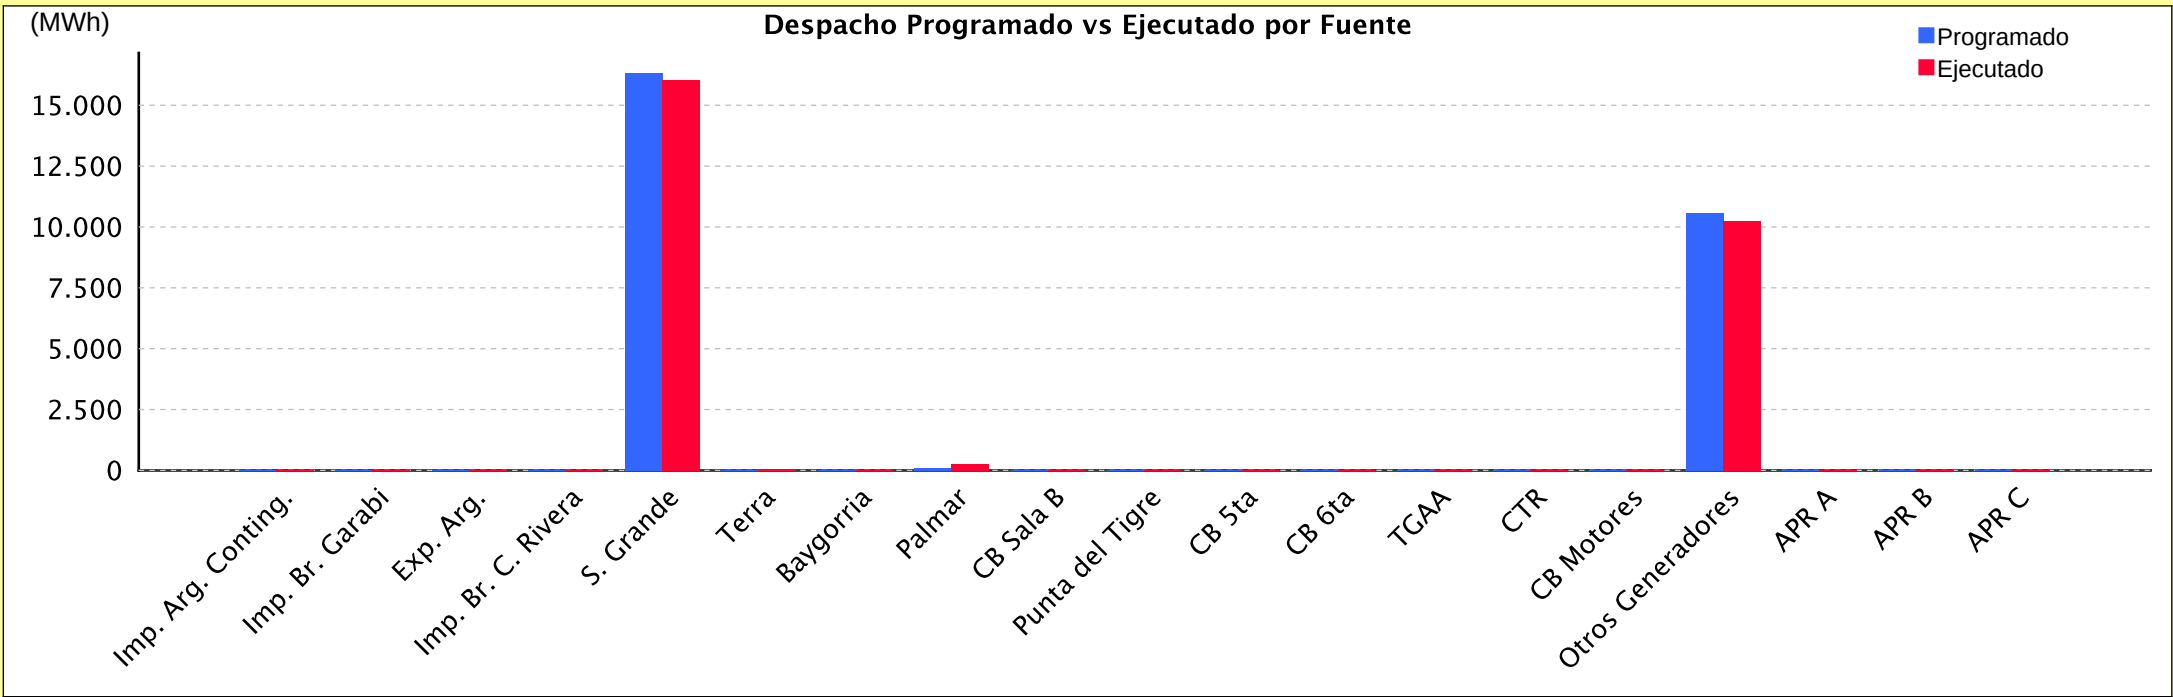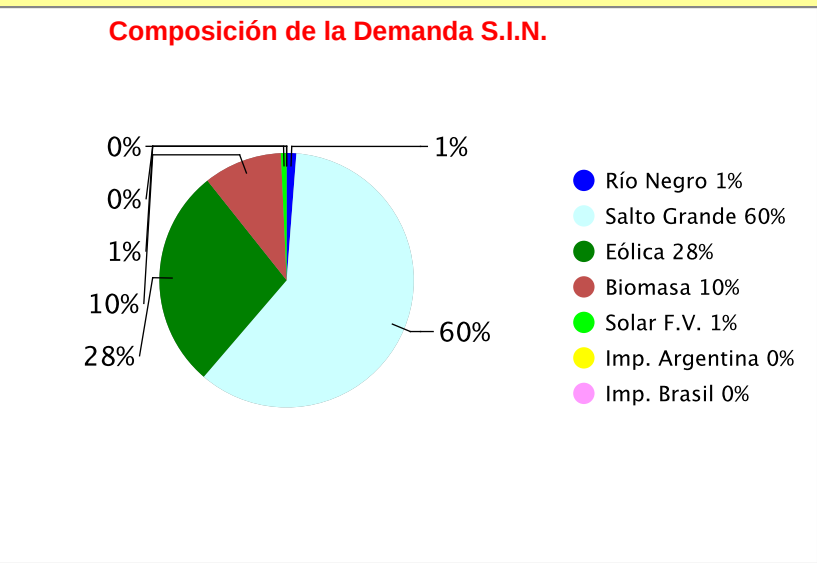



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

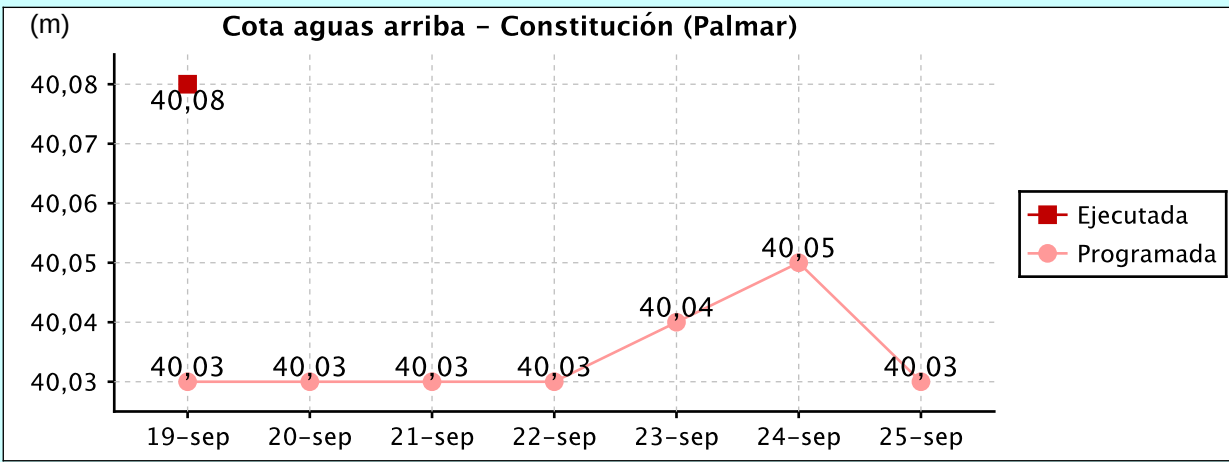
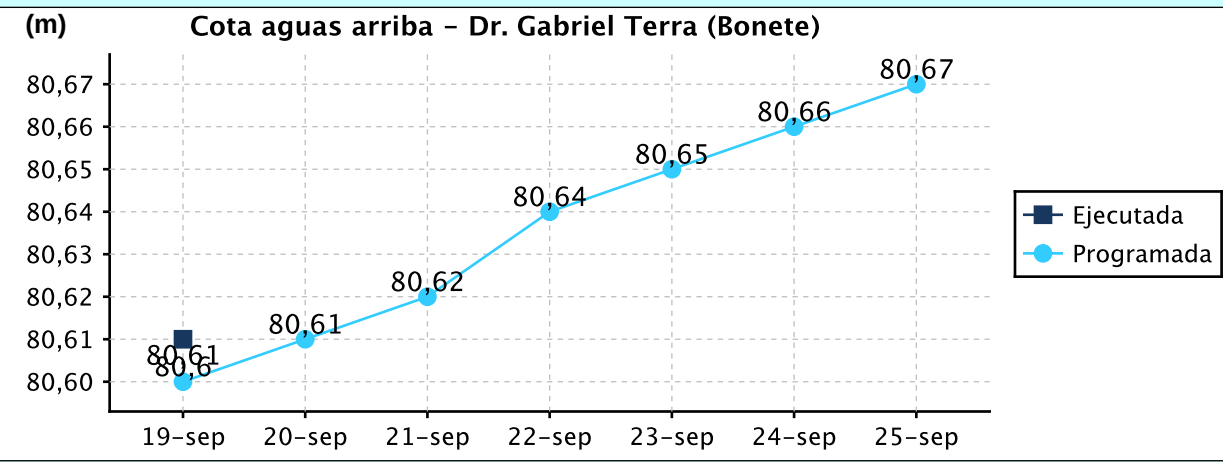


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,60	80,61
Baygorria	54,22	54,19
Palmar	40,03	40,08
SGU	35,32	35,32

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

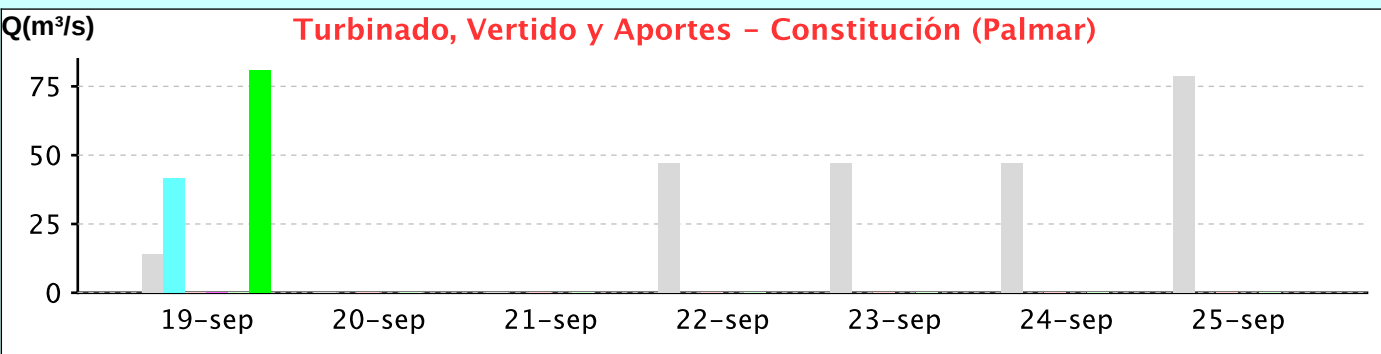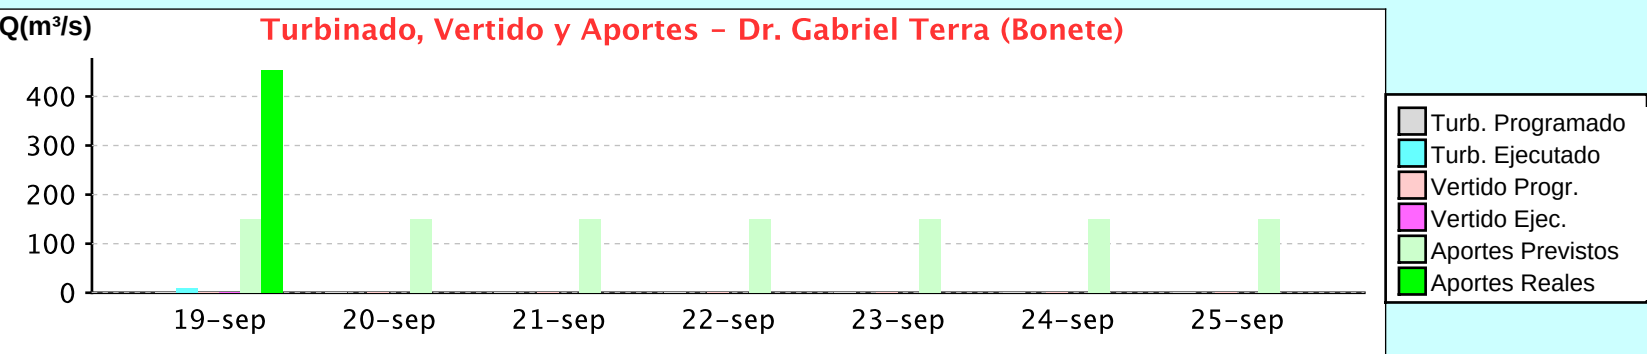

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

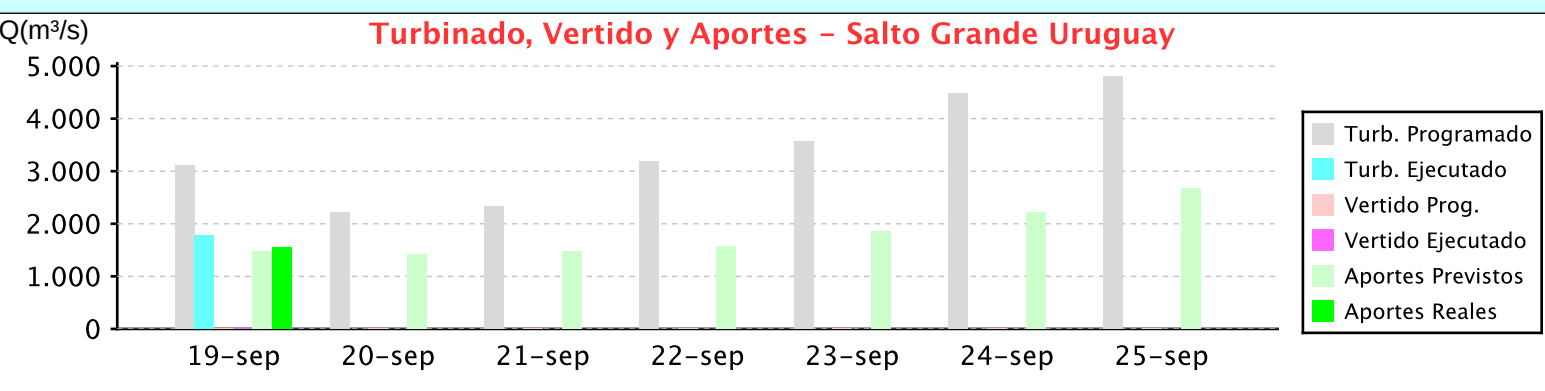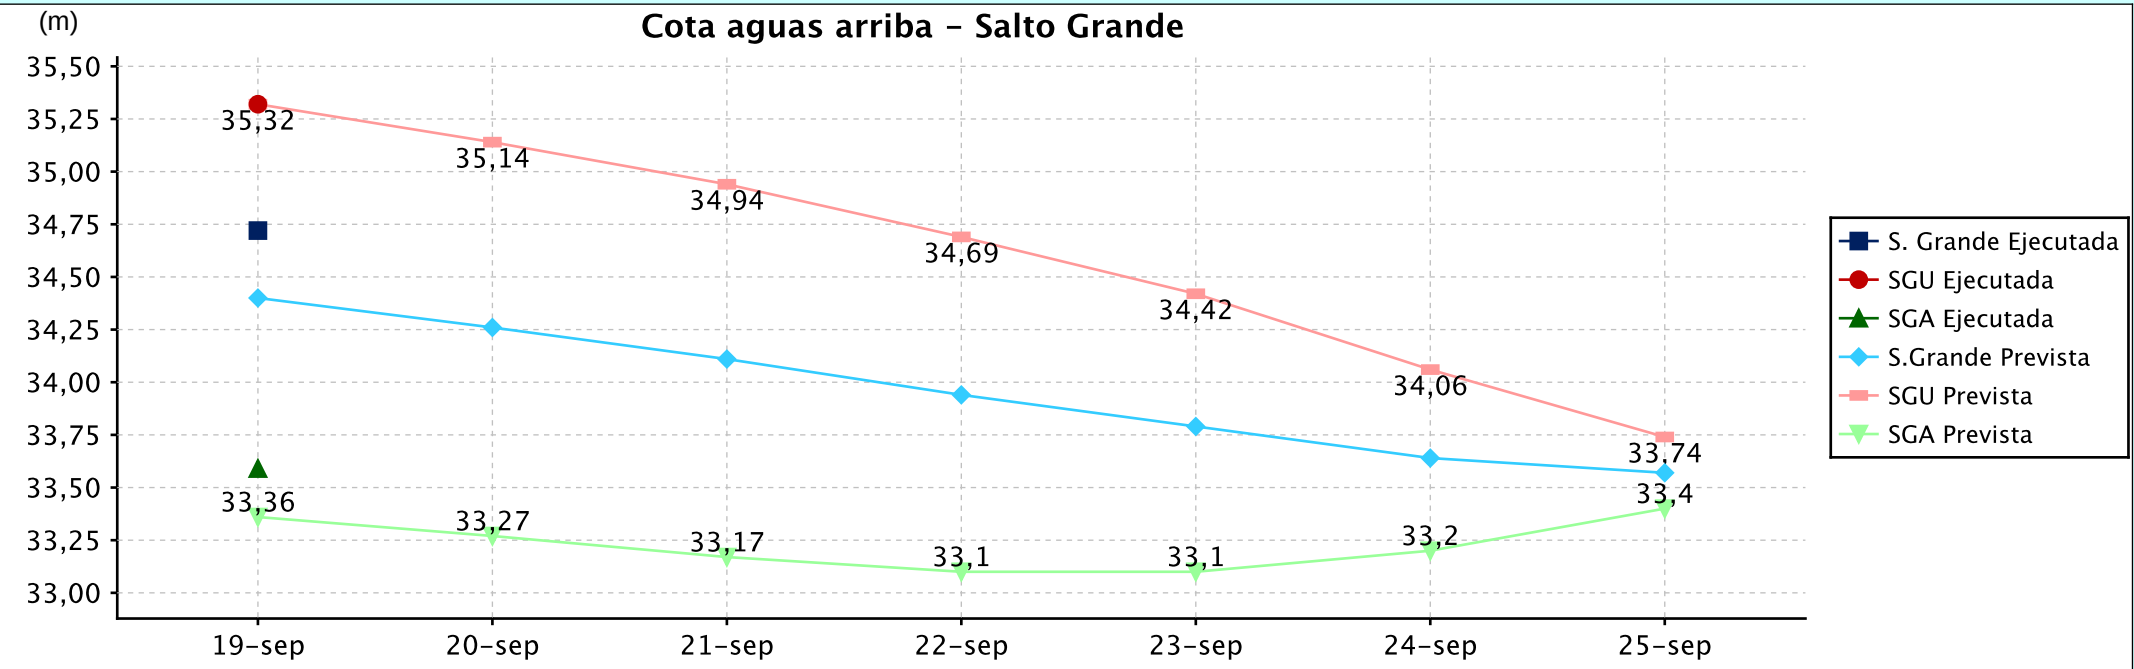

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,32
Cota Vista Arg	33,59
Cota real	34,72
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
37.940	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	10
Baygorria	0	5
Palmar	14	42
SGU	3.105	1.786

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	150	453
Baygorria	0	61
Palmar	0	81
SGU	1.475	1.554

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
