




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 20 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-1
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	0
Baygorria	-7
Palmar	520
Salto Grande	9.899
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.648
TOTAL Generación	24.010

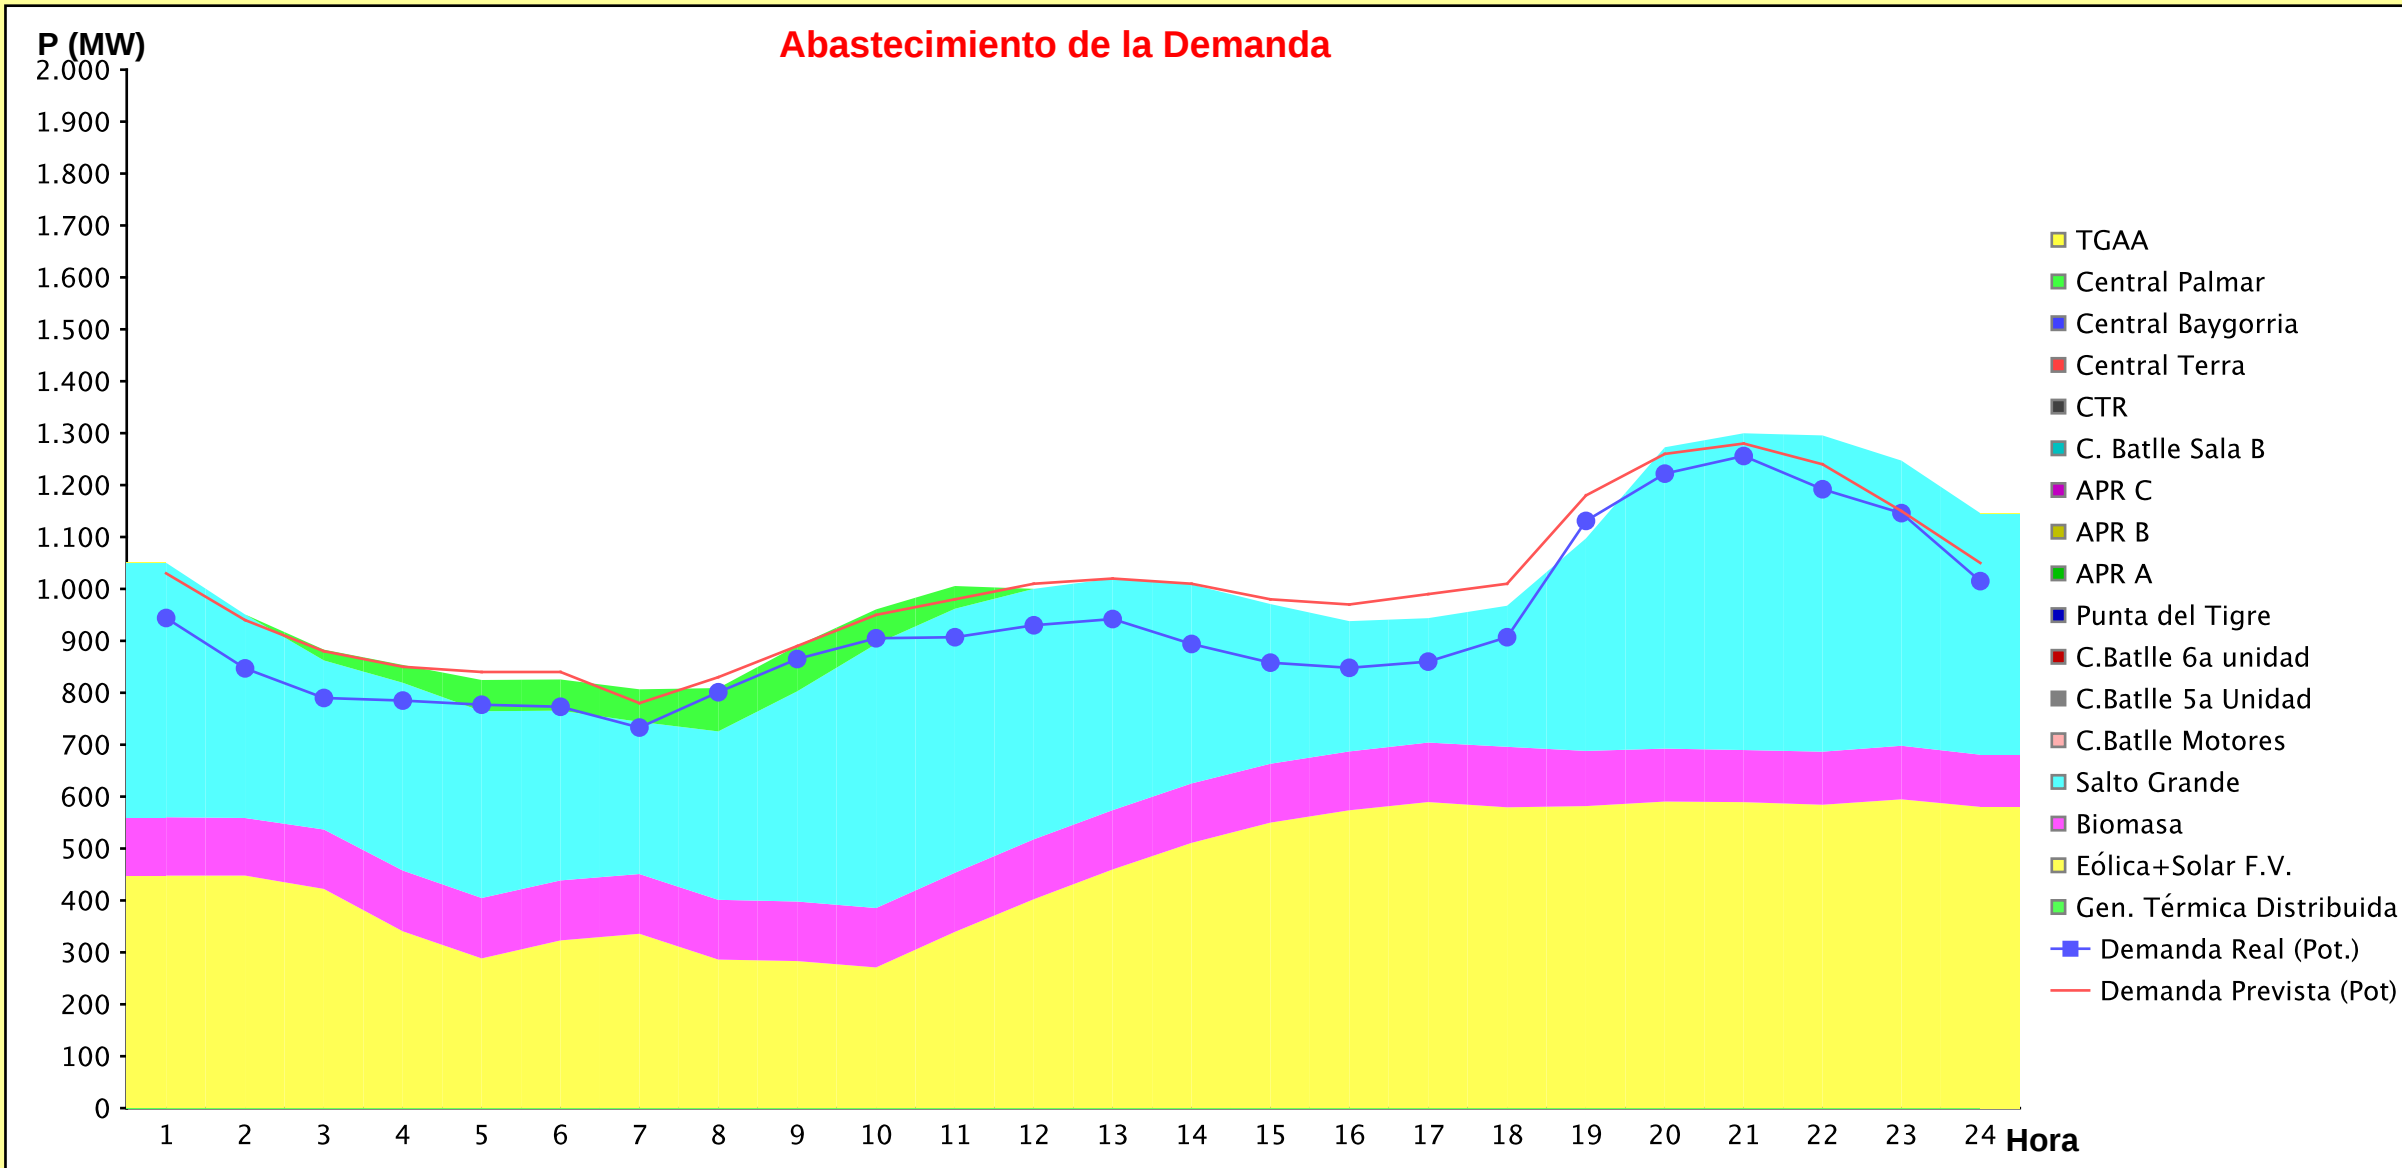

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.010
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	23.960
Diferencia (MWh)	50
Ejecutada - Programada	0,21 %

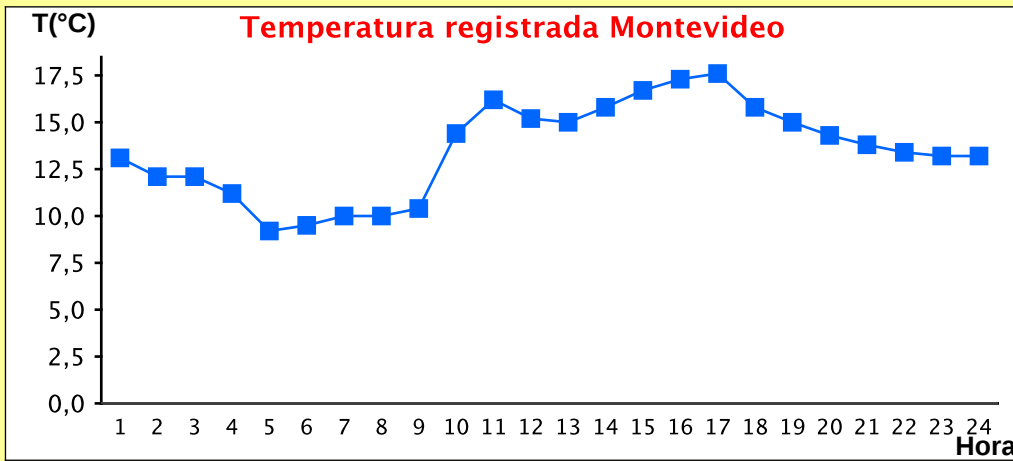



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1057 Hora 12:51
Potencia mínima:	787 Hora 06:55
Pico noche:	1349 Hora 20:57

Generación Media (MW)	
Eólica	452,1
Biomasa	112,4
Solar fotovoltaica	3,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

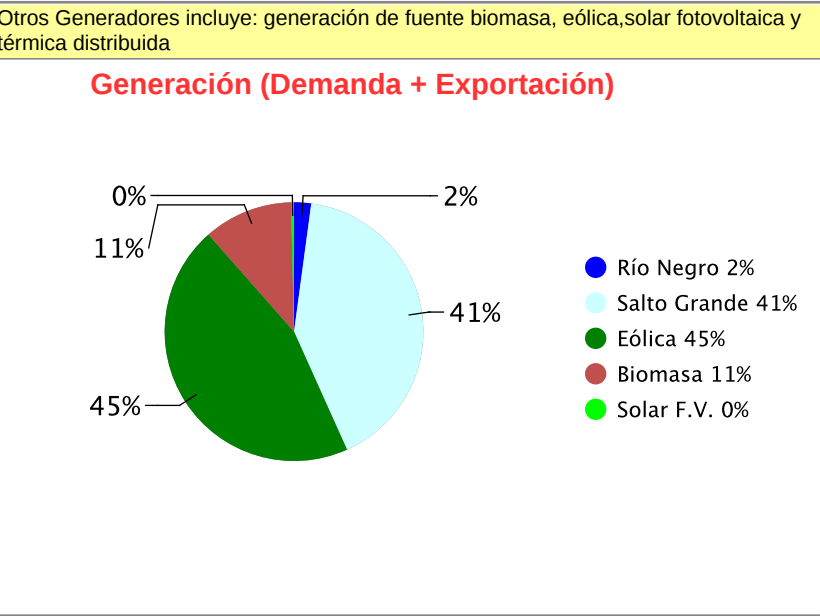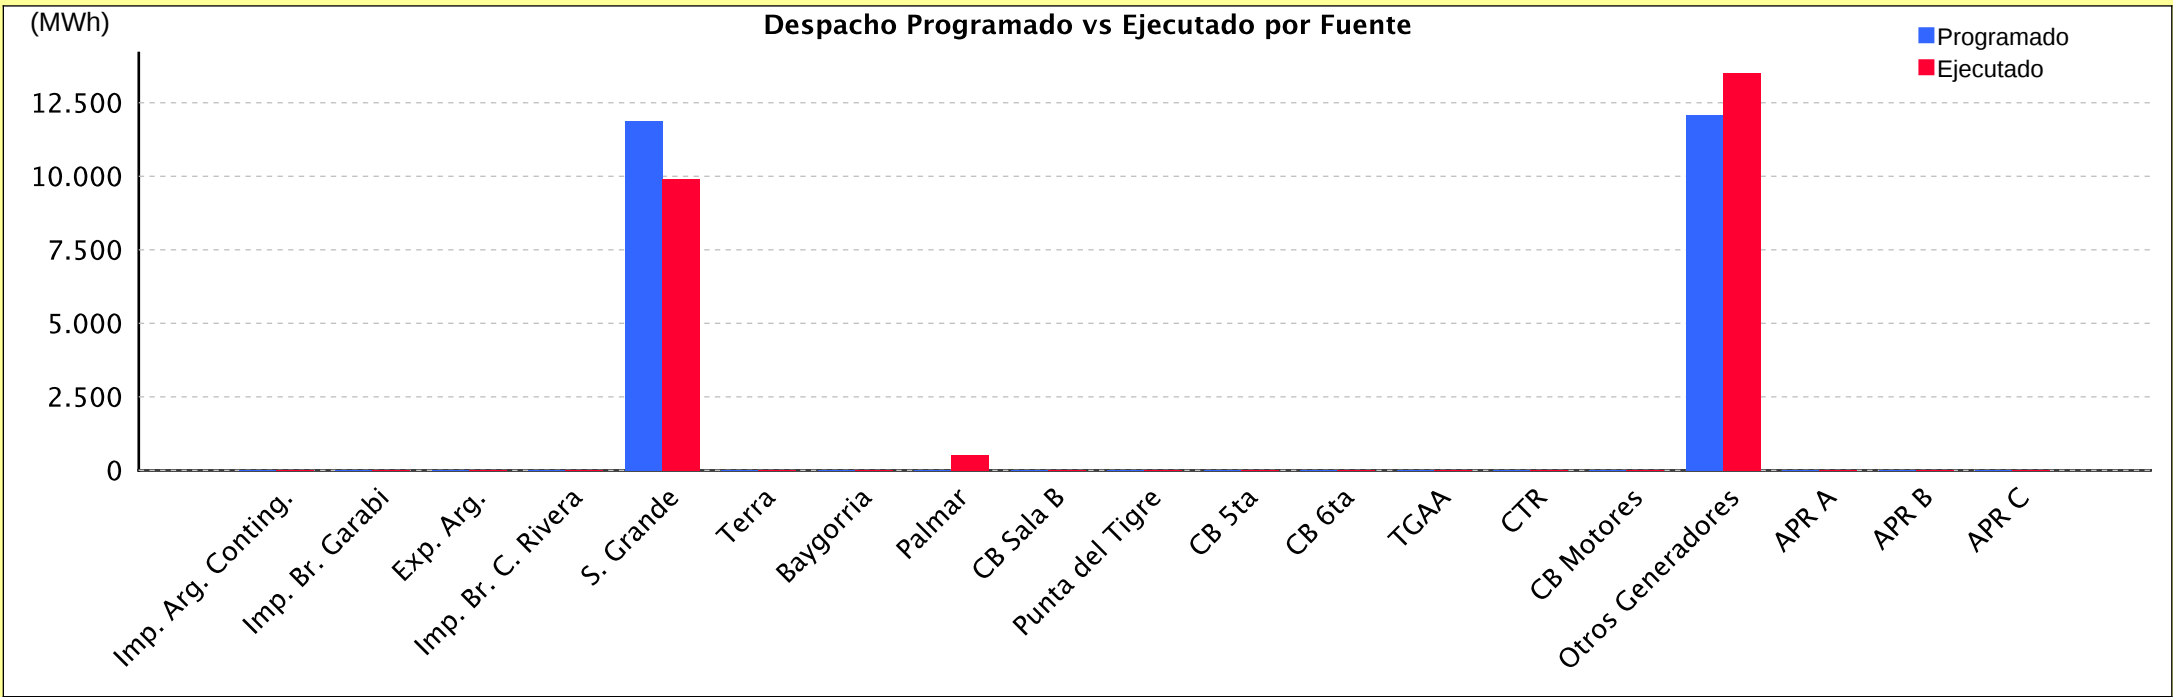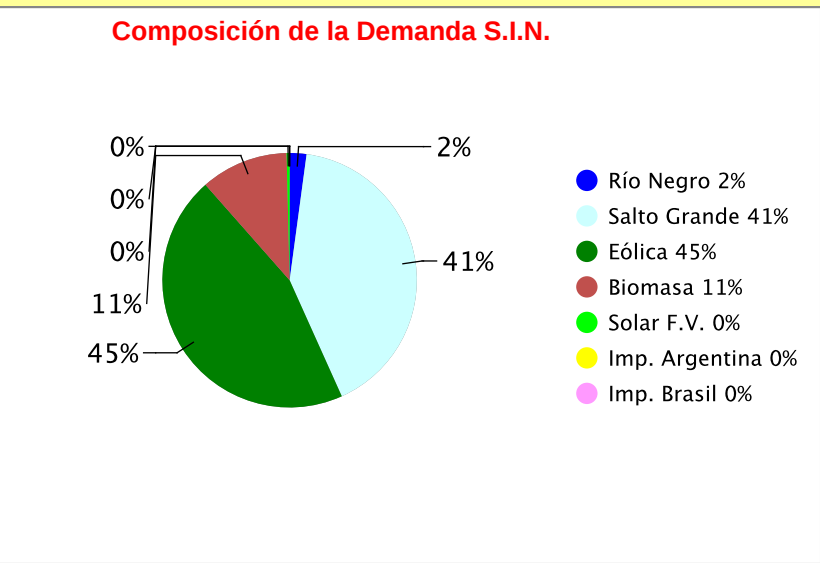



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

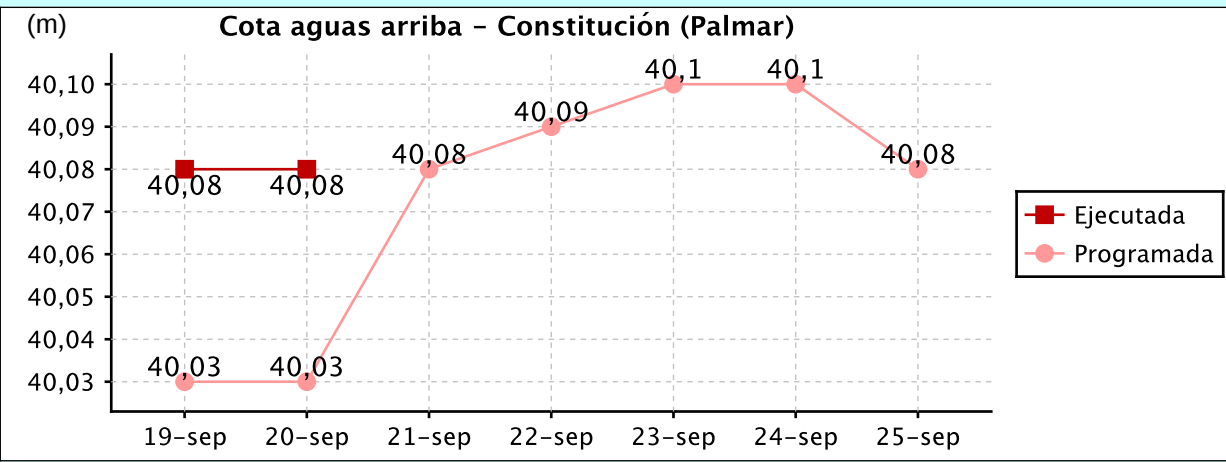
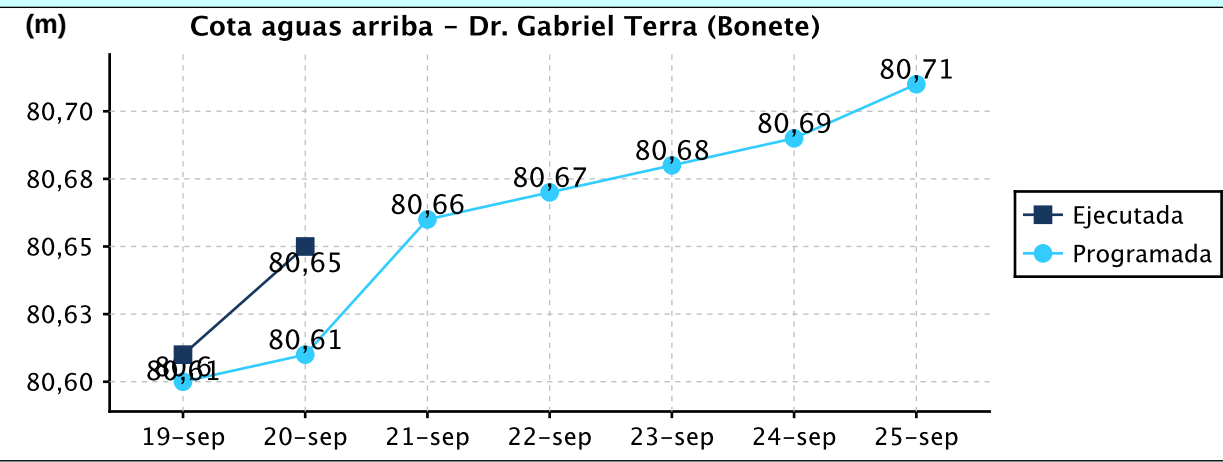


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,61	80,65
Baygorria	54,22	54,21
Palmar	40,03	40,08
SGU	35,14	35,24

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

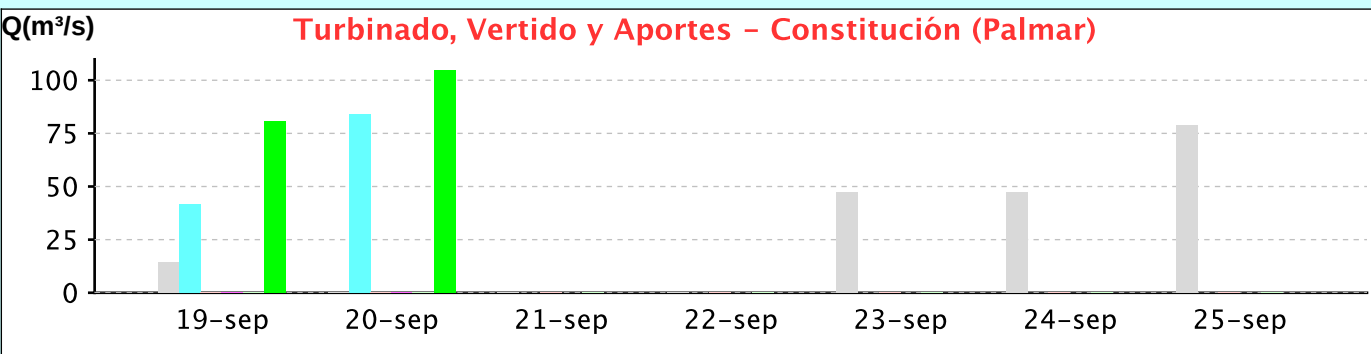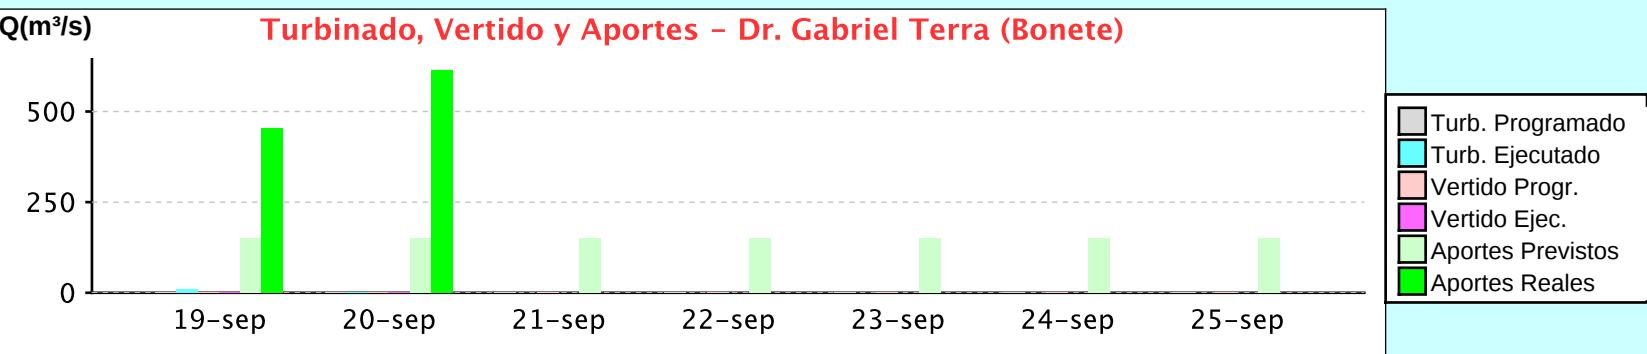

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

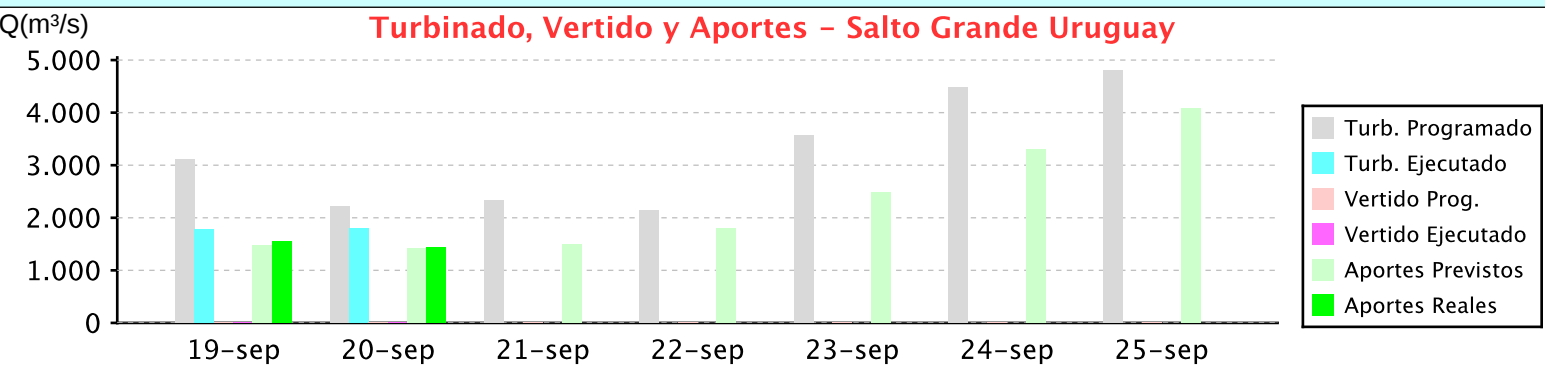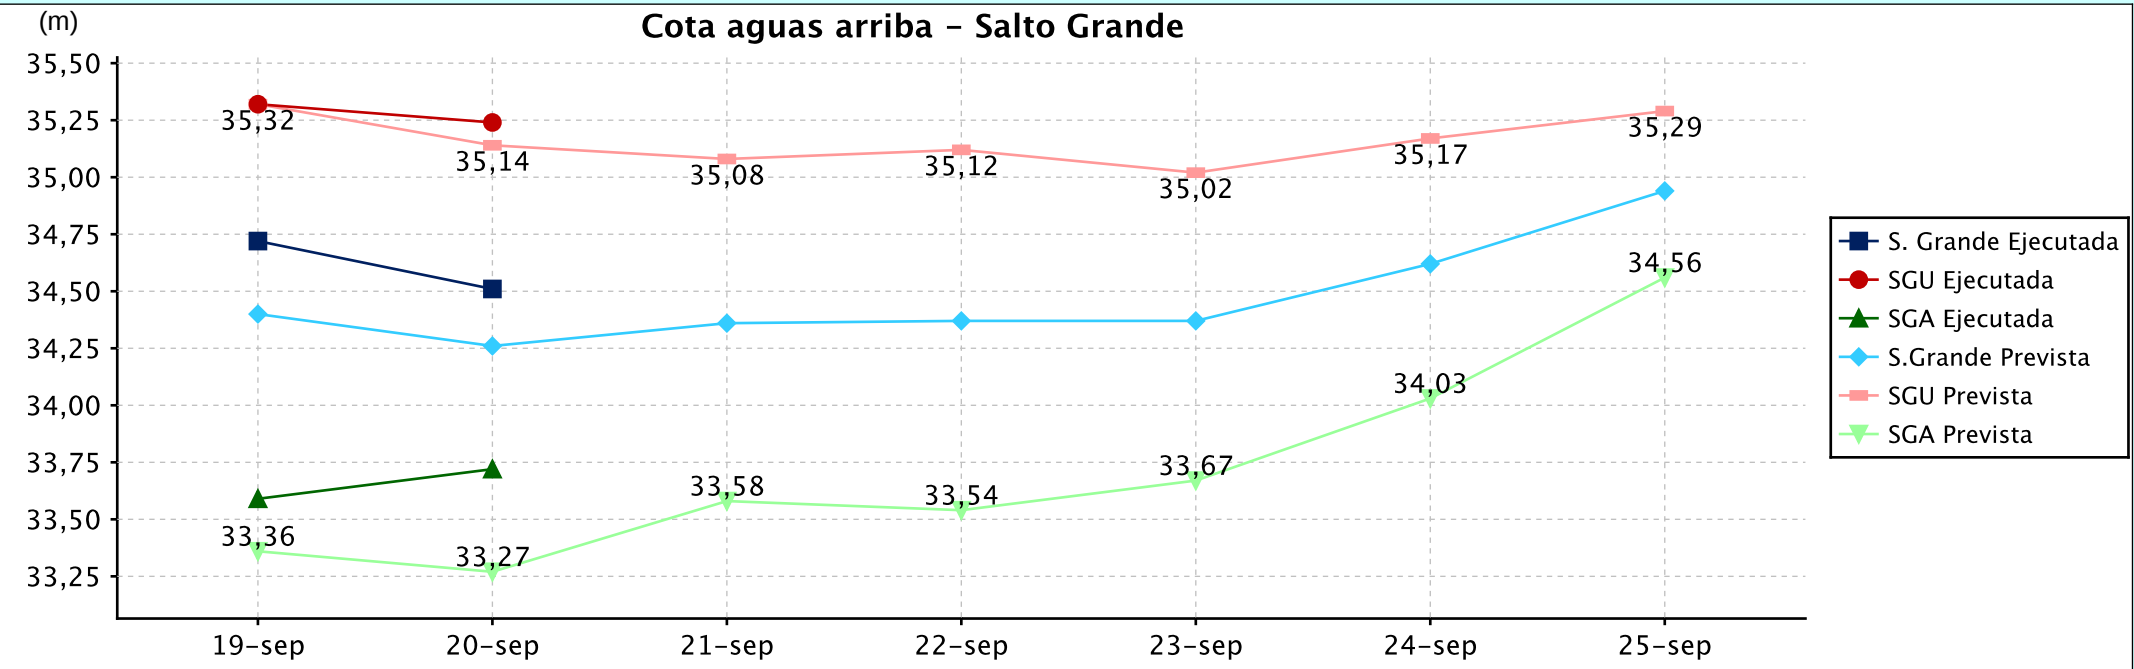

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,24
Cota Vista Arg	33,72
Cota real	34,51
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	33.609

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	84
SGU	2.217	1.804

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	150	613
Baygorria	0	32
Palmar	0	105
SGU	1.425	1.430

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
