




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 23 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.515
Baygorria	1.838
Palmar	5.198
Salto Grande	9.661
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	11.848
TOTAL Generación	30.968

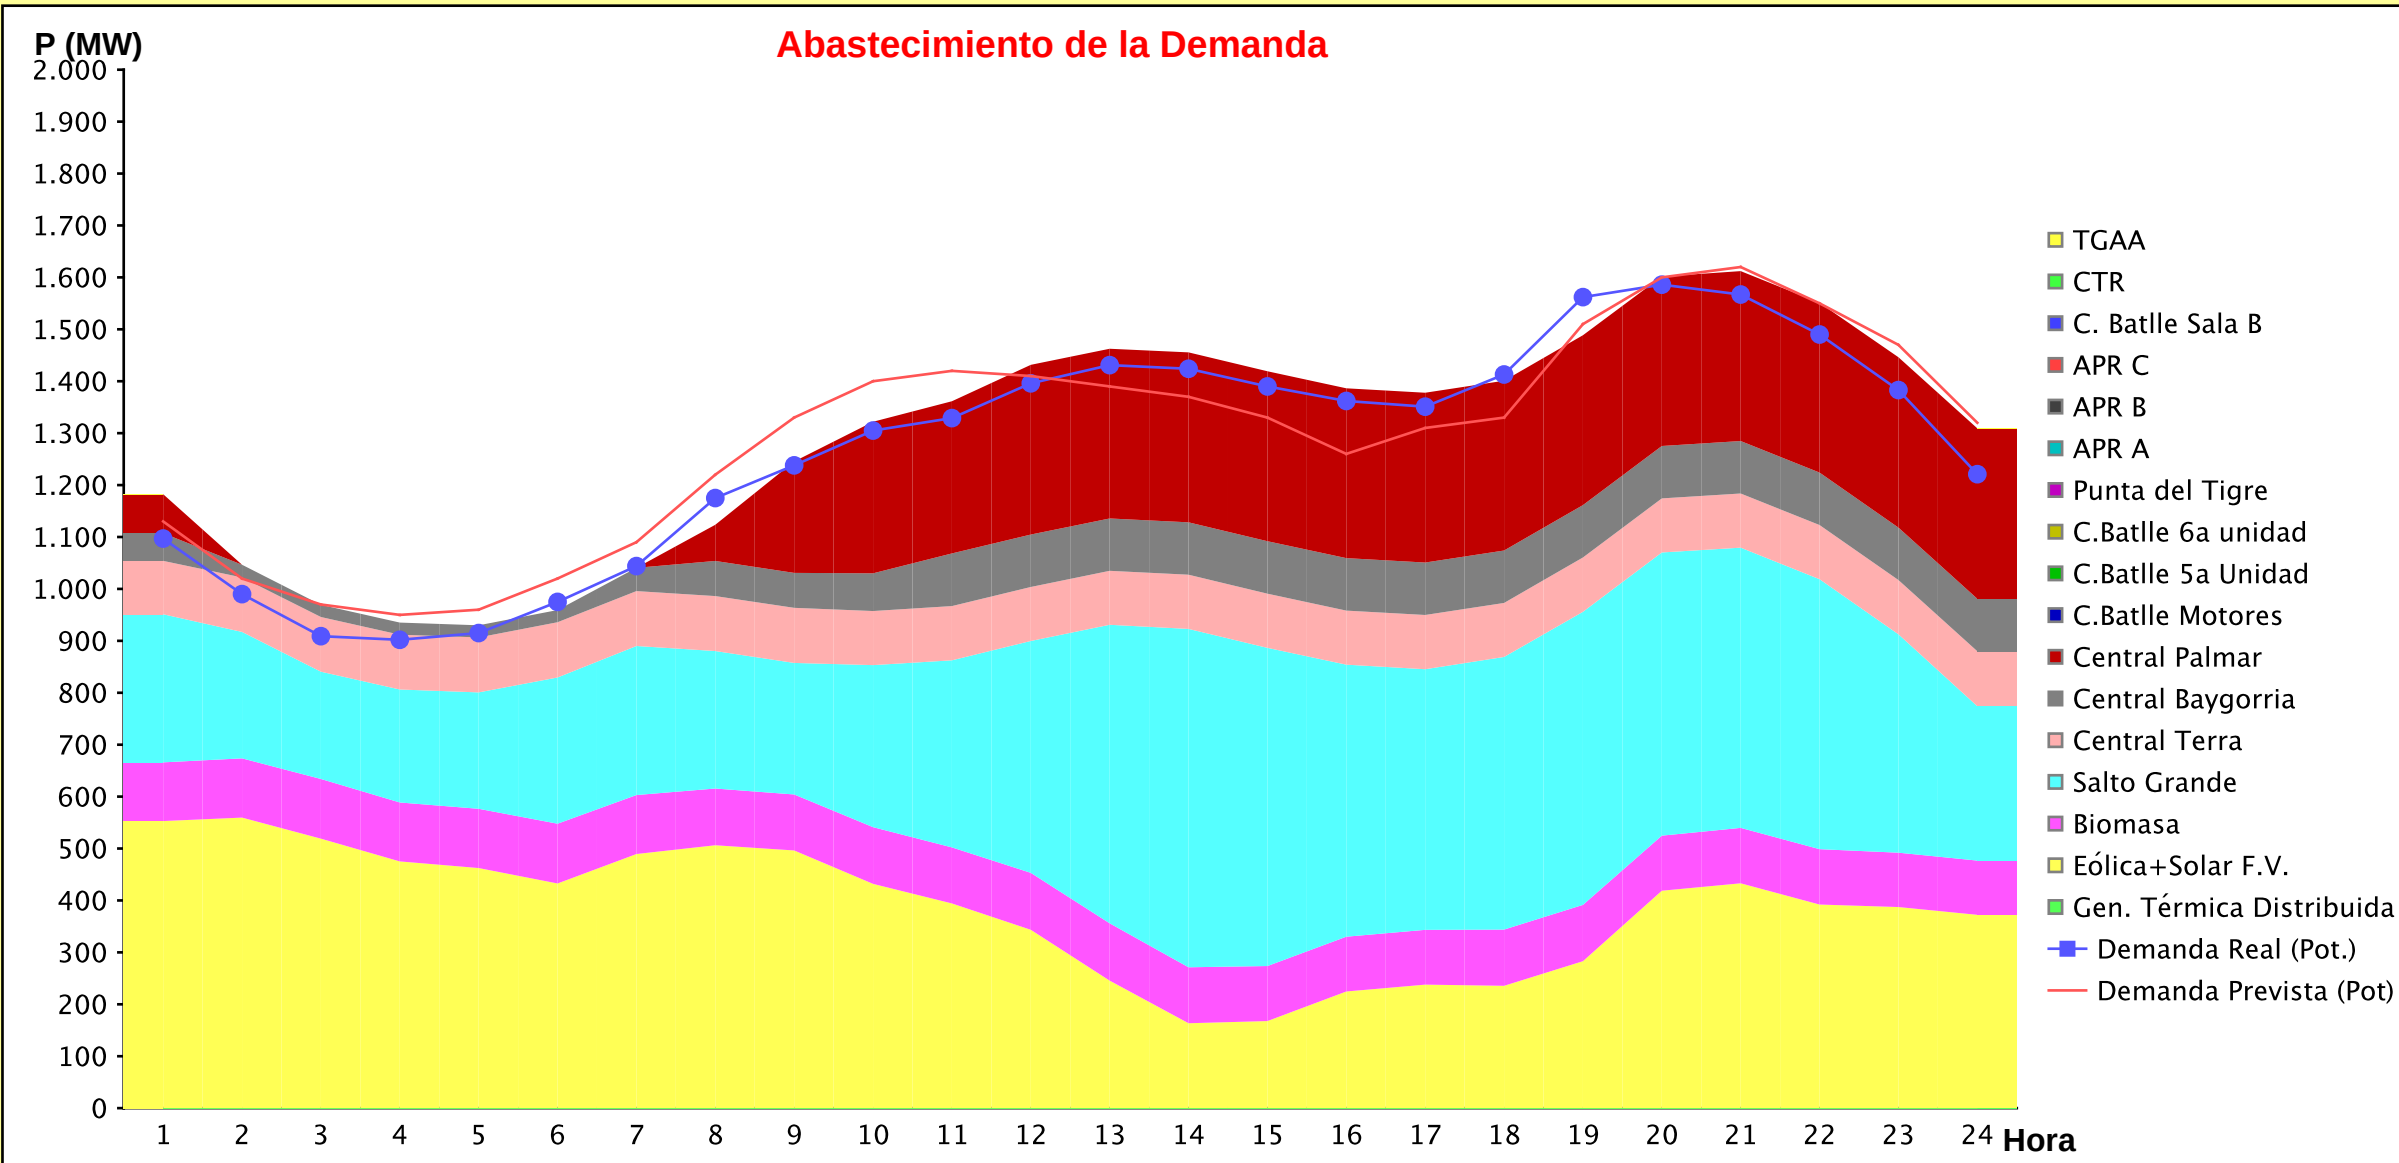

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.968
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.980
Diferencia (MWh)	-12
Ejecutada - Programada	-0,04 %

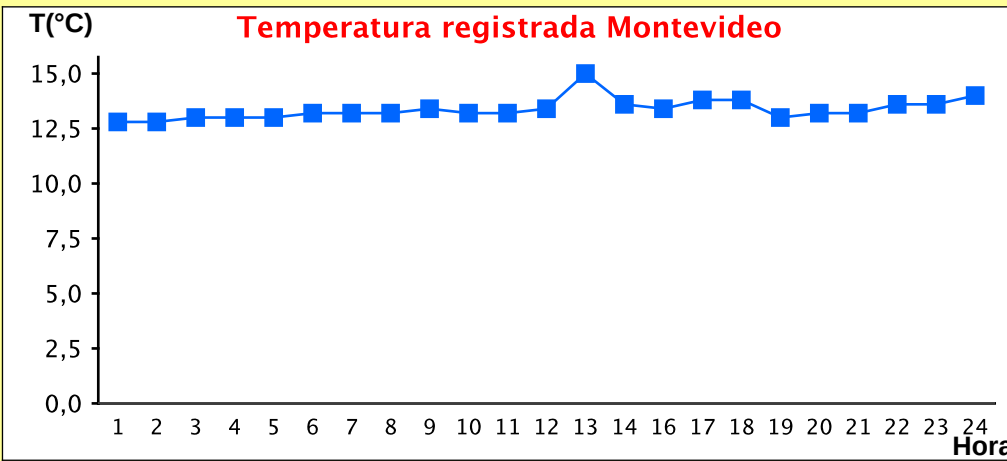



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1474 Hora 13:35
Potencia mínima:	969 Hora 03:42
Pico noche:	1642 Hora 20:34

Generación Media (MW)	
Eólica	380,2
Biomasa	109,8
Solar fotovoltaica	3,6
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

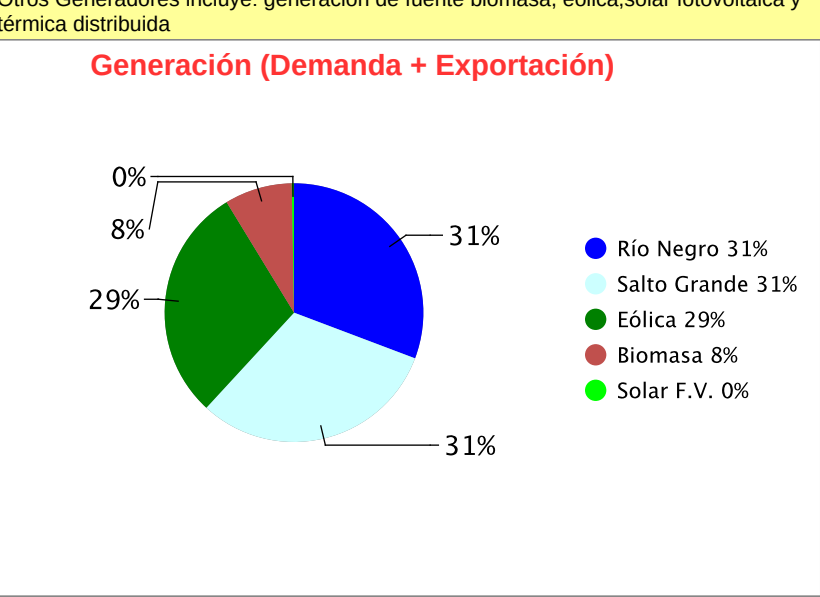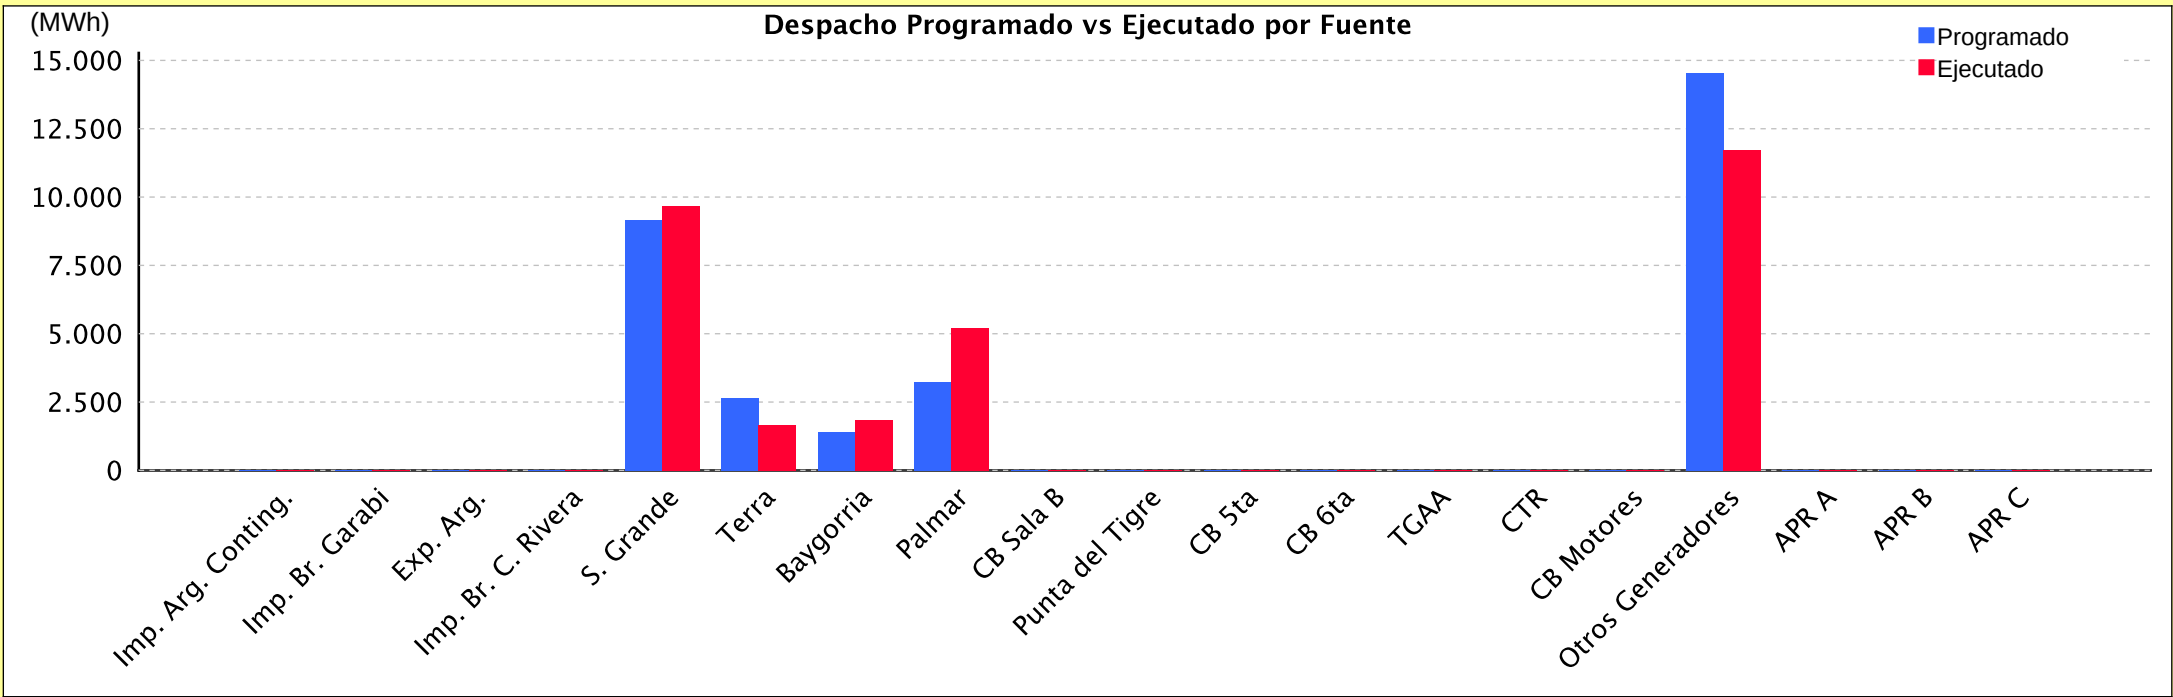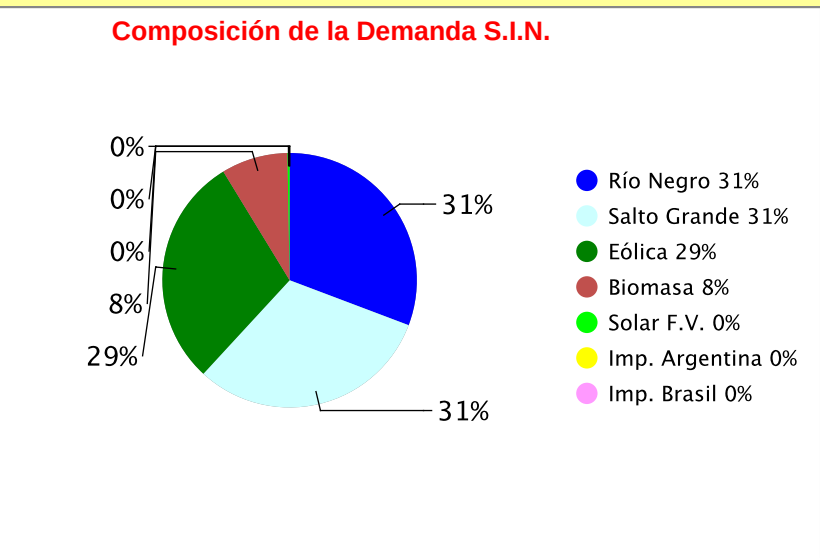



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

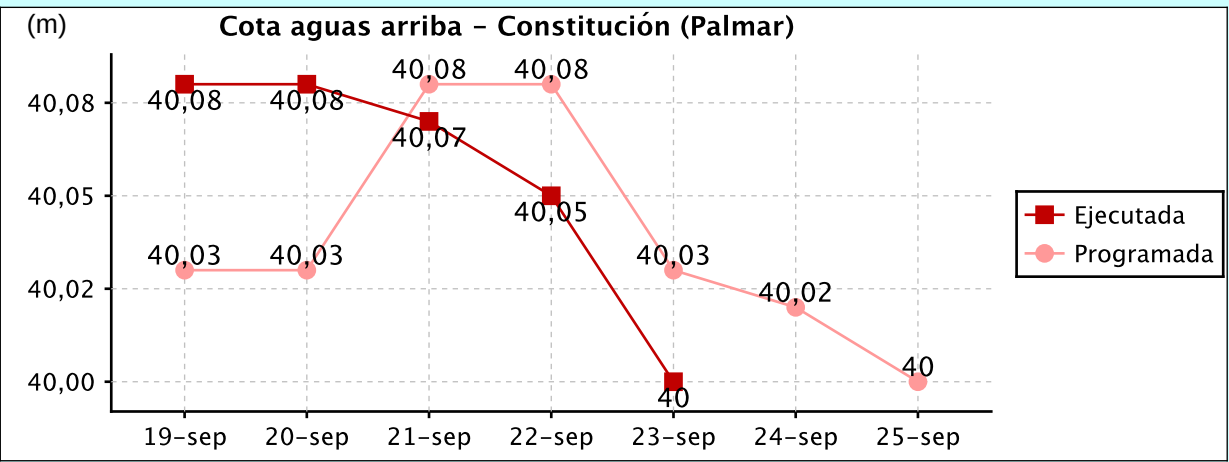
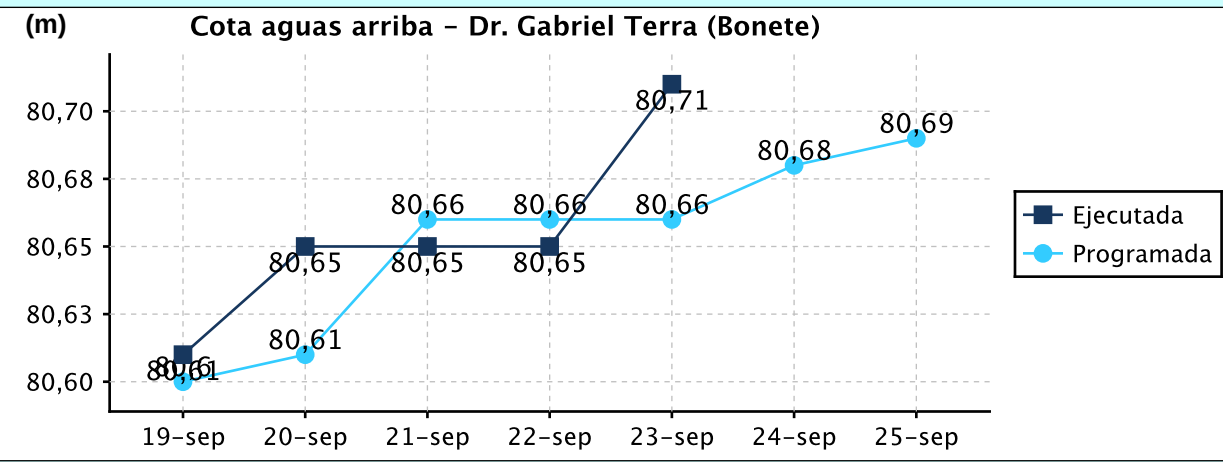


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,66	80,71
Baygorria	54,01	54,03
Palmar	40,03	40
SGU	34,59	34,67

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

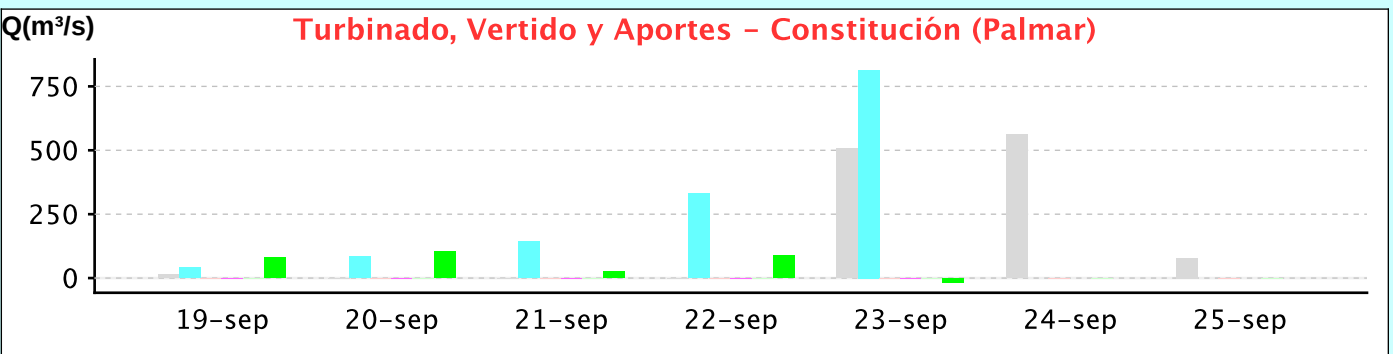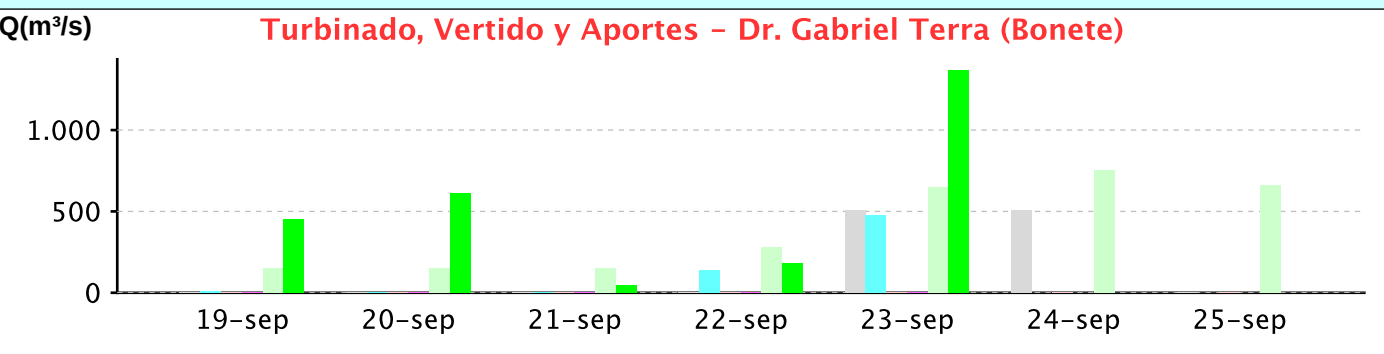

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

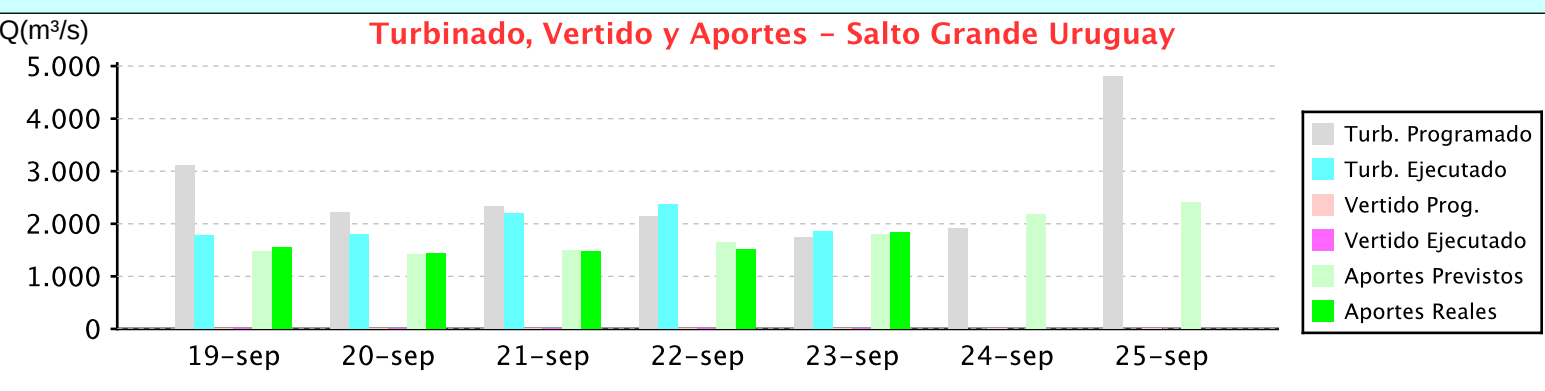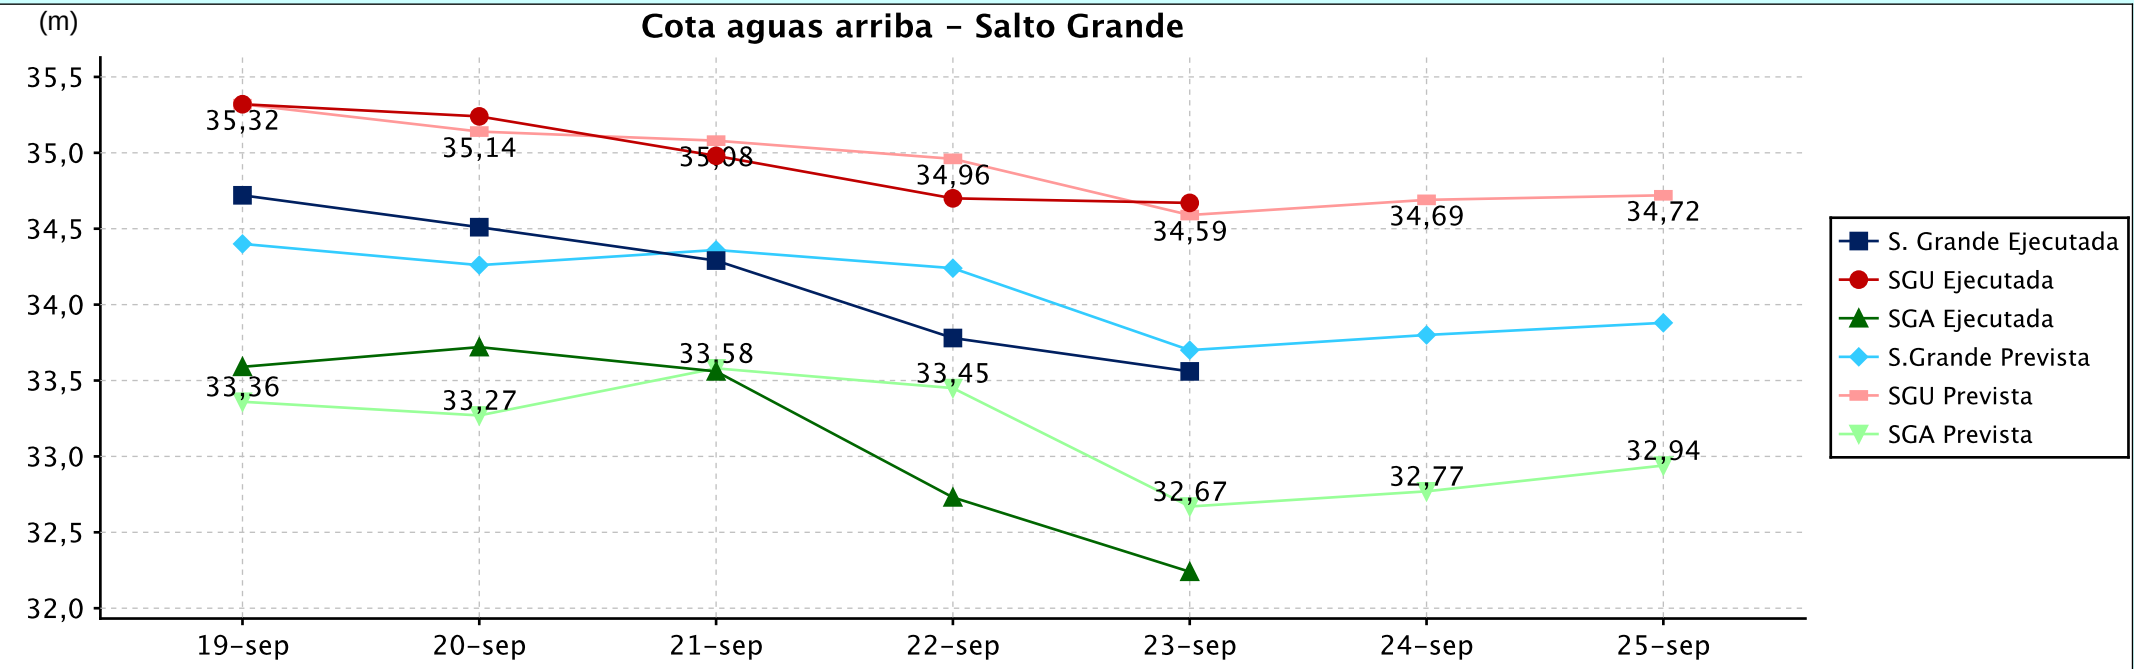

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,67
Cota Vista Arg	32,24
Cota real	33,56

Dif. Energ. (U-A)	46.507
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	475
Baygorria	521	689
Palmar	508	814
SGU	1.747	1.850

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	650	1.367
Baygorria	0	198
Palmar	0	-16
SGU	1.800	1.840

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
