




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 24 de septiembre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.506
Baygorria	2.421
Palmar	6.873
Salto Grande	5.521
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.196
TOTAL Generación	30.424



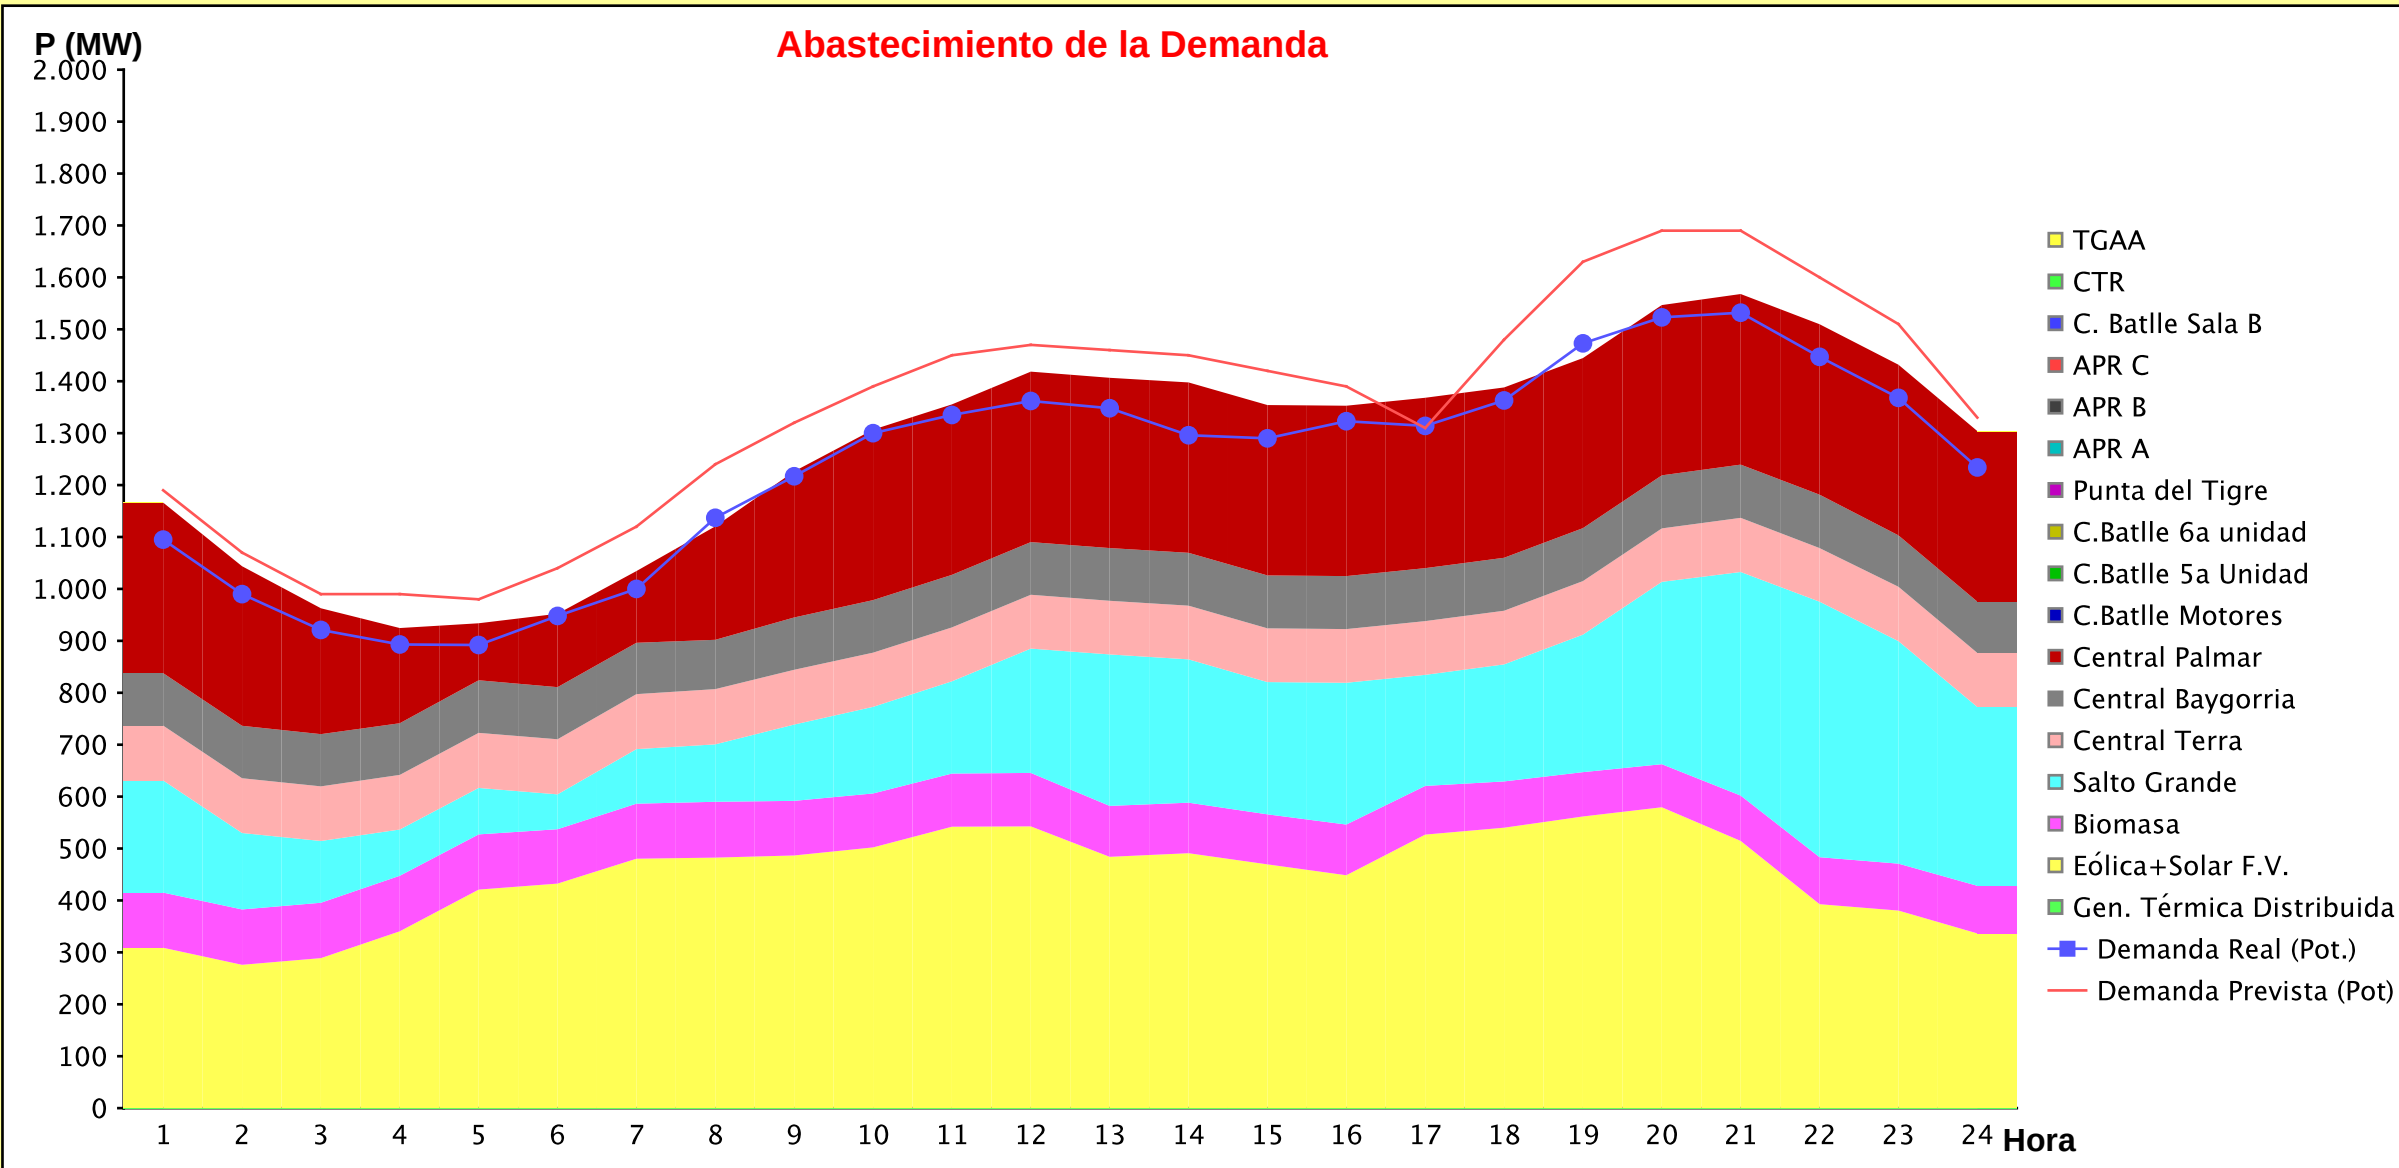


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.424
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	32.210
Diferencia (MWh)	-1.786
Ejecutada - Programada	-5,54 %


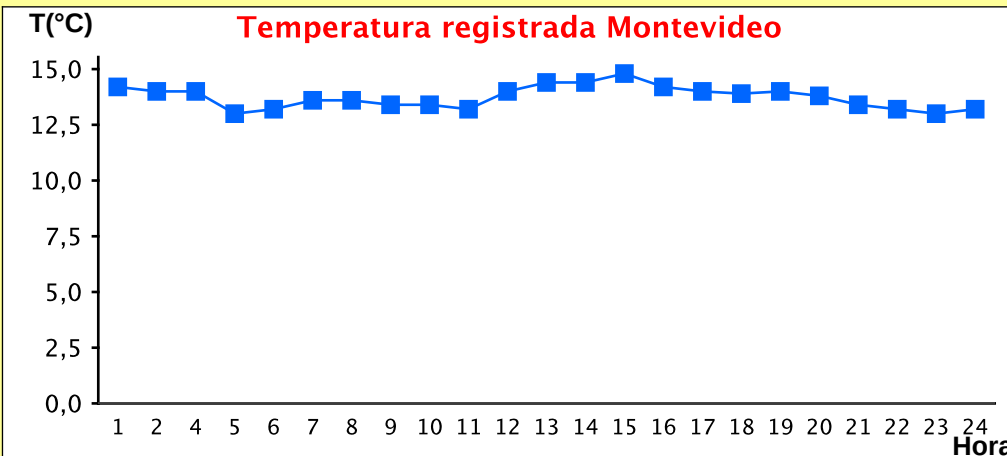


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1462 Hora 11:35
Potencia mínima:	952 Hora 03:56
Pico noche:	1625 Hora 20:20
Generación Media (MW)	
Eólica	448,1
Biomasa	99,5
Solar fotovoltaica	1,5
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

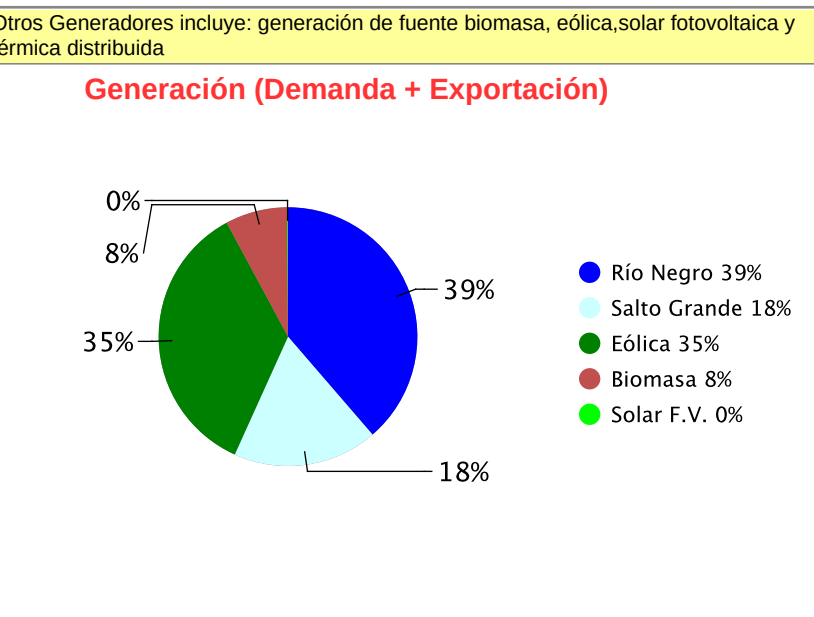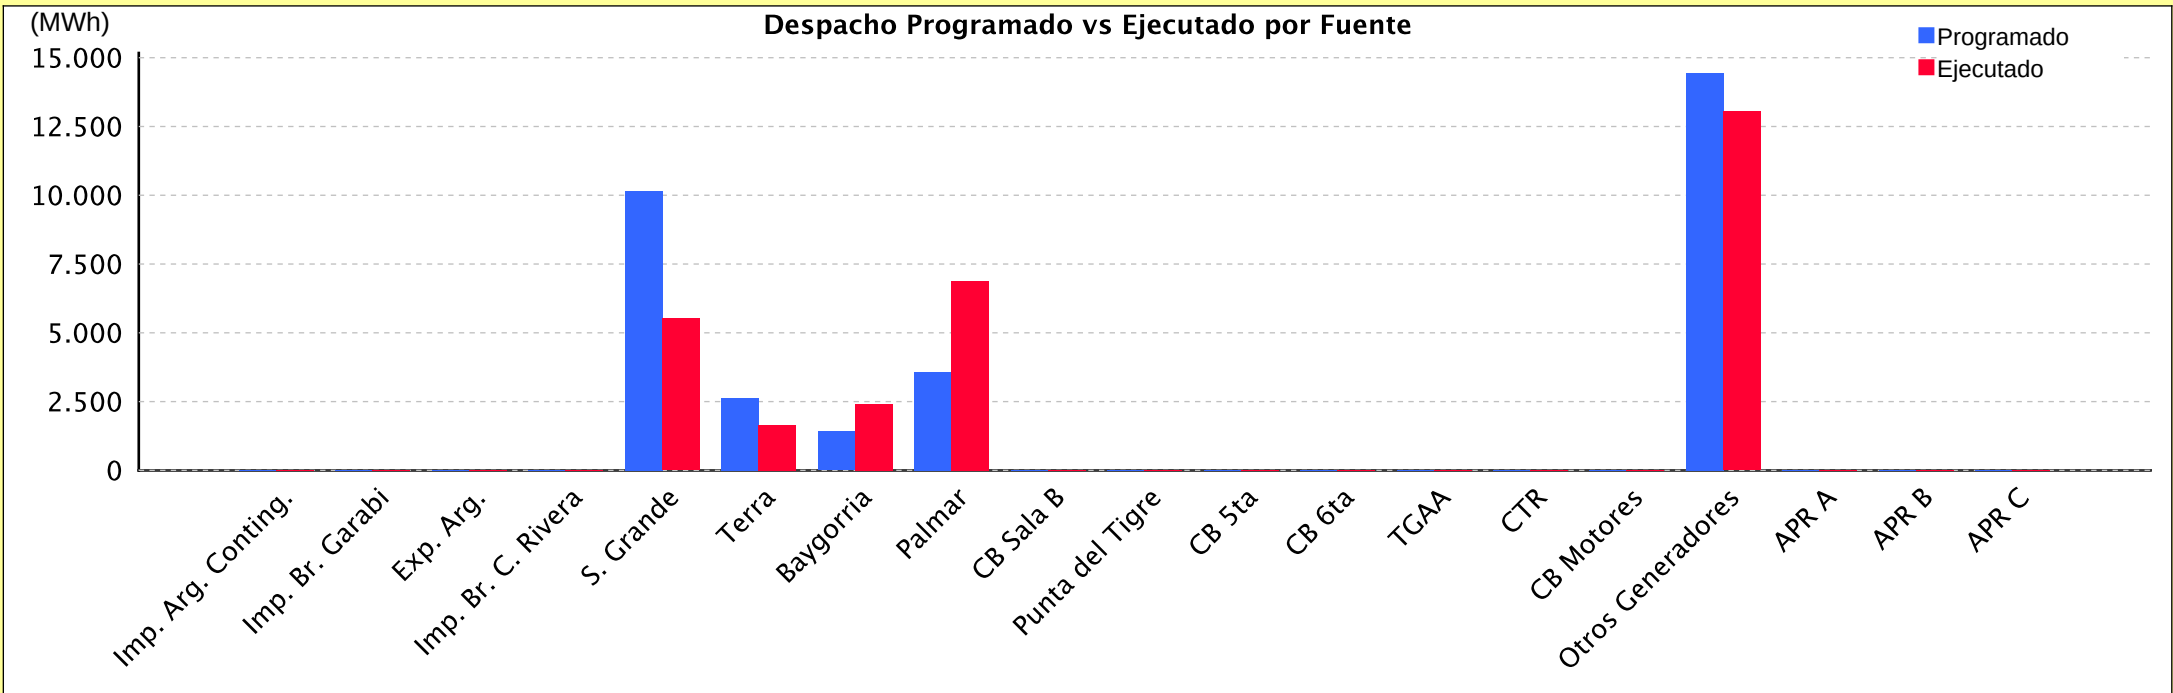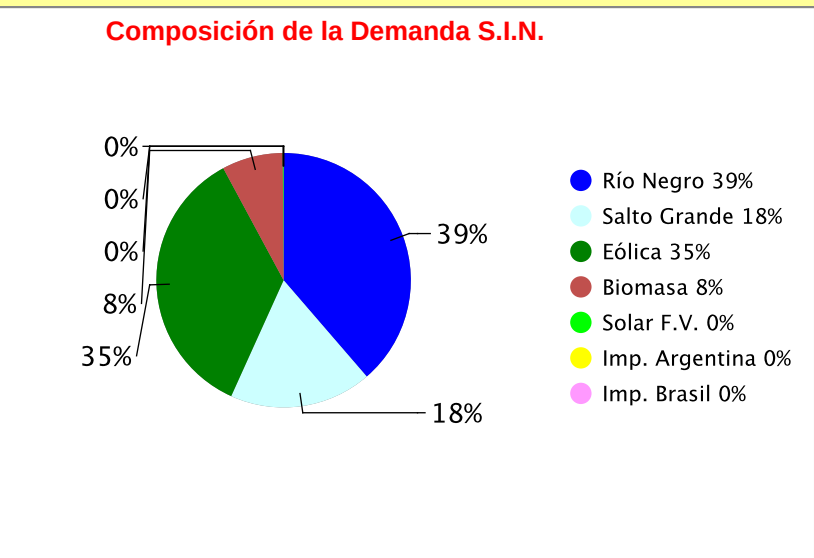



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

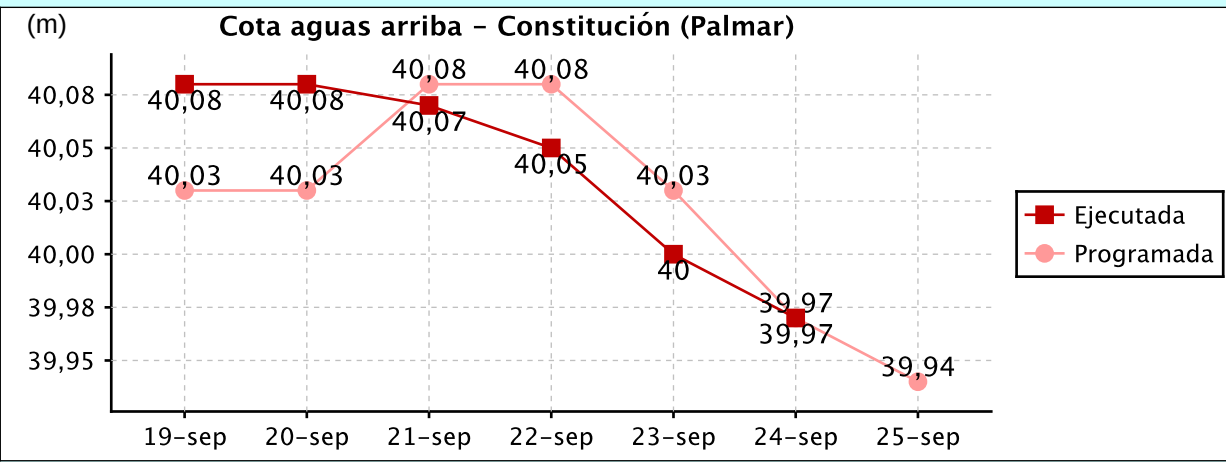
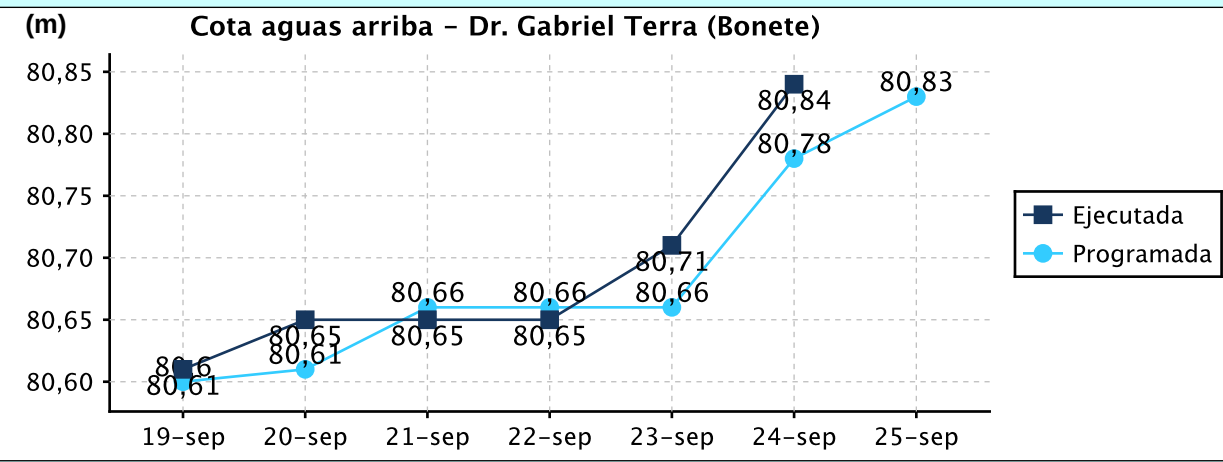


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,78	80,84
Baygorria	53,95	54,25
Palmar	39,97	39,97
SGU	35,00	35

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

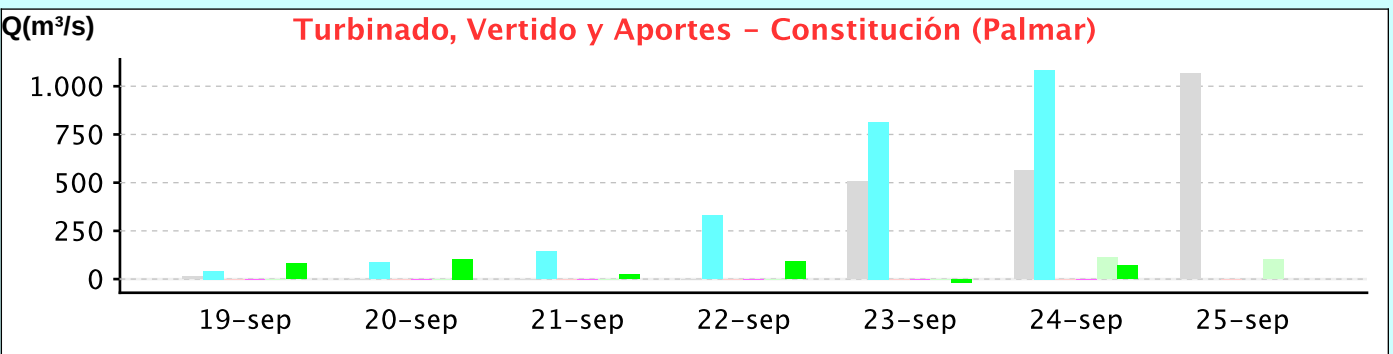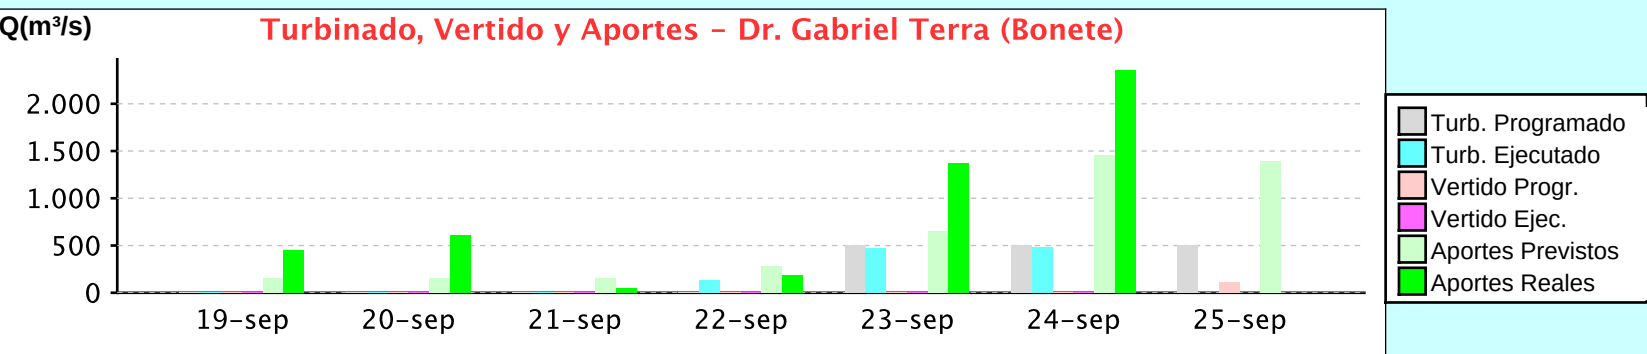

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

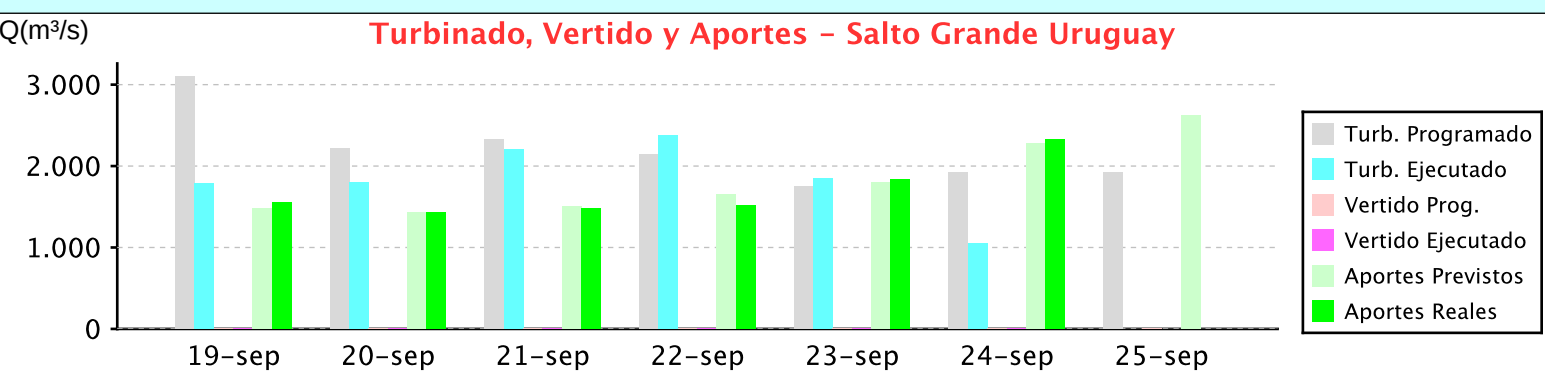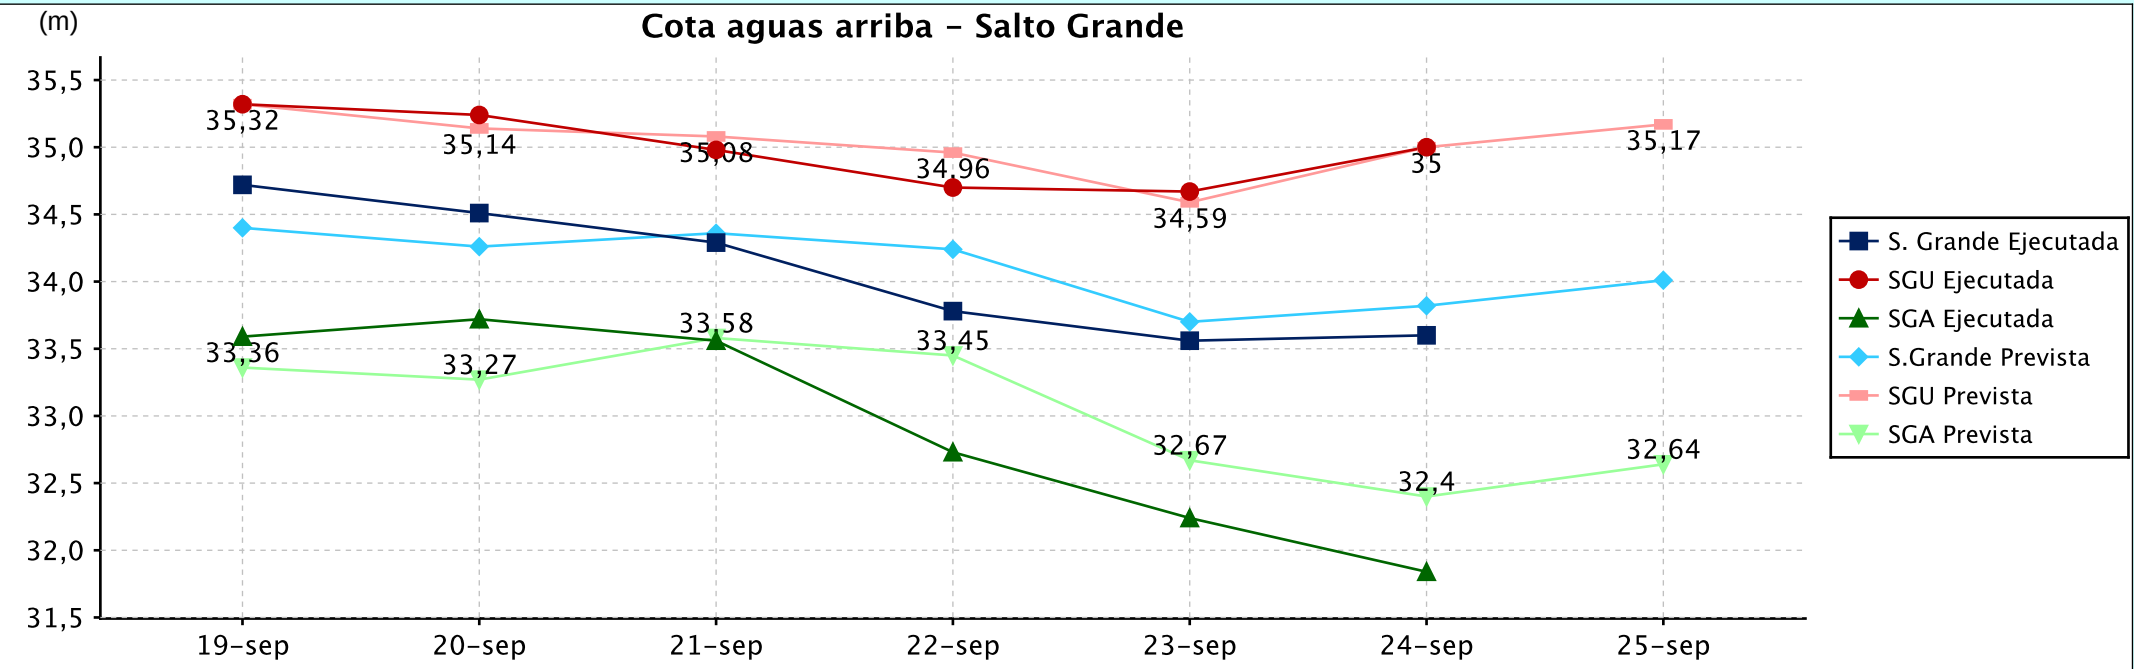

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,00
Cota Vista Arg	31,84
Cota real	33,60
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
60.248	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	478
Baygorria	521	901
Palmar	561	1.085
SGU	1.918	1.053

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.460	2.353
Baygorria	277	726
Palmar	110	71
SGU	2.275	2.322

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	16
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
