




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 26 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-94
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.512
Baygorria	2.375
Palmar	7.872
Salto Grande	10.307
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	4.615
TOTAL Generación	27.577

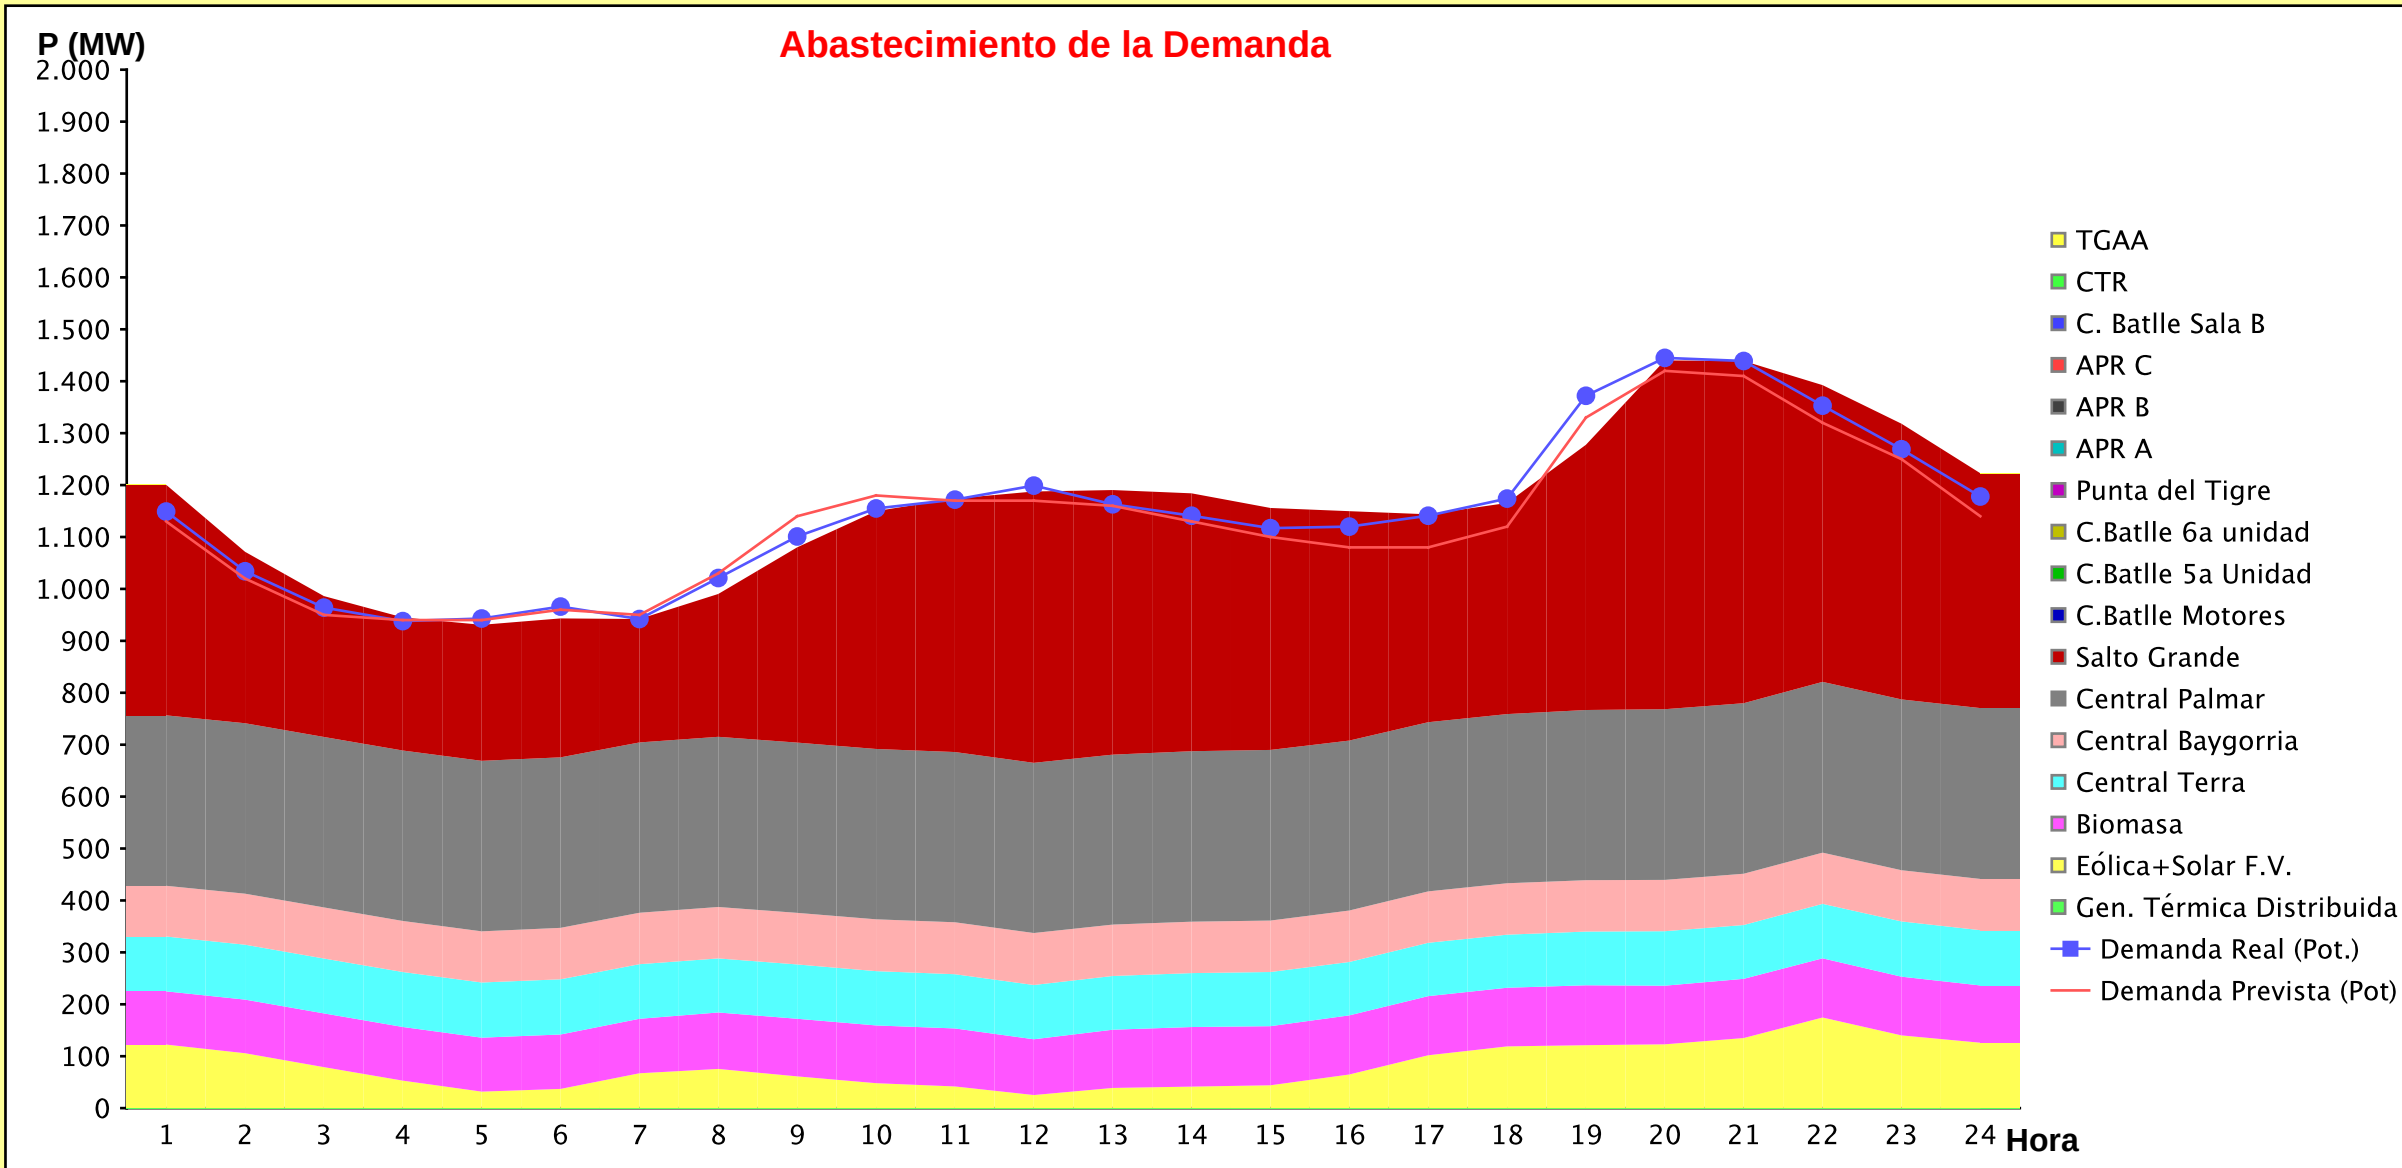

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.577
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	27.120
Diferencia (MWh)	457
Ejecutada - Programada	1,69 %

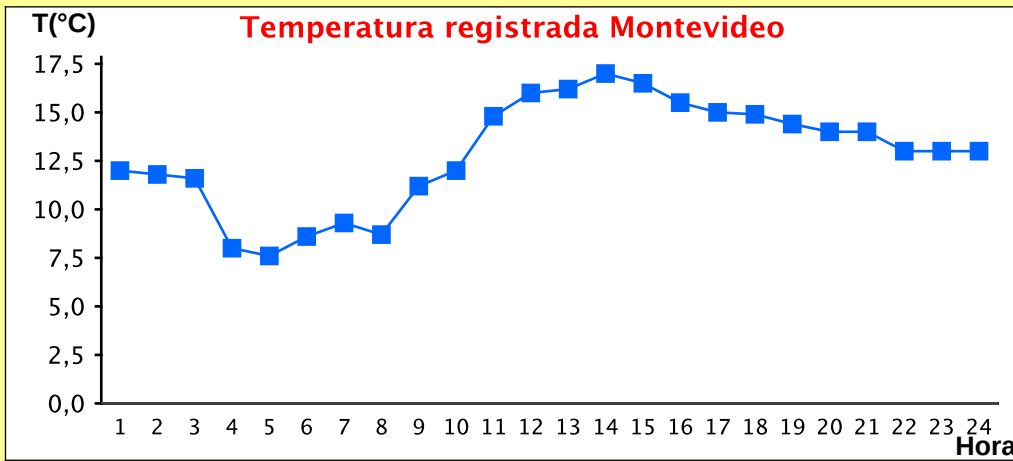

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1218 Hora 12:30
Potencia mínima:	938 Hora 04:33
Pico noche:	1463 Hora 20:22



Generación Media (MW)	
Eólica	73,4
Biomasa	110,7
Solar fotovoltaica	11,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

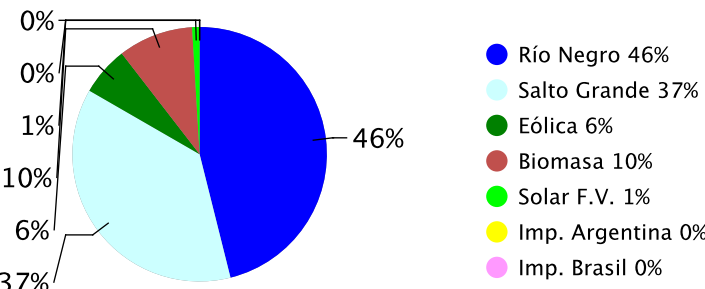



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

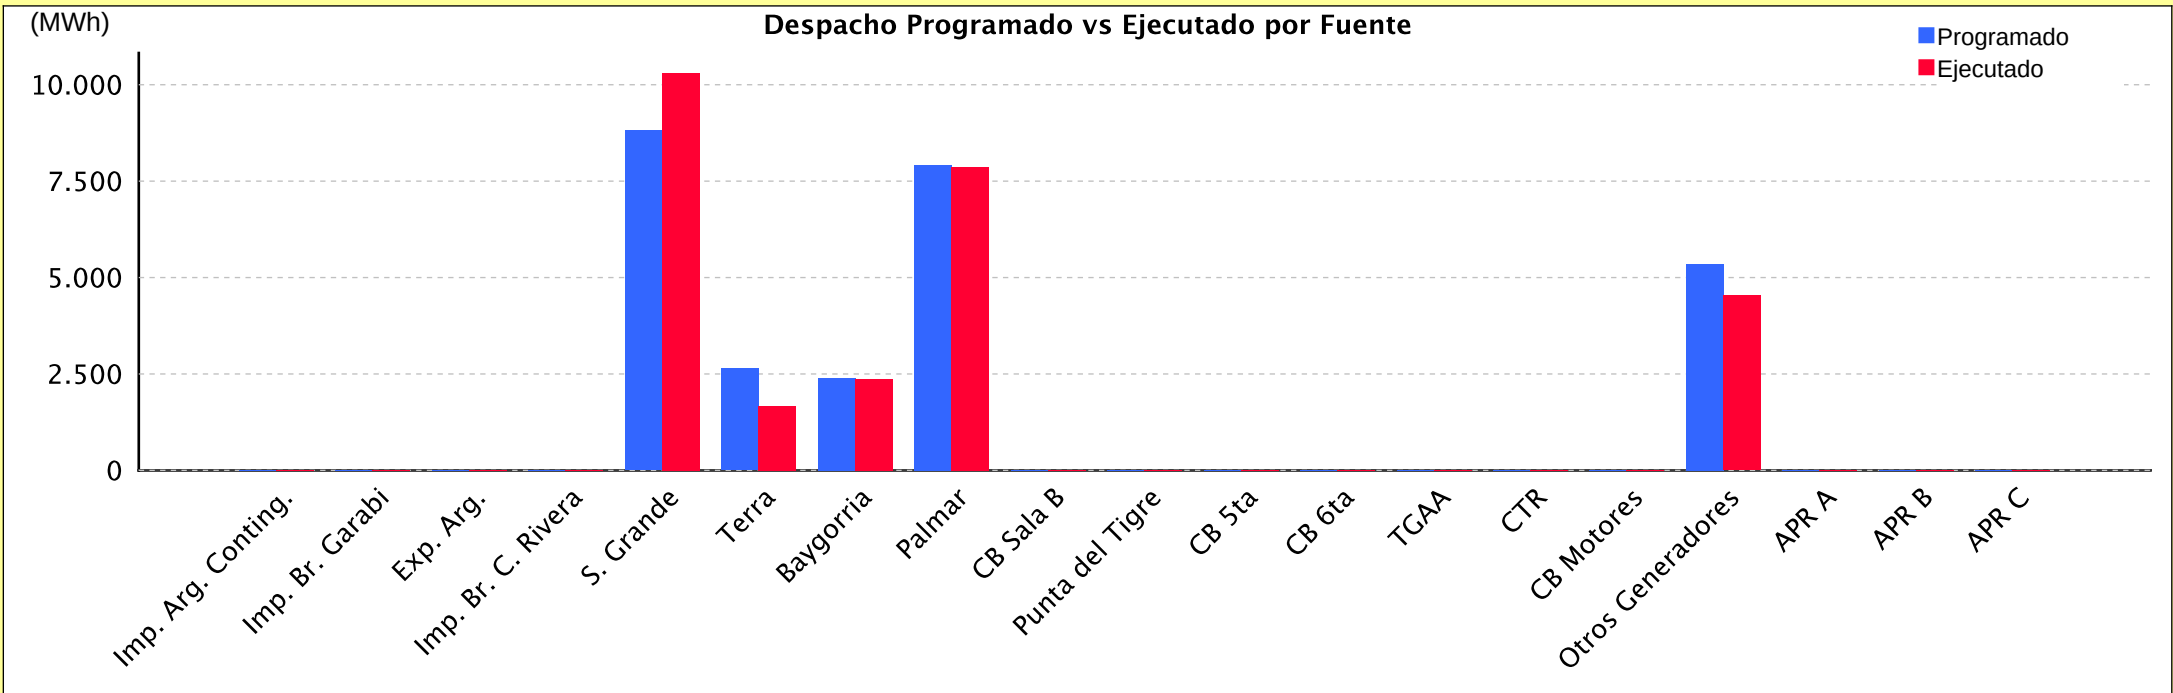



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

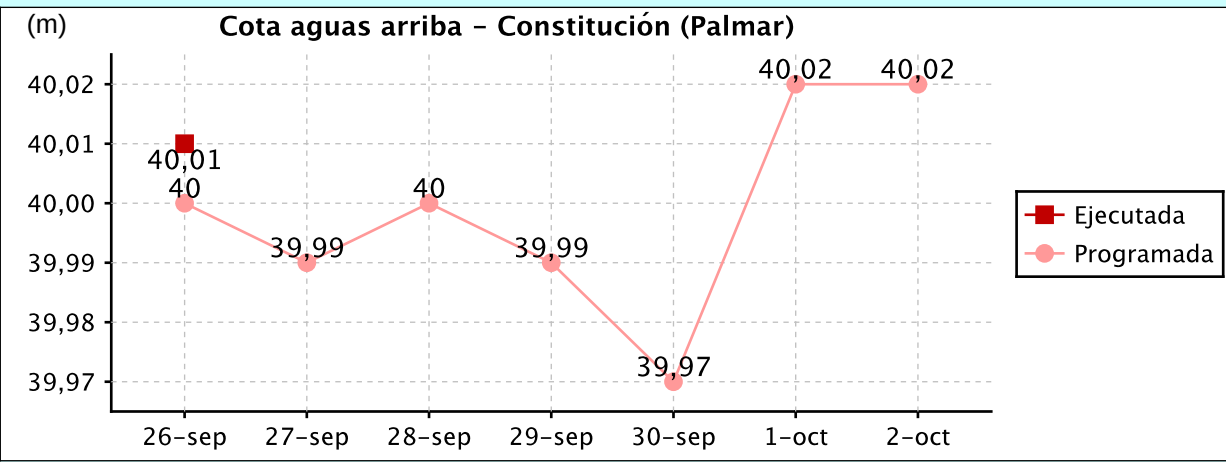
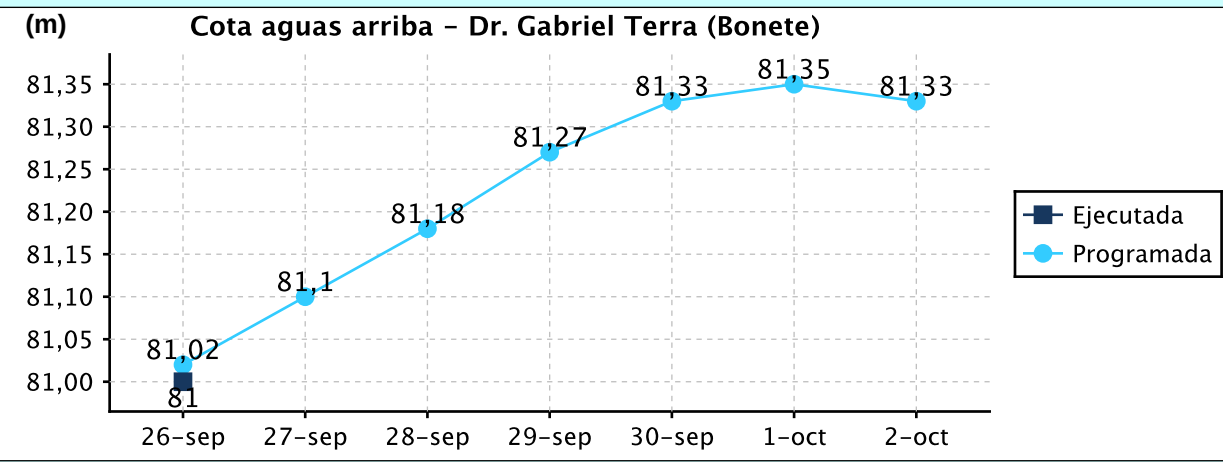


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,02	81
Baygorria	54,10	53,97
Palmar	40,00	40,01
SGU	35,37	35,46

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

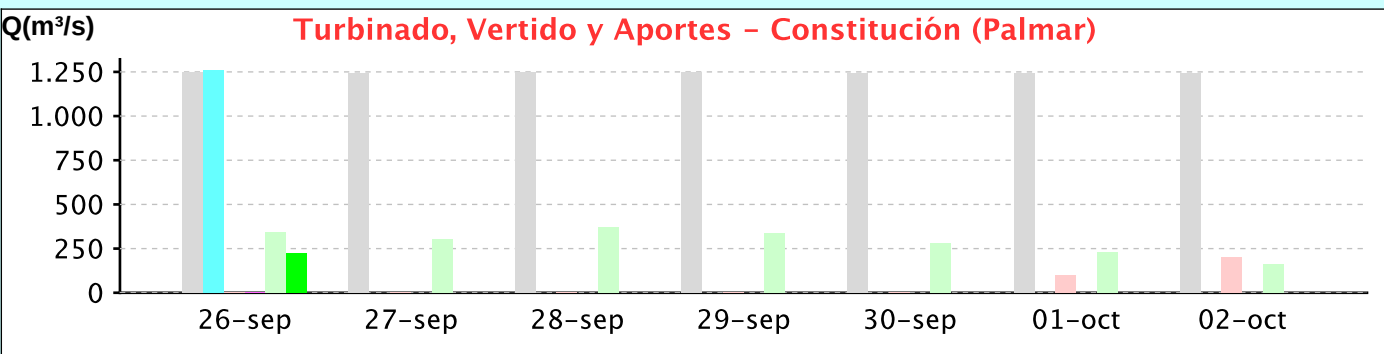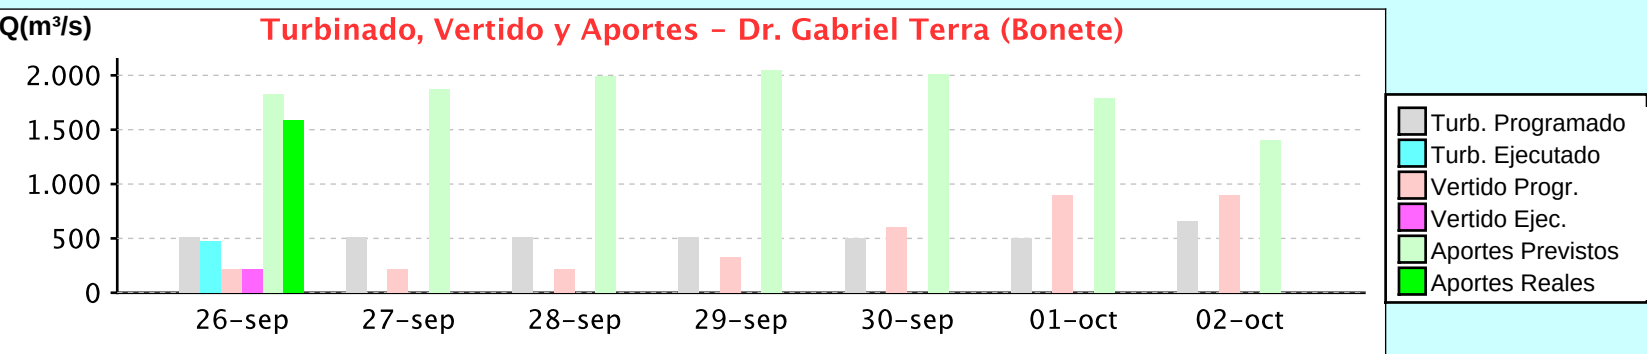

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

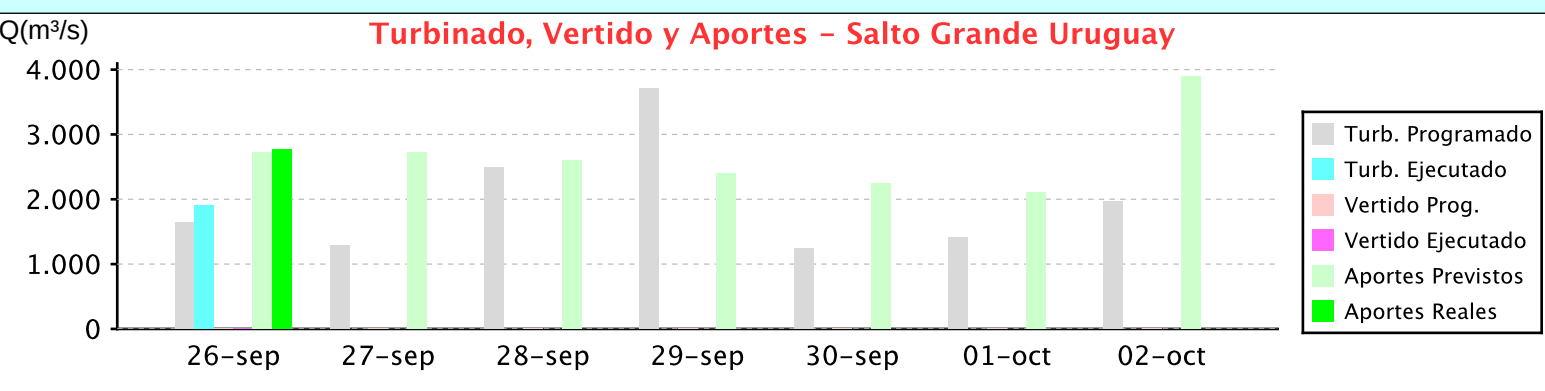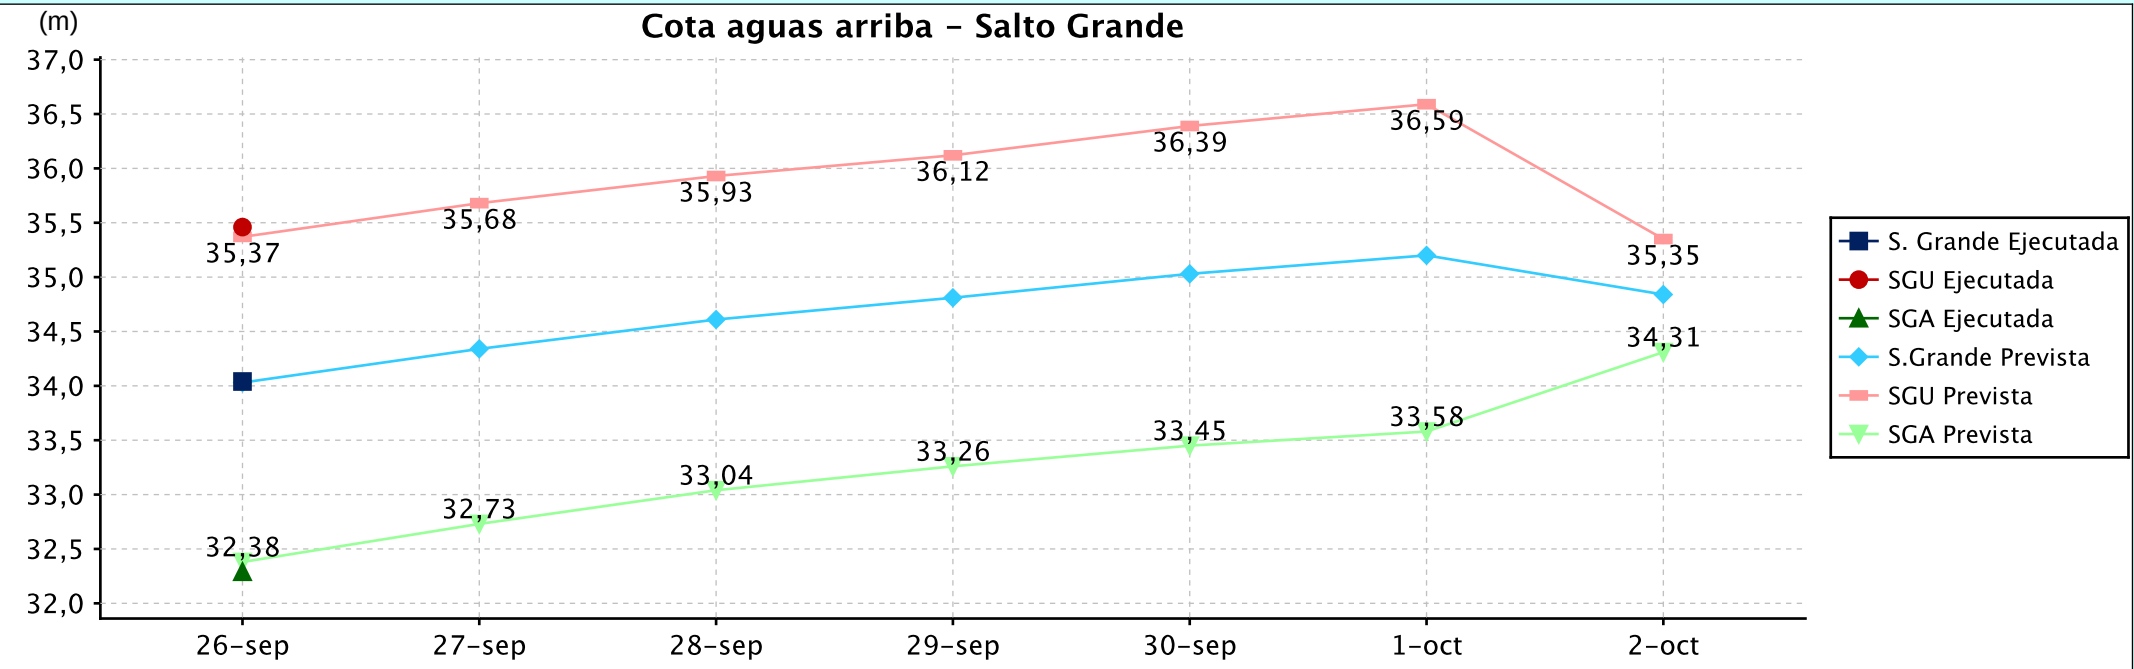

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,46
Cota Vista Arg	32,29
Cota real	34,04
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	64.474

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	476
Baygorria	887	903
Palmar	1.245	1.258
SGU	1.645	1.907

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.829	1.587
Baygorria	154	127
Palmar	343	222
SGU	2.725	2.762

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	219
Baygorria	0	96
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
