




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 28 de septiembre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-54
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.526
Baygorria	2.336
Palmar	7.484
Salto Grande	12.662
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	10.375
TOTAL Generación	35.316



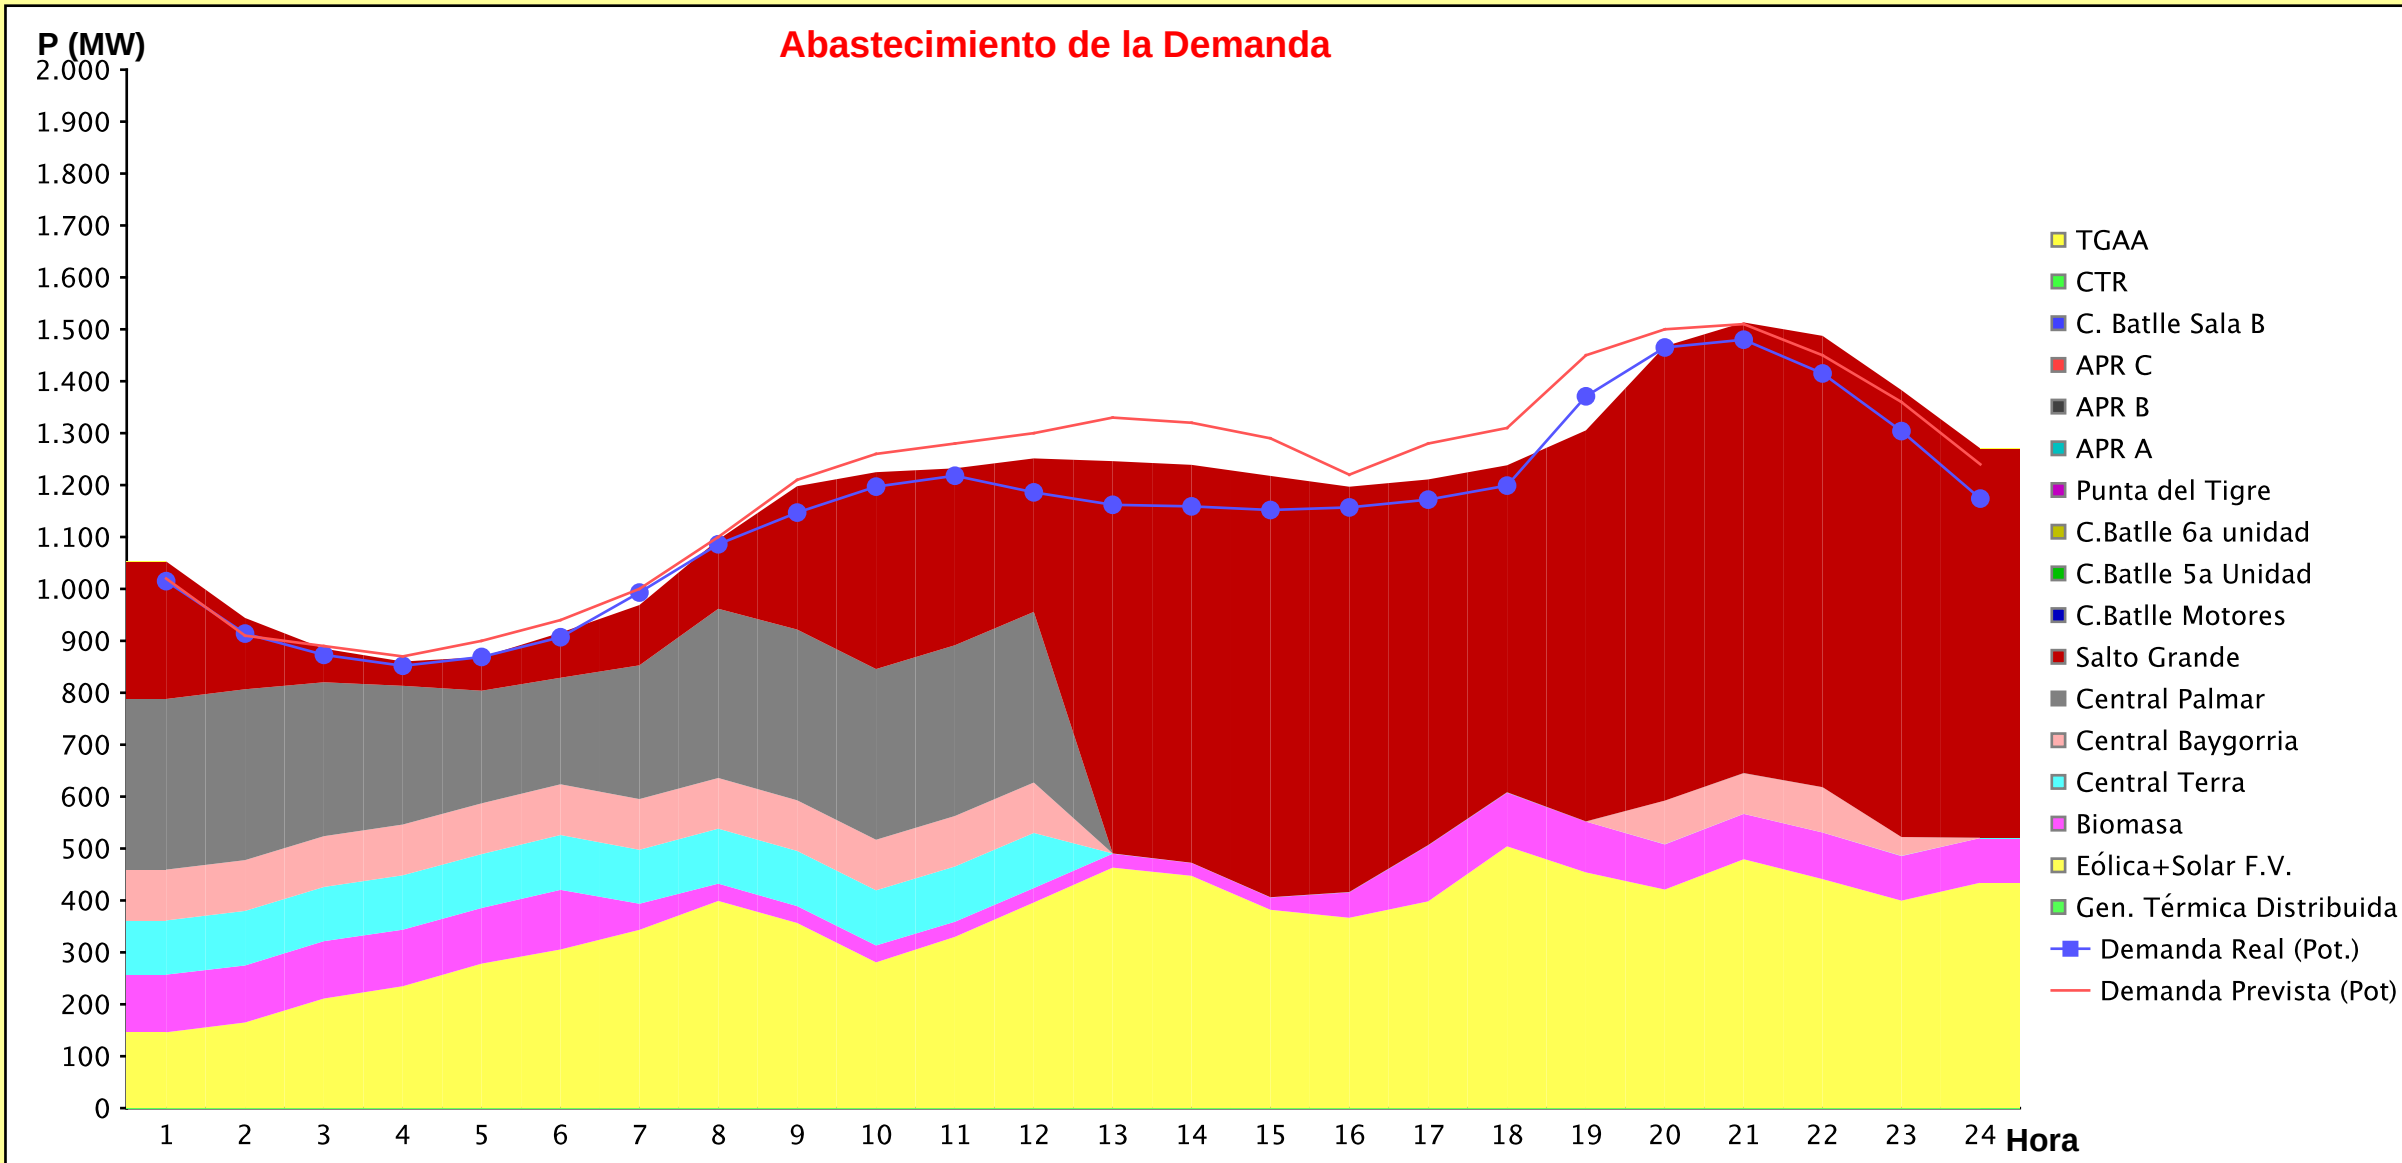


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.112
Hidráulica	7.112
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.112

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.204
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.940
Diferencia (MWh)	-736
Ejecutada - Programada	-2,54 %


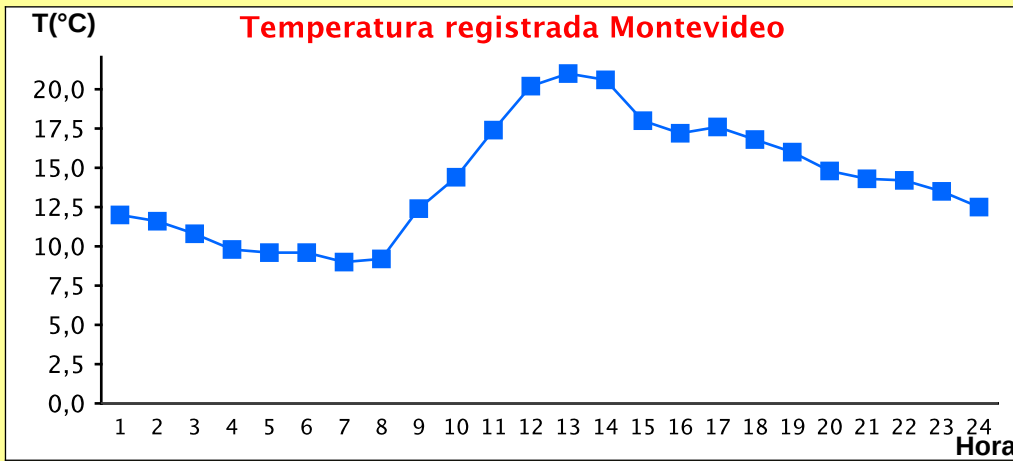


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1286 Hora 11:44
Potencia mínima:	848 Hora 03:51
Pico noche:	1531 Hora 20:33
Generación Media (MW)	
Eólica	346,8
Biomasa	72,9
Solar fotovoltaica	11,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

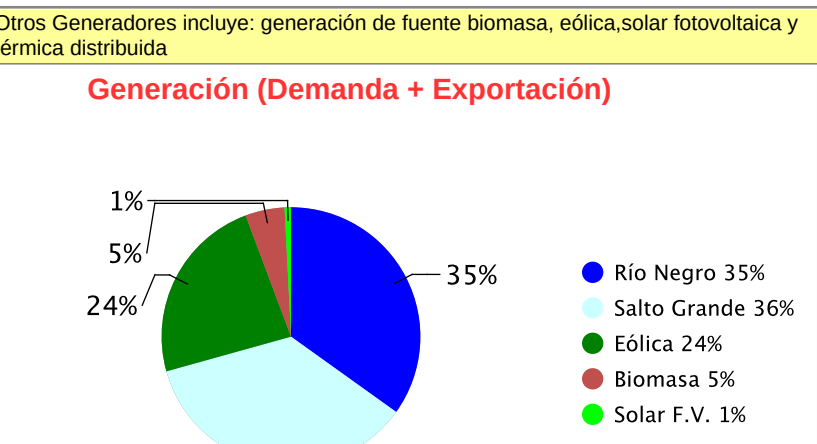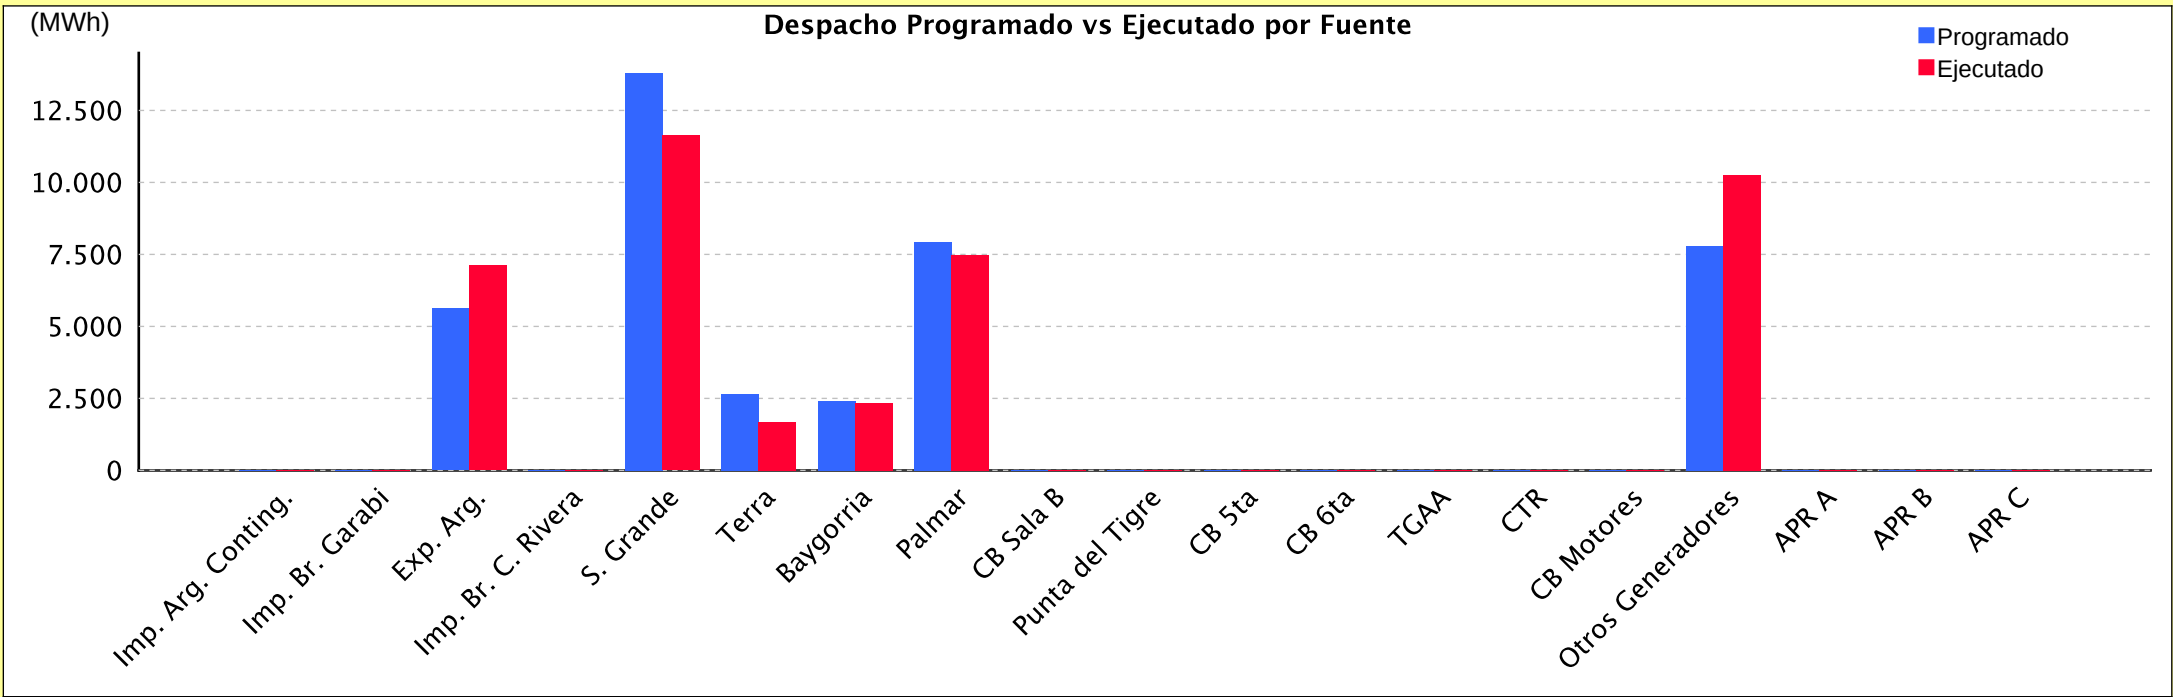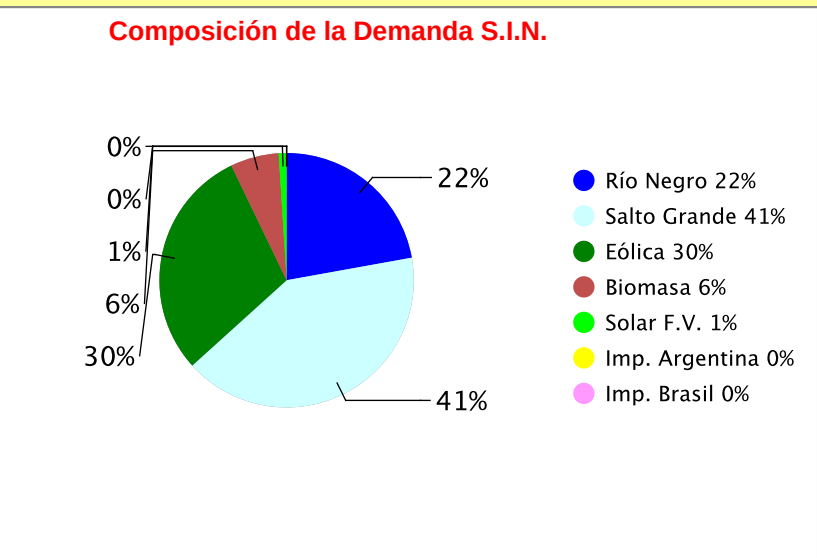



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

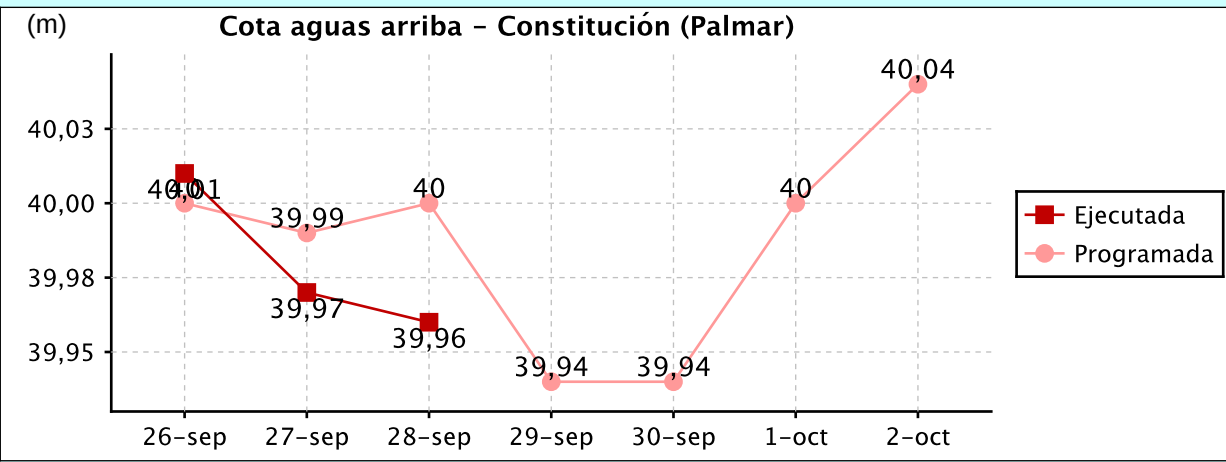
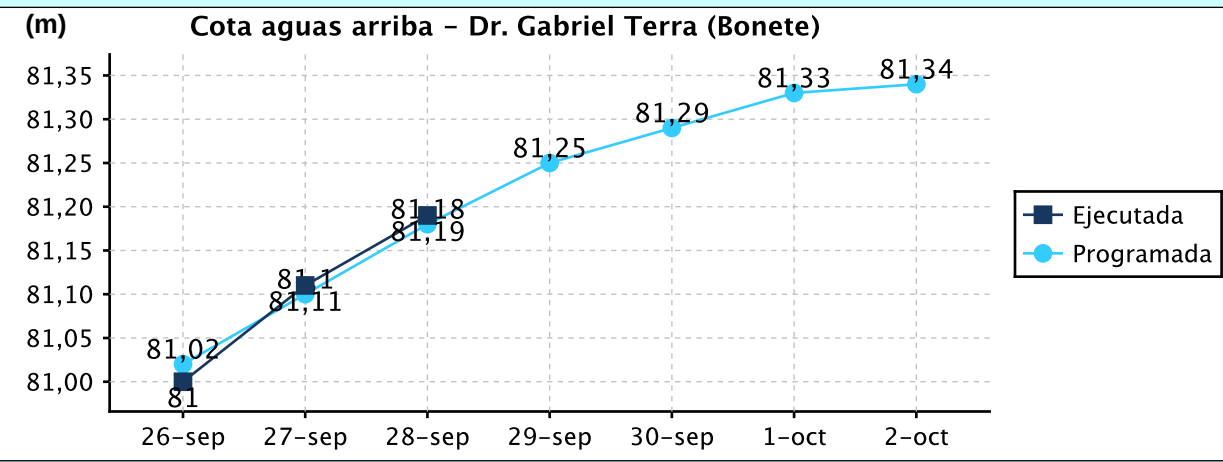


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,18	81,19
Baygorria	53,84	53,79
Palmar	40,00	39,96
SGU	35,93	35,78

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

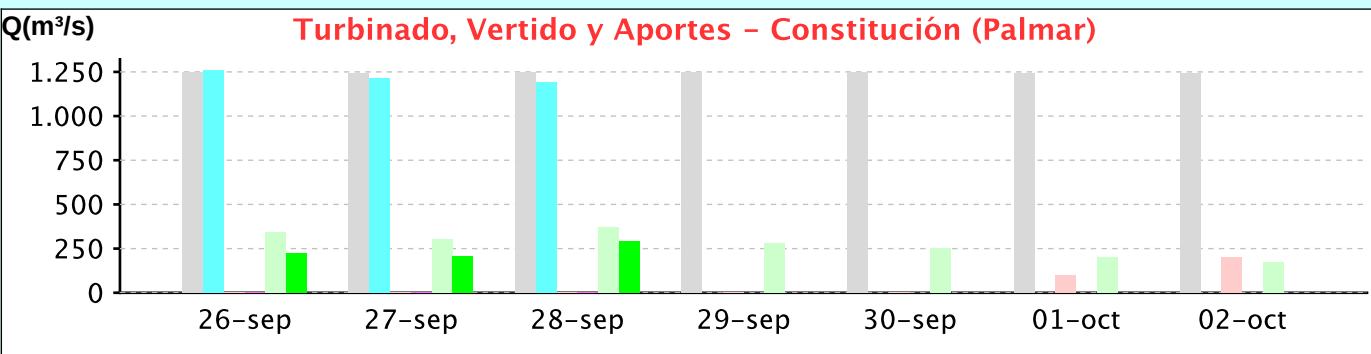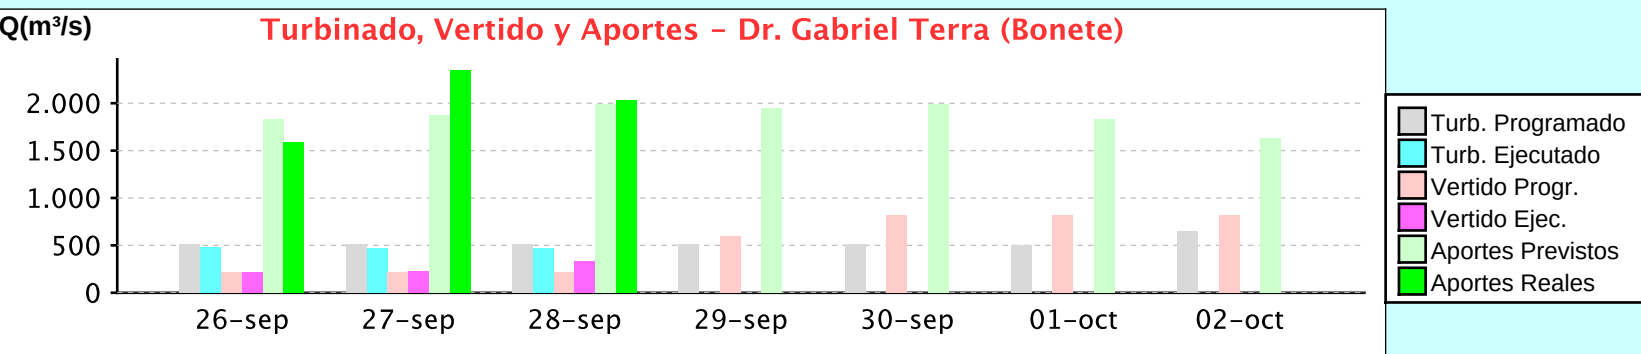

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

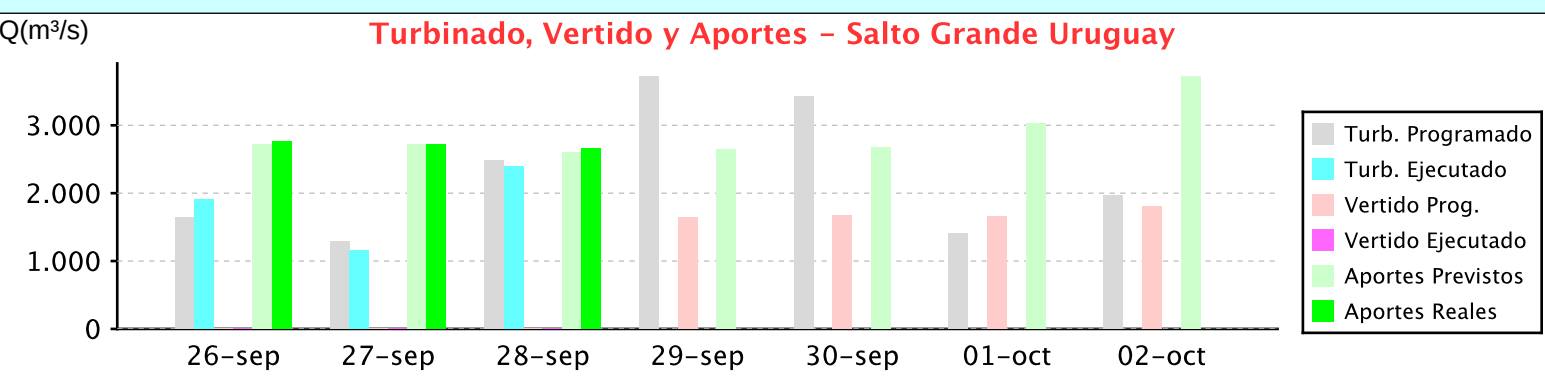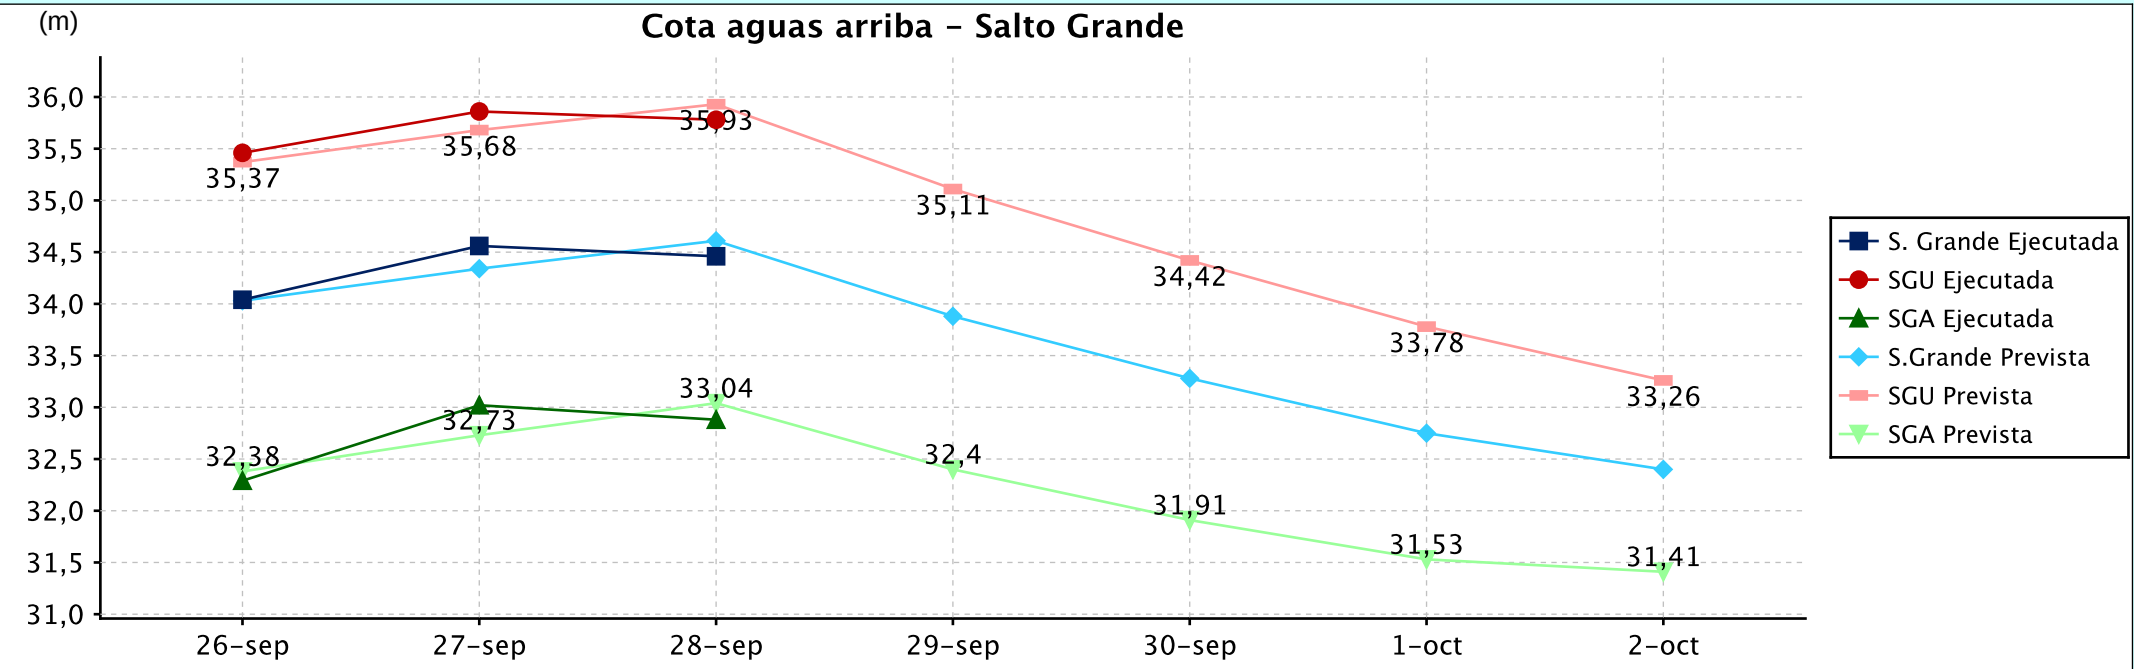

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,78
Cota Vista Arg	32,88
Cota real	34,46
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	662

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	474
Baygorria	887	889
Palmar	1.245	1.193
SGU	2.486	2.398

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.991	2.034
Baygorria	0	22
Palmar	371	289
SGU	2.600	2.666

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	332
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
