




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 29 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.507
Baygorria	2.334
Palmar	7.542
Salto Grande	20.275
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	12.152
TOTAL Generación	44.756

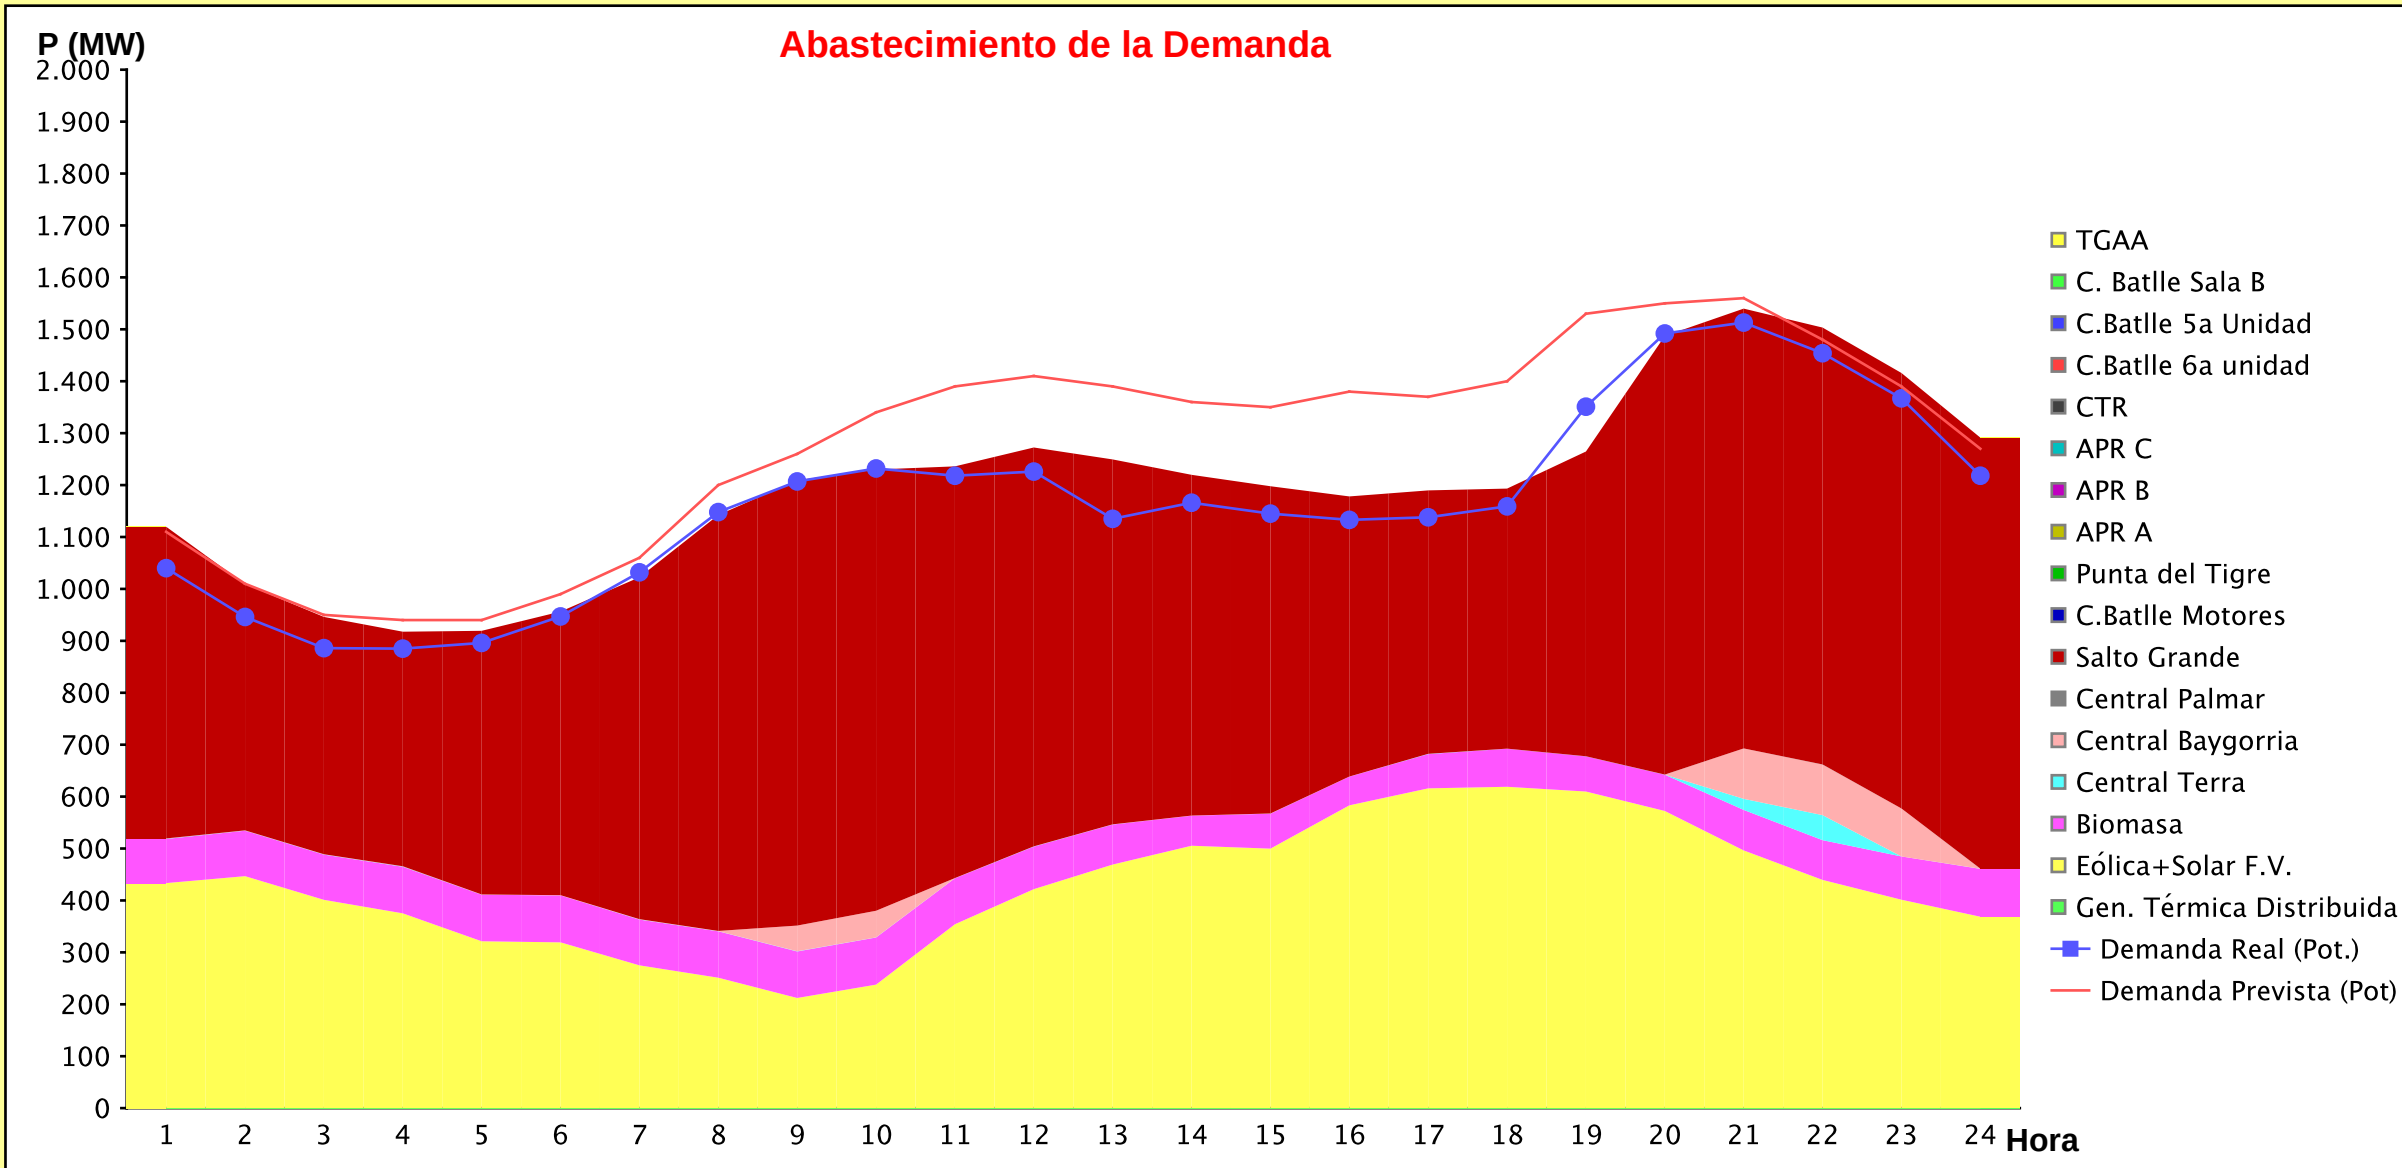

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	16.105
Hidráulica	16.105
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	16.105


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.651
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.630
Diferencia (MWh)	-1.979
Ejecutada - Programada	-6,46 %


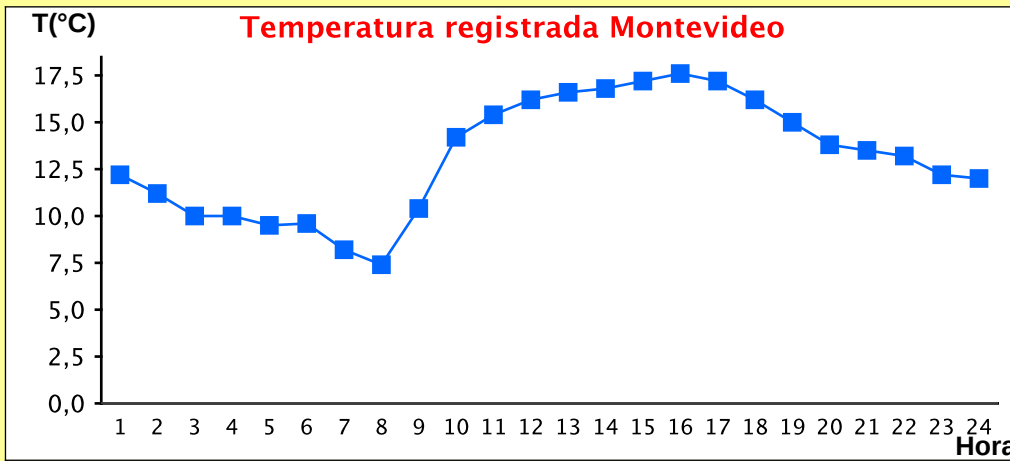


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1294 Hora 11:48
Potencia mínima:	897 Hora 03:50
Pico noche:	1546 Hora 20:39

Generación Media (MW)	
Eólica	421,2
Biomasa	80,7
Solar fotovoltaica	3,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


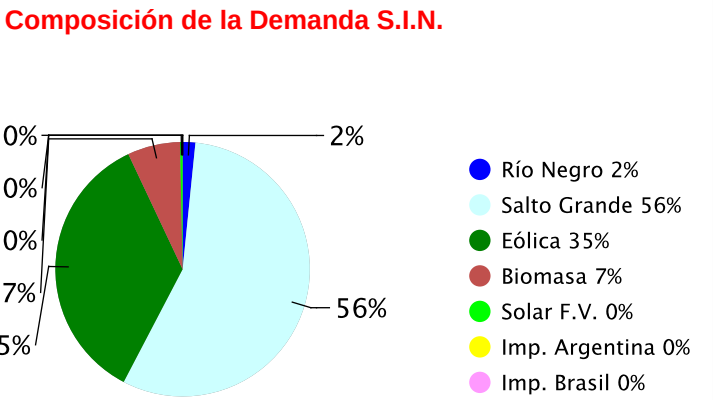


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

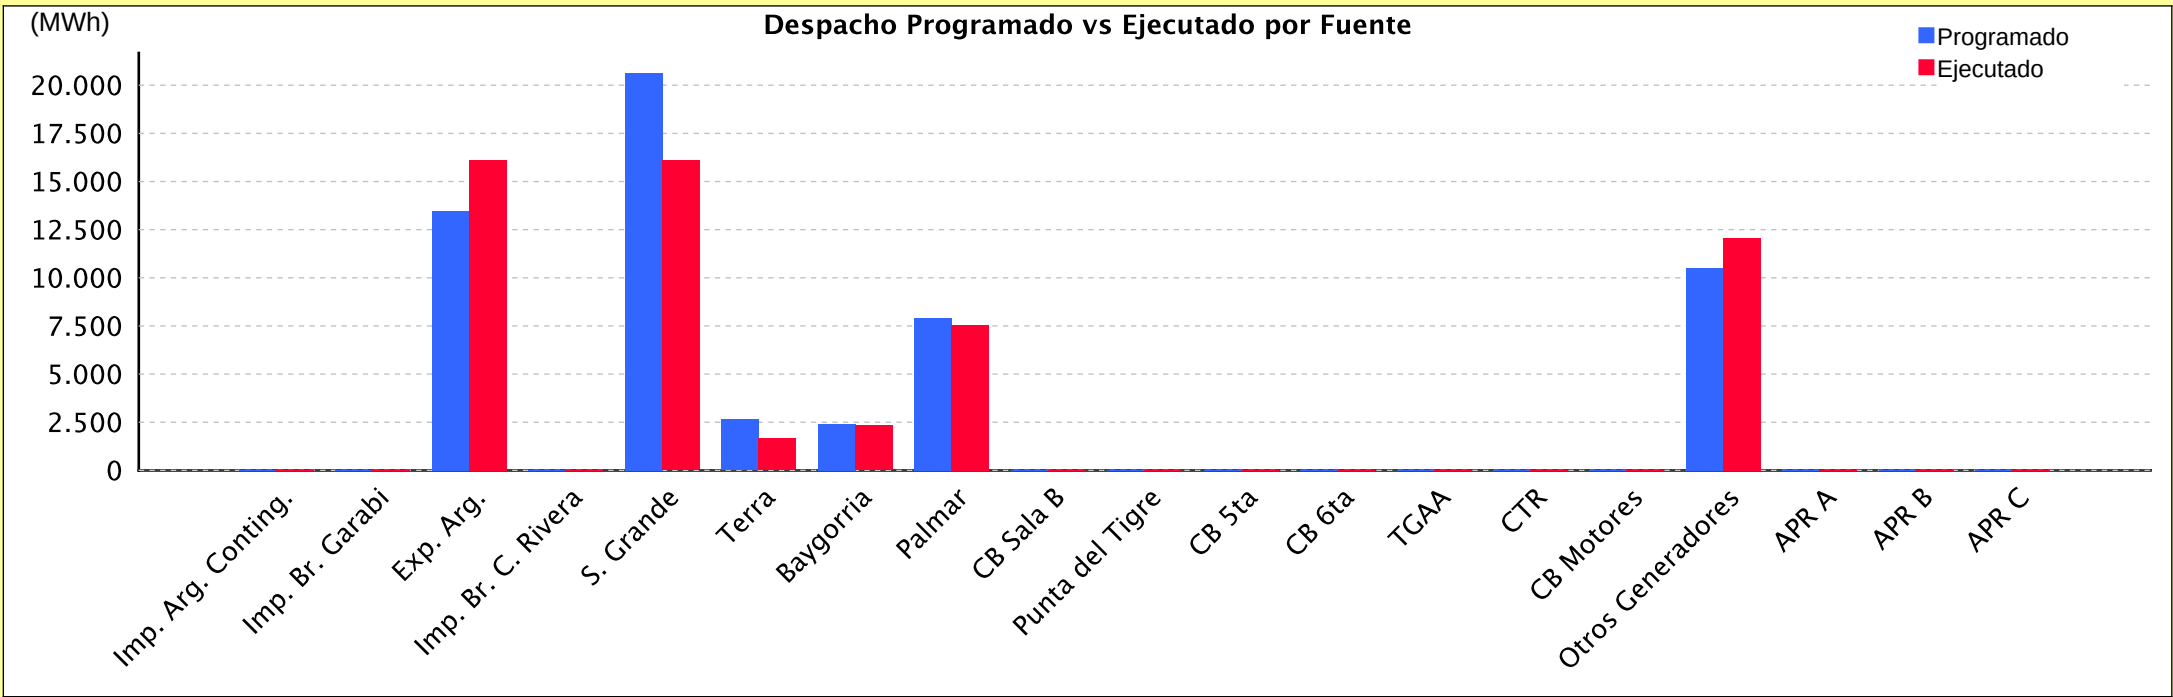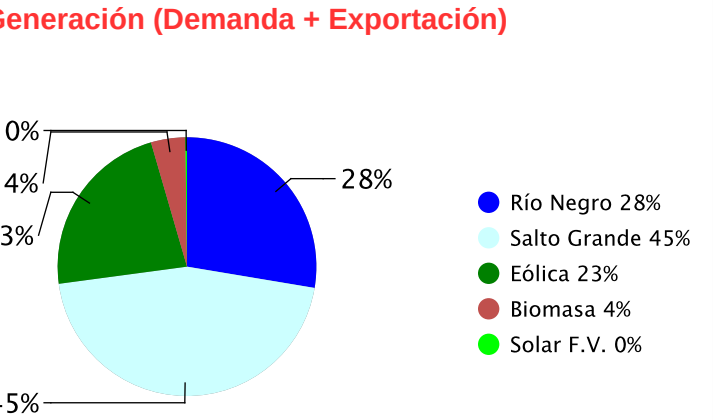



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

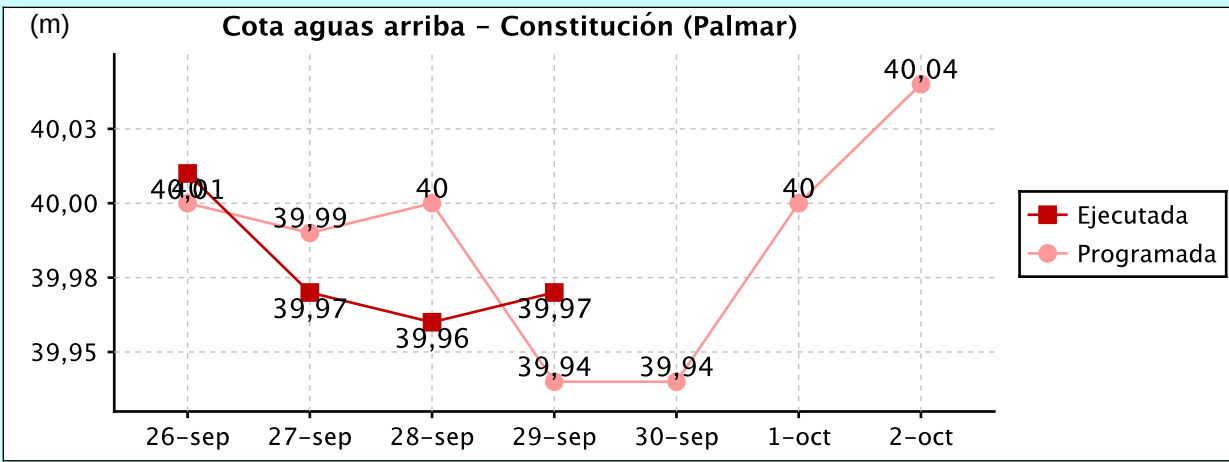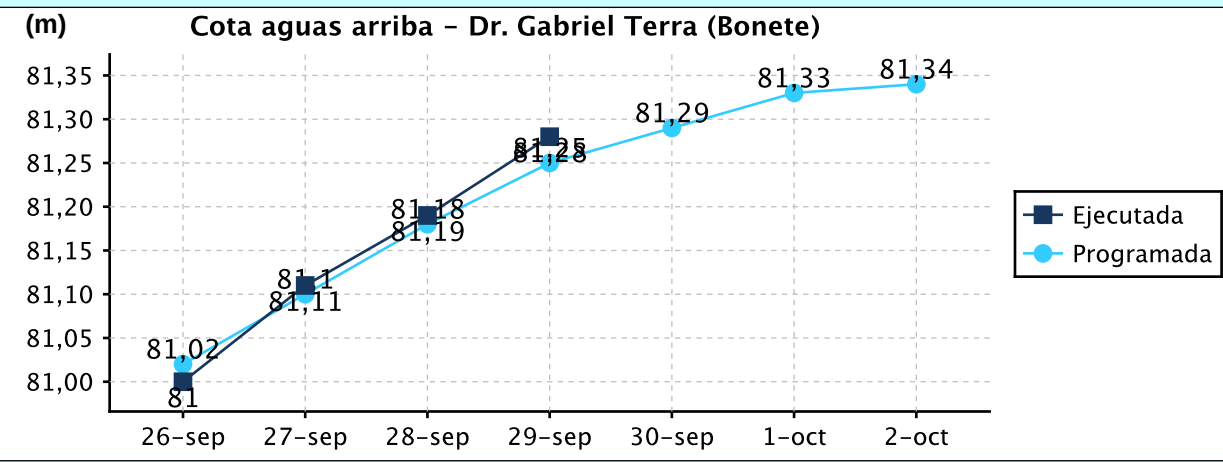


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,25	81,28
Baygorria	53,97	53,81
Palmar	39,94	39,97
SGU	35,11	35,16

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

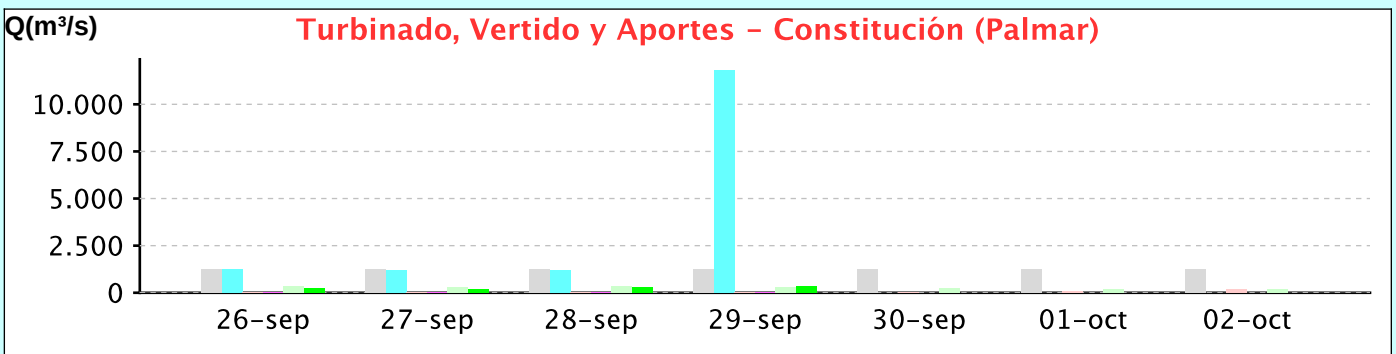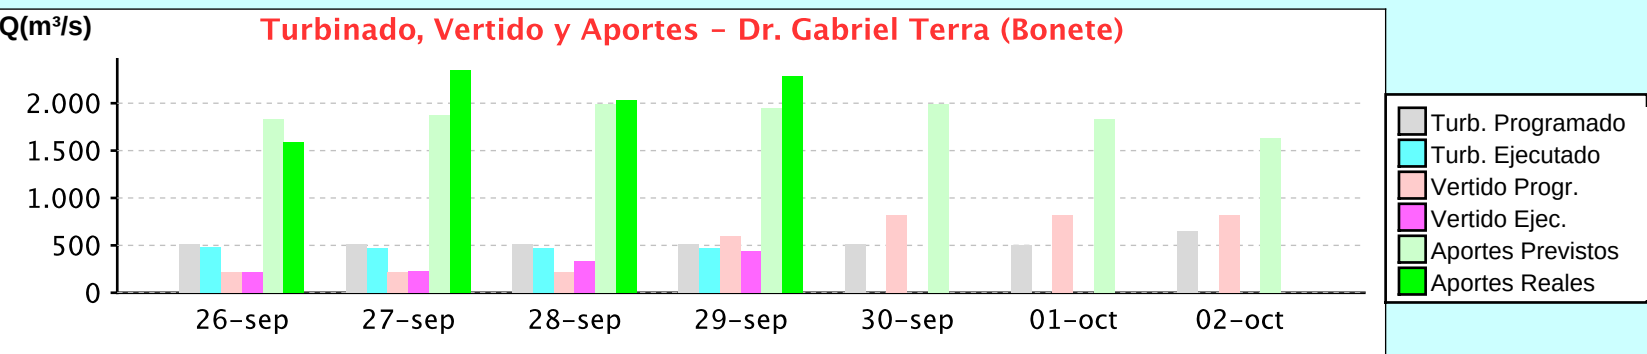

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

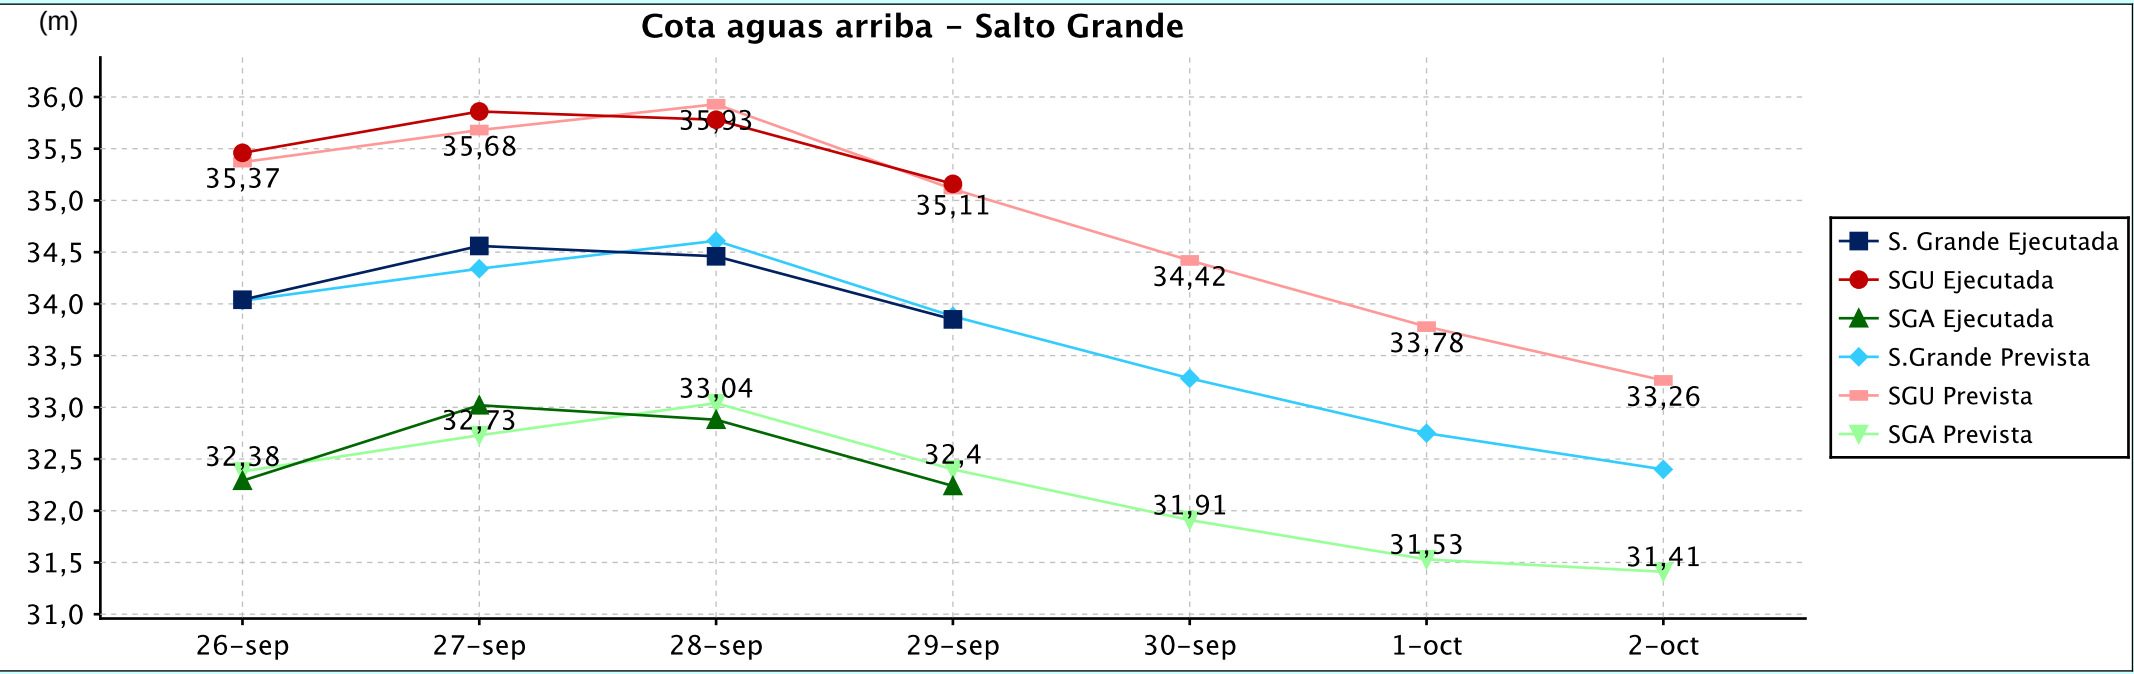


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	473
Baygorria	887	894
Palmar	1.245	11.798
SGU	3.718	4.129

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.950	2.282
Baygorria	0	11
Palmar	280	358
SGU	2.650	2.679

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	600	442
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.641	950

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

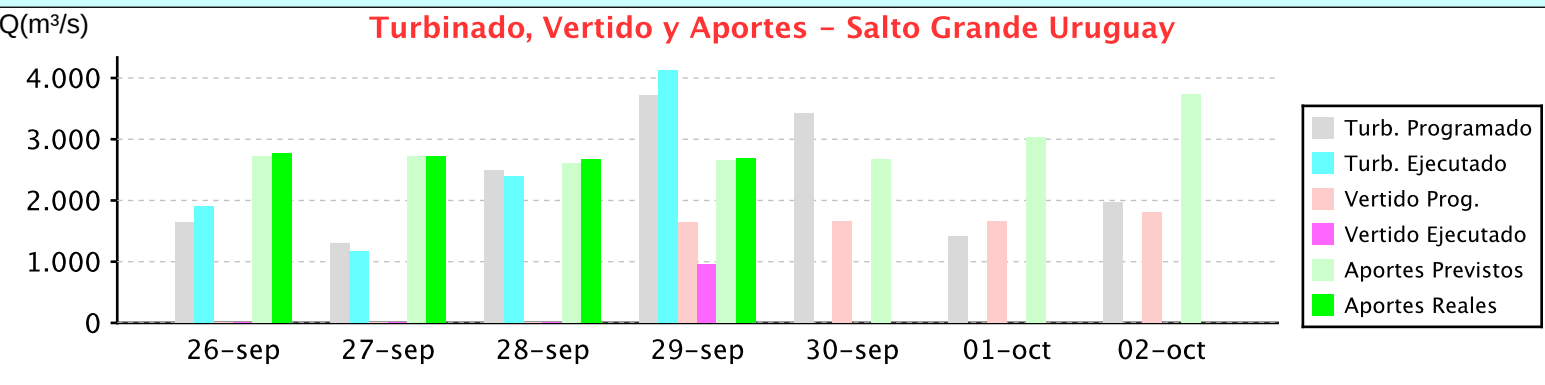

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,16
Cota Vista Arg	32,24
Cota real	33,85
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
58.117	

OBSERVACIONES
