




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 01 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-3
Sala B	-3
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-4
APR A	-1
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.582
Baygorria	2.401
Palmar	7.613
Salto Grande	17.742
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.210
TOTAL Generación	43.492

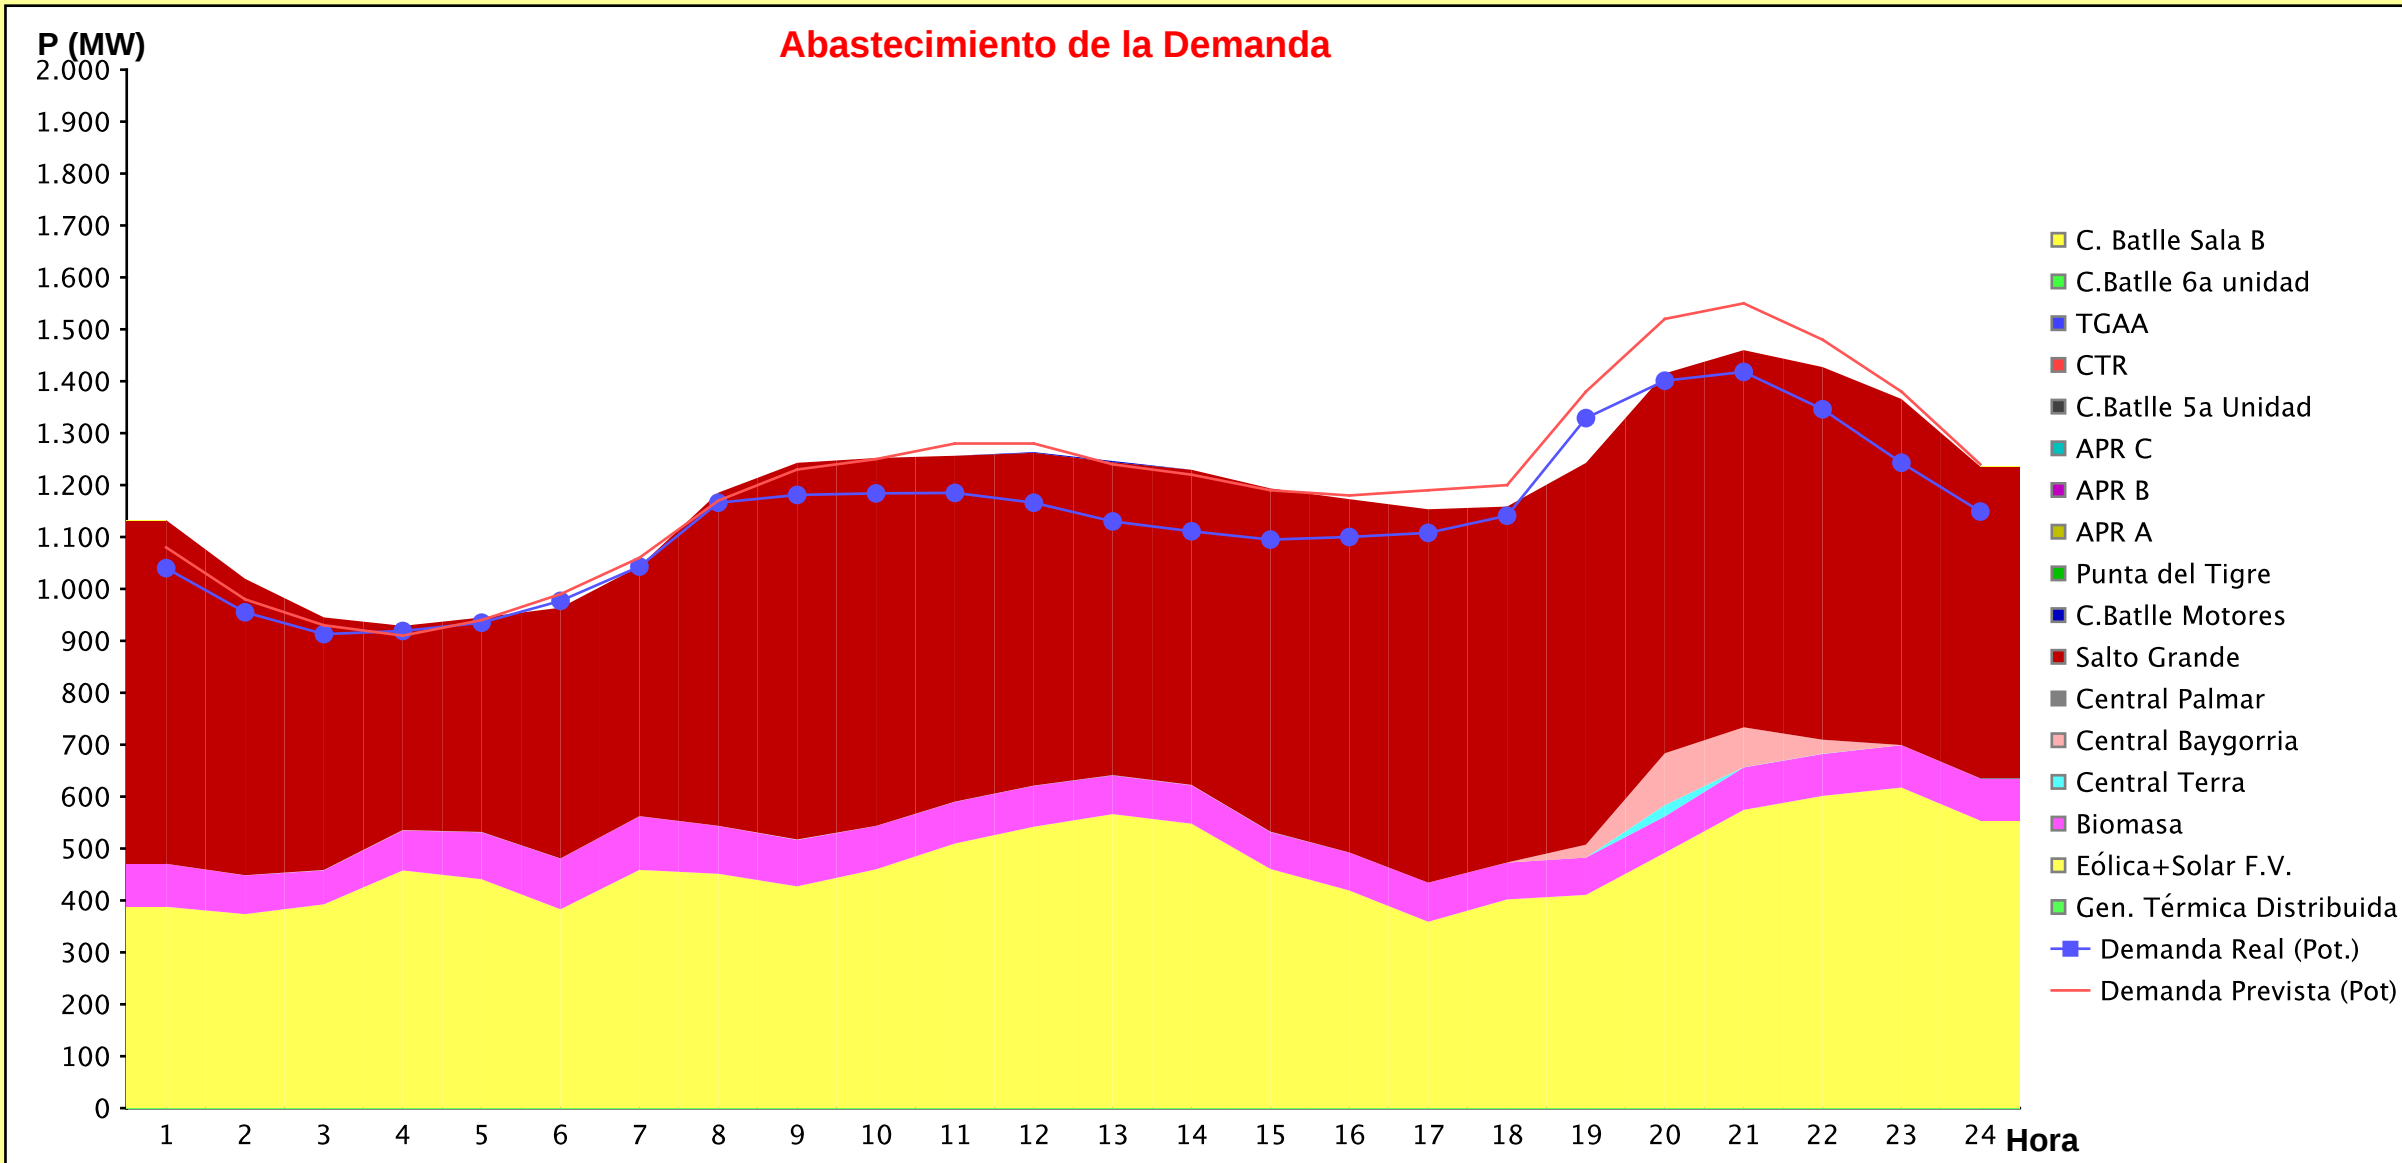

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	15.079
Hidráulica	15.079
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	15.079


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.413
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.870
Diferencia (MWh)	-457
Ejecutada - Programada	-1,58 %


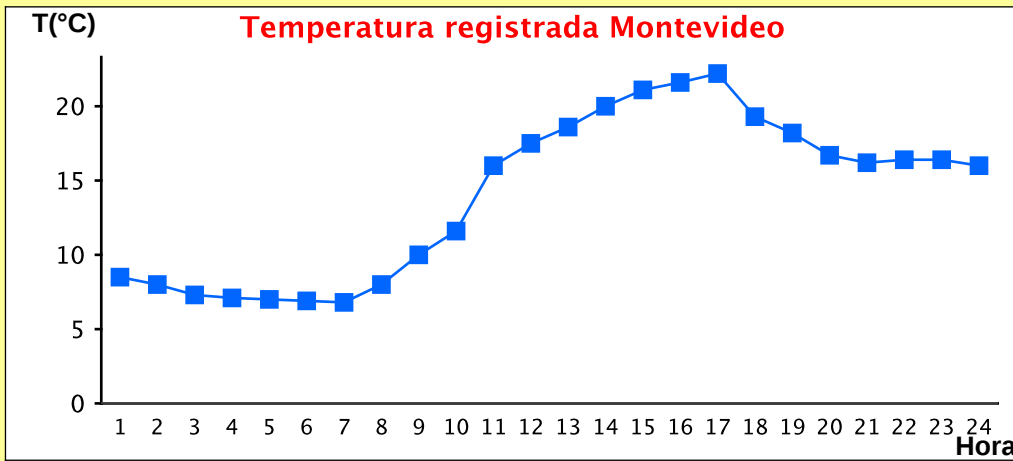


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1287 Hora 11:44
Potencia mínima:	923 Hora 03:52
Pico noche:	1472 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	456,7
Biomasa	80,7
Solar fotovoltaica	12,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


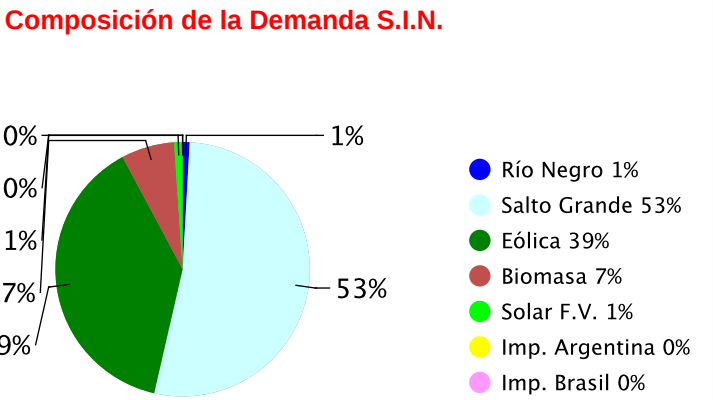


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

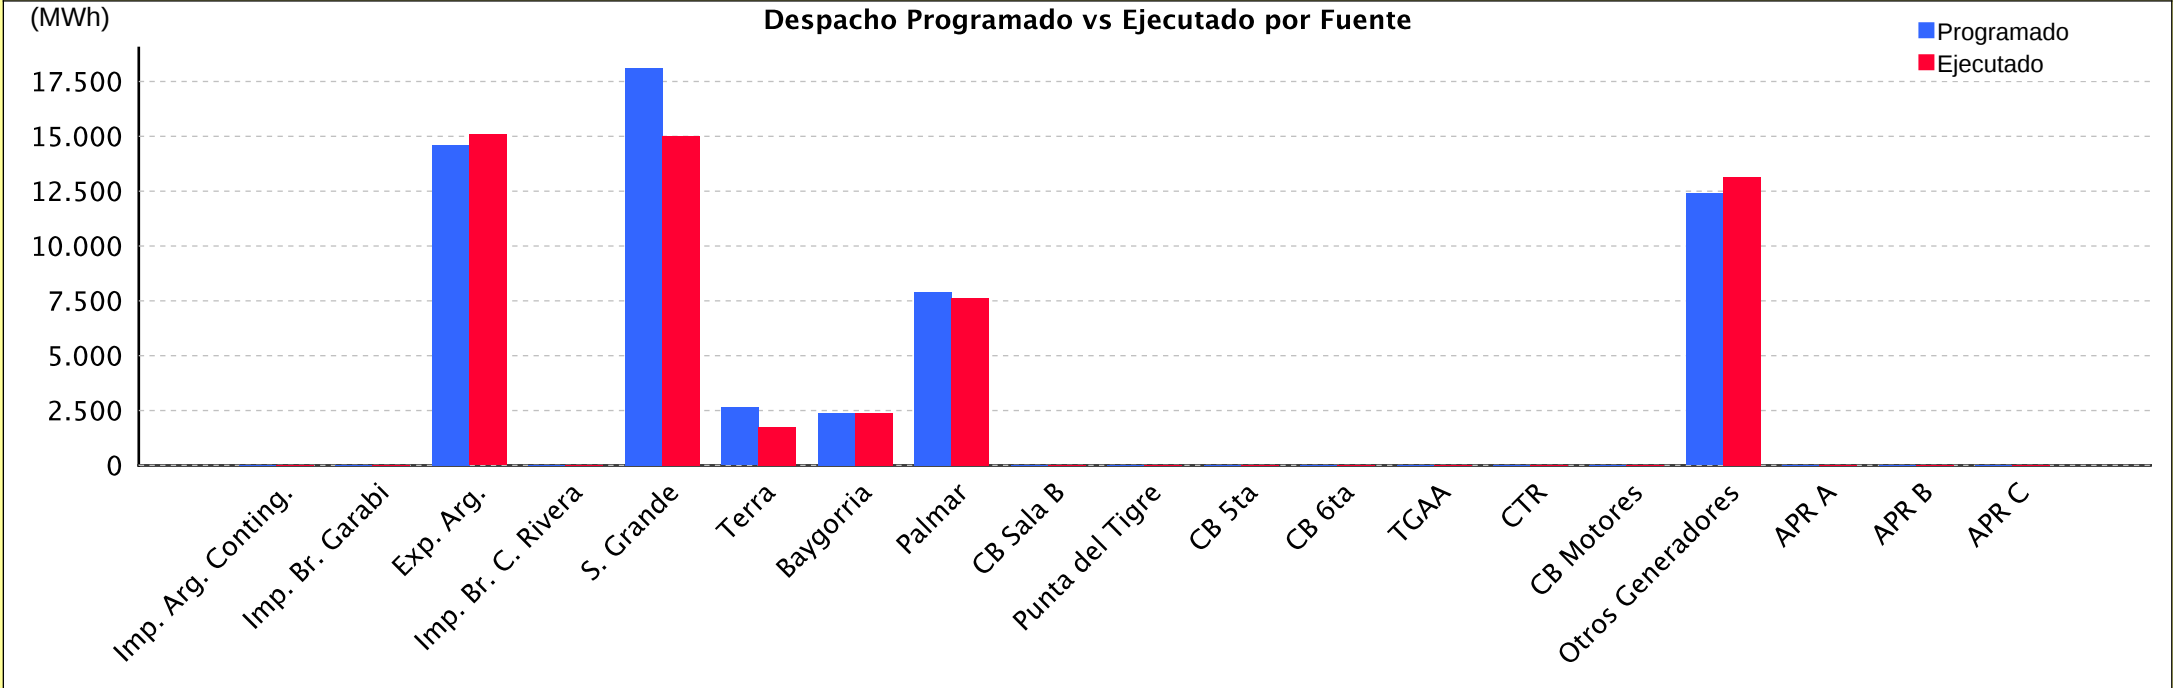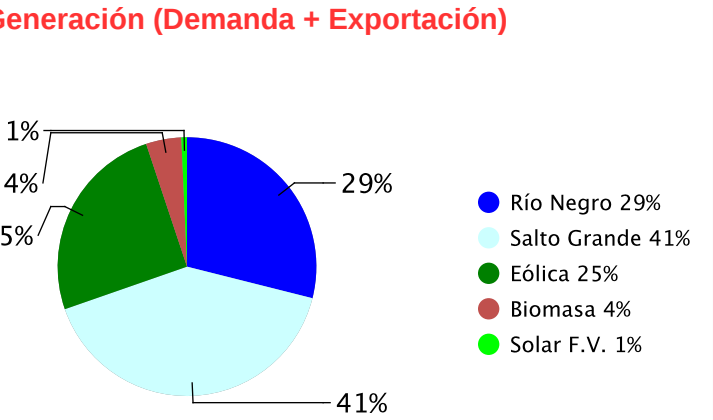



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

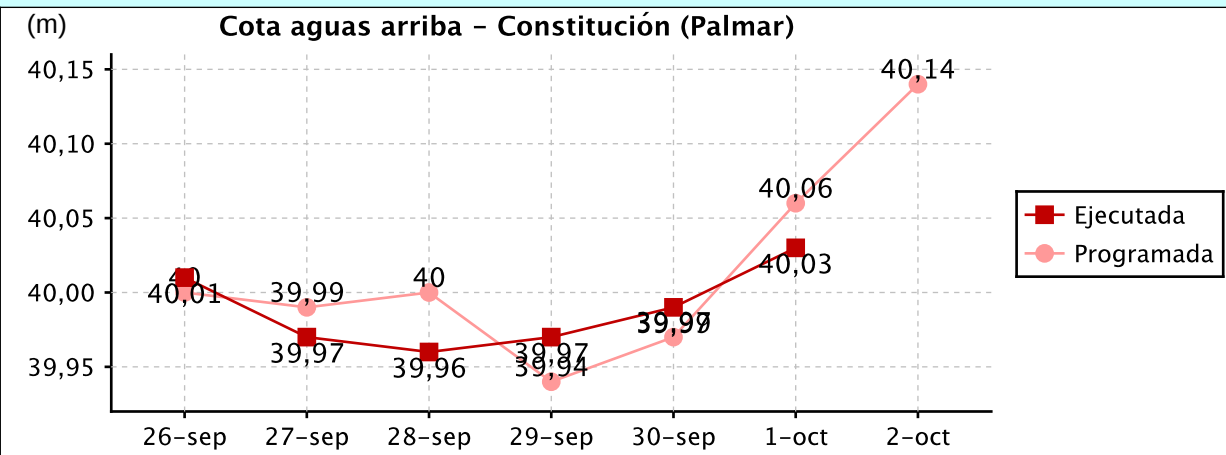
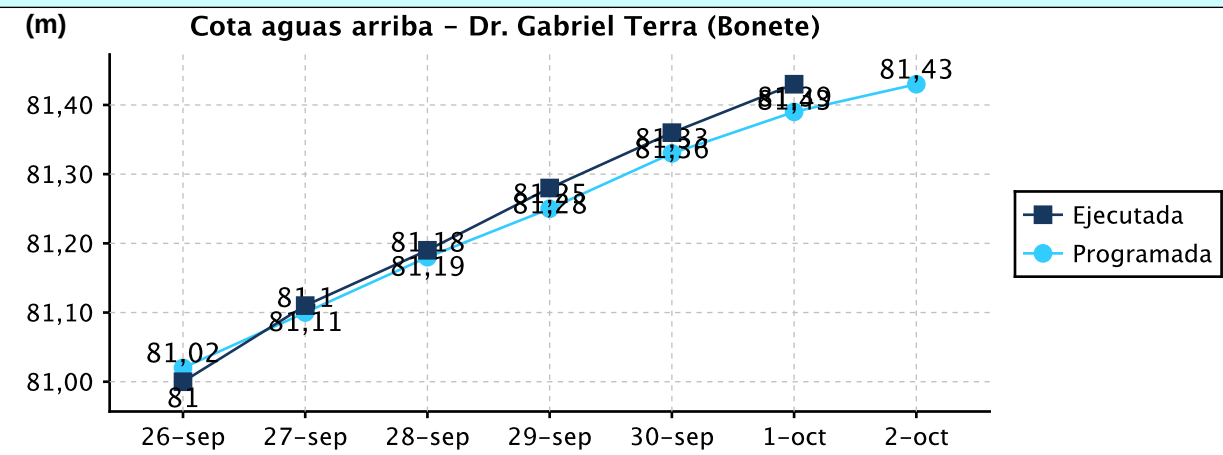


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,39	81,43
Baygorria	53,91	54,21
Palmar	40,06	40,03
SGU	33,63	33,21

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

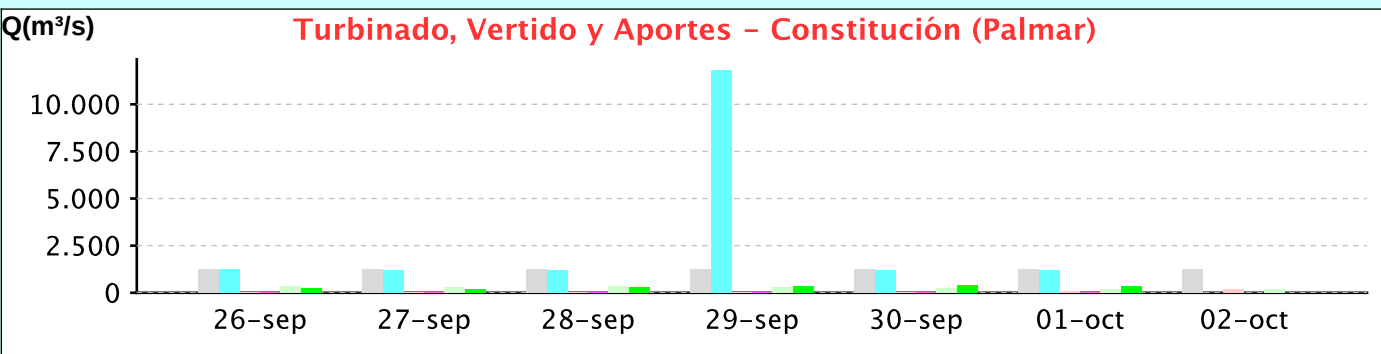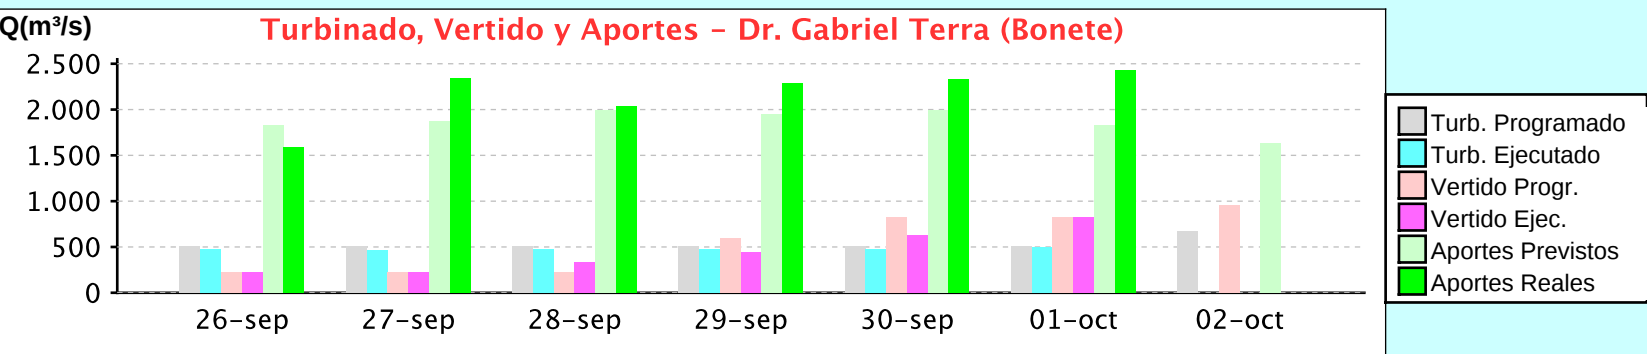

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

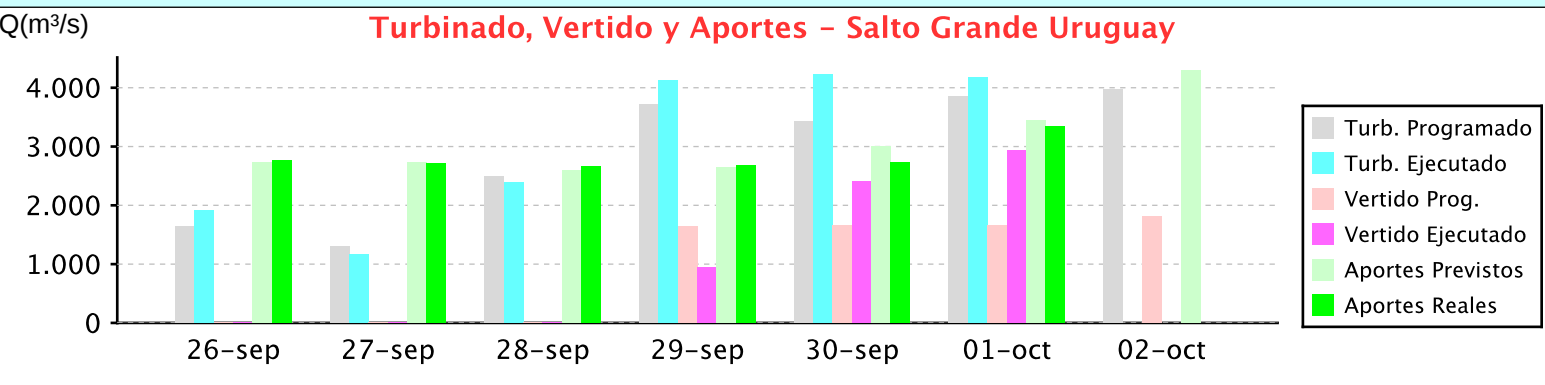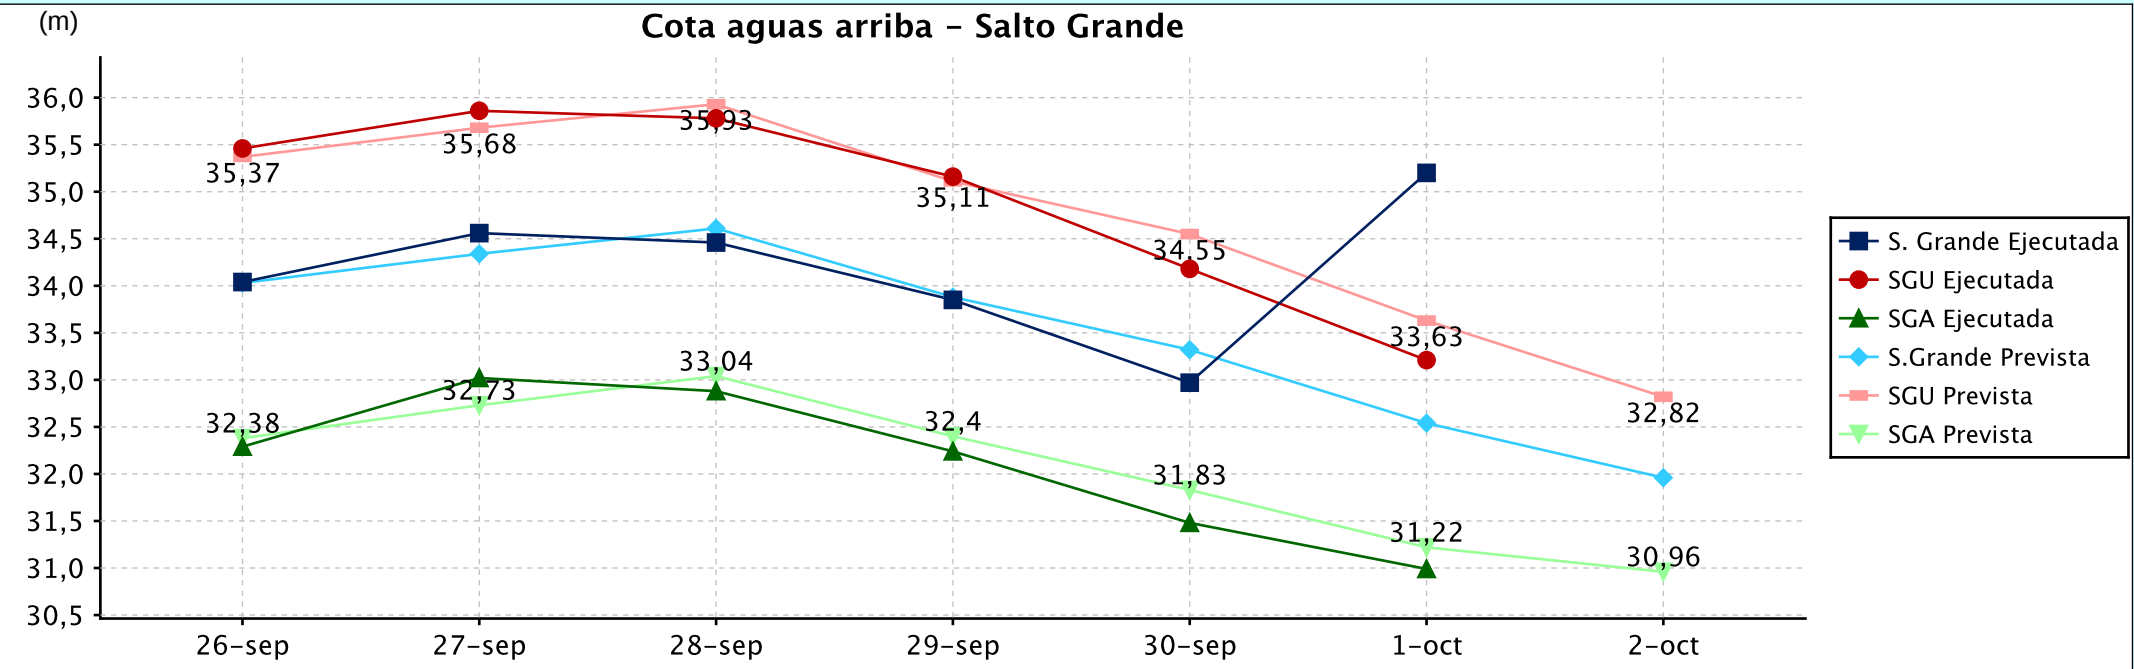

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,21
Cota Vista Arg	30,99
Cota real	35,20
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	34.327

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	508	502
Baygorria	887	895
Palmar	1.245	1.205
SGU	3.856	4.177

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.832	2.427
Baygorria	0	20
Palmar	200	332
SGU	3.450	3.350

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	820	827
Baygorria	500	131
Palmar	100	0
SGU	1.654	2.929

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
