




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 03 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.351
Baygorria	1.983
Palmar	7.844
Salto Grande	17.024
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	12.712
TOTAL Generación	42.857

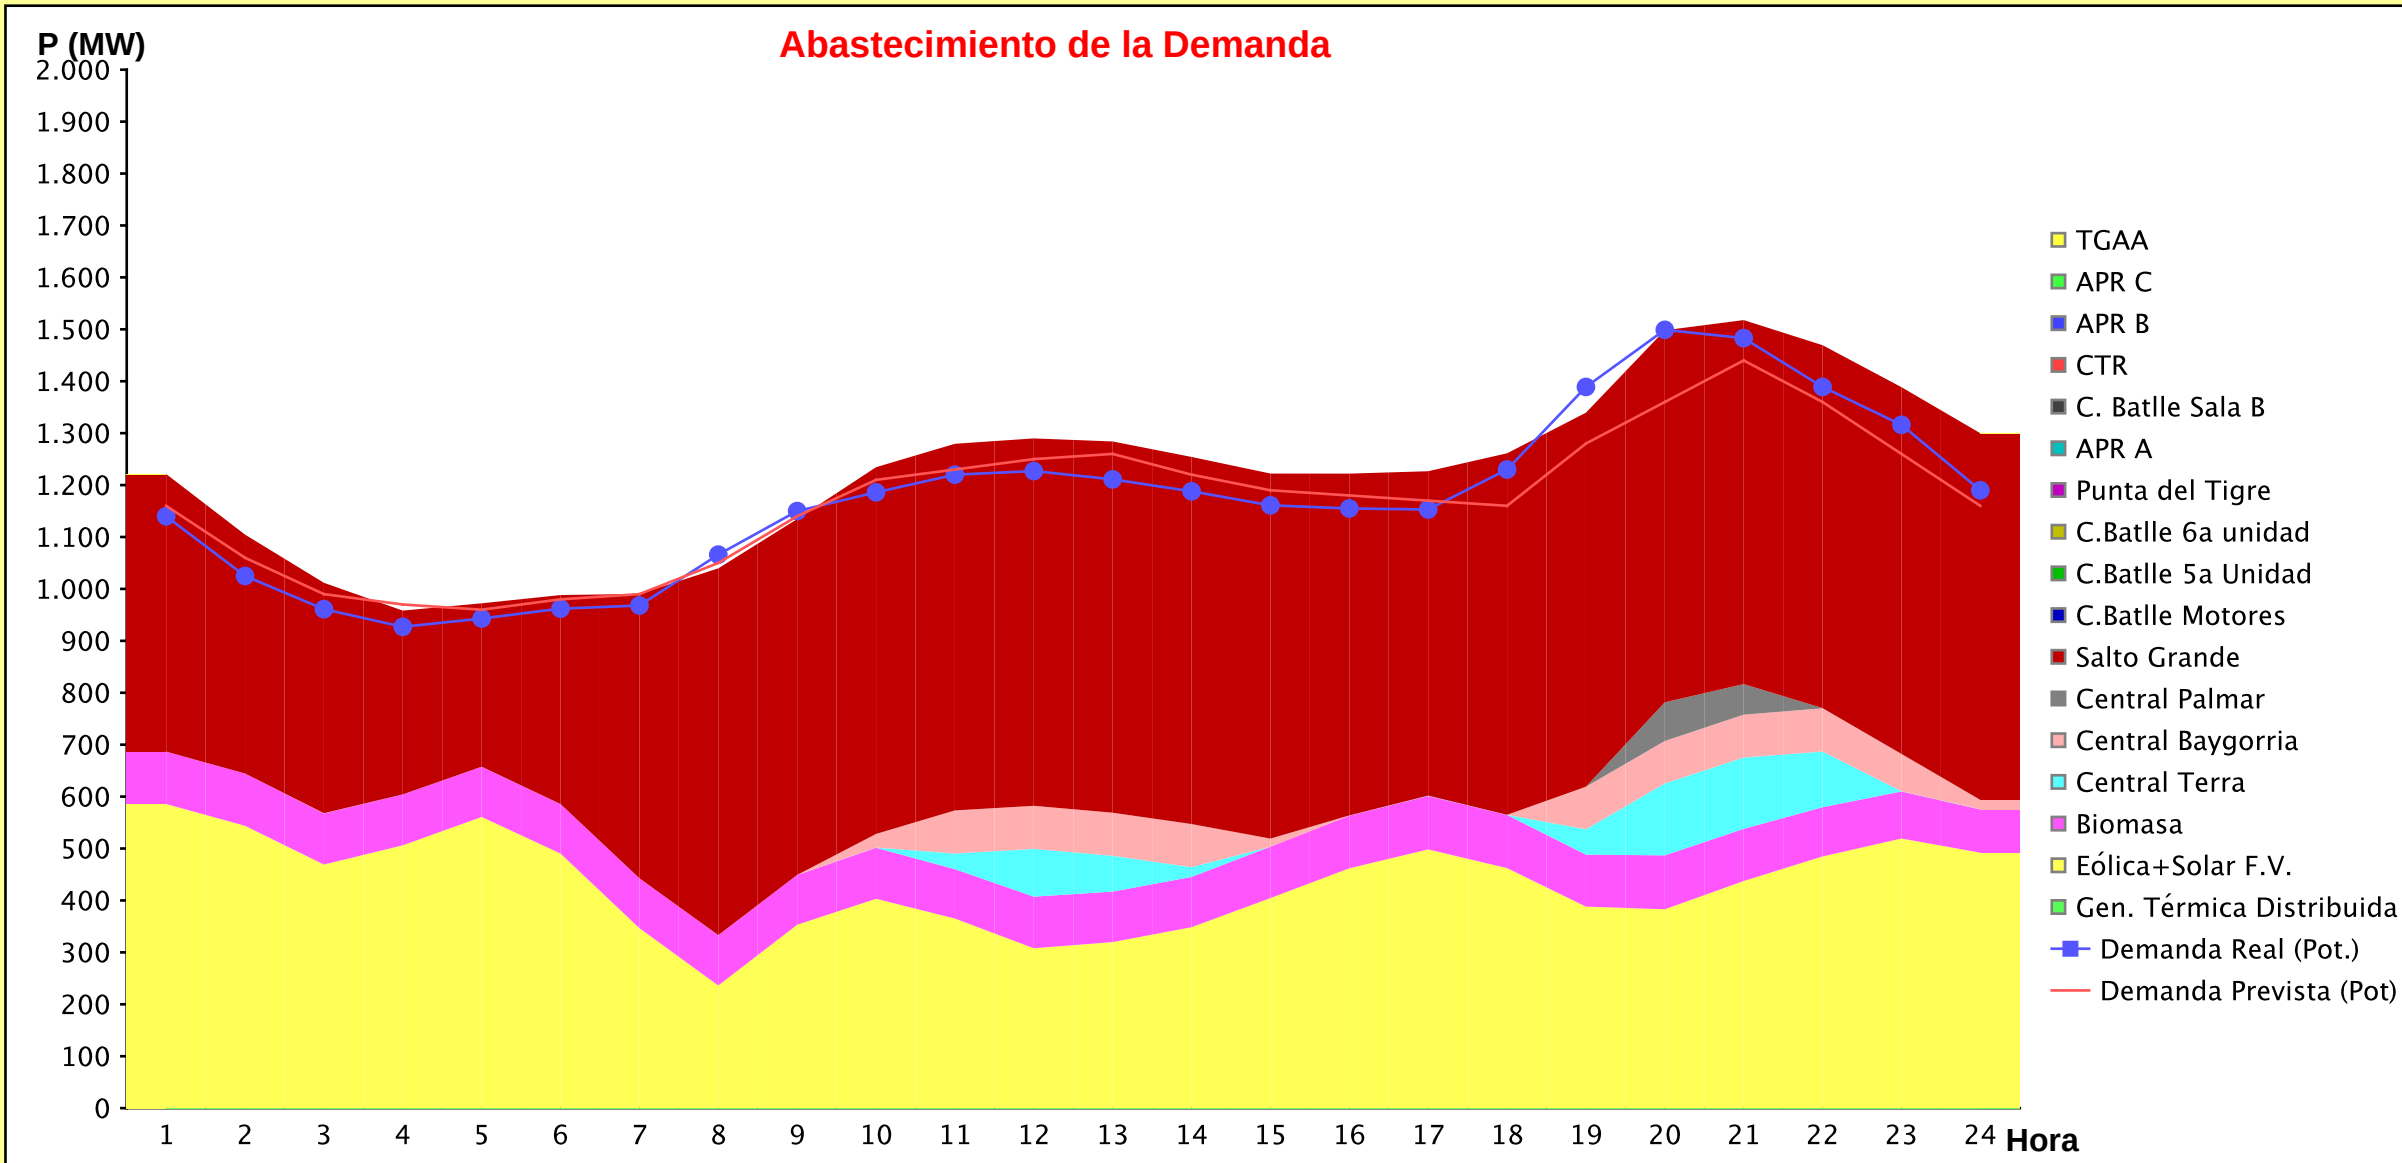

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	13.708
Hidráulica	13.708
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	13.708




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.149
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.030
Diferencia (MWh)	1.119
Ejecutada - Programada	3,99 %

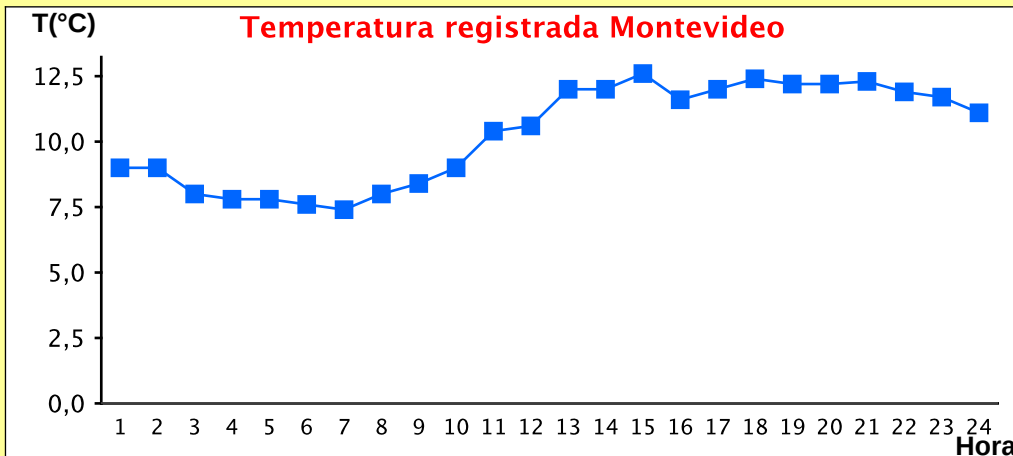



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1309 Hora 11:49
Potencia mínima:	967 Hora 03:51
Pico noche:	1542 Hora 20:37

Generación Media (MW)	
Eólica	414,6
Biomasa	99,0
Solar fotovoltaica	15,8
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

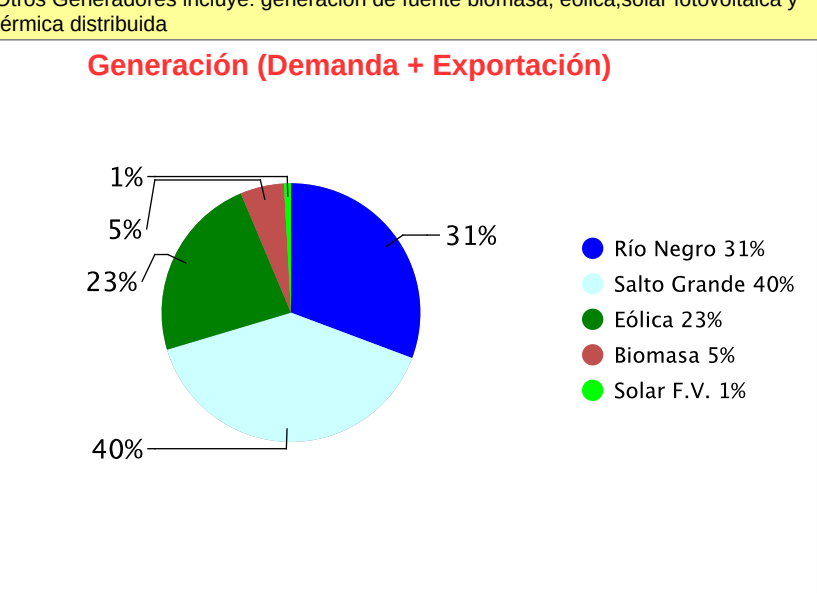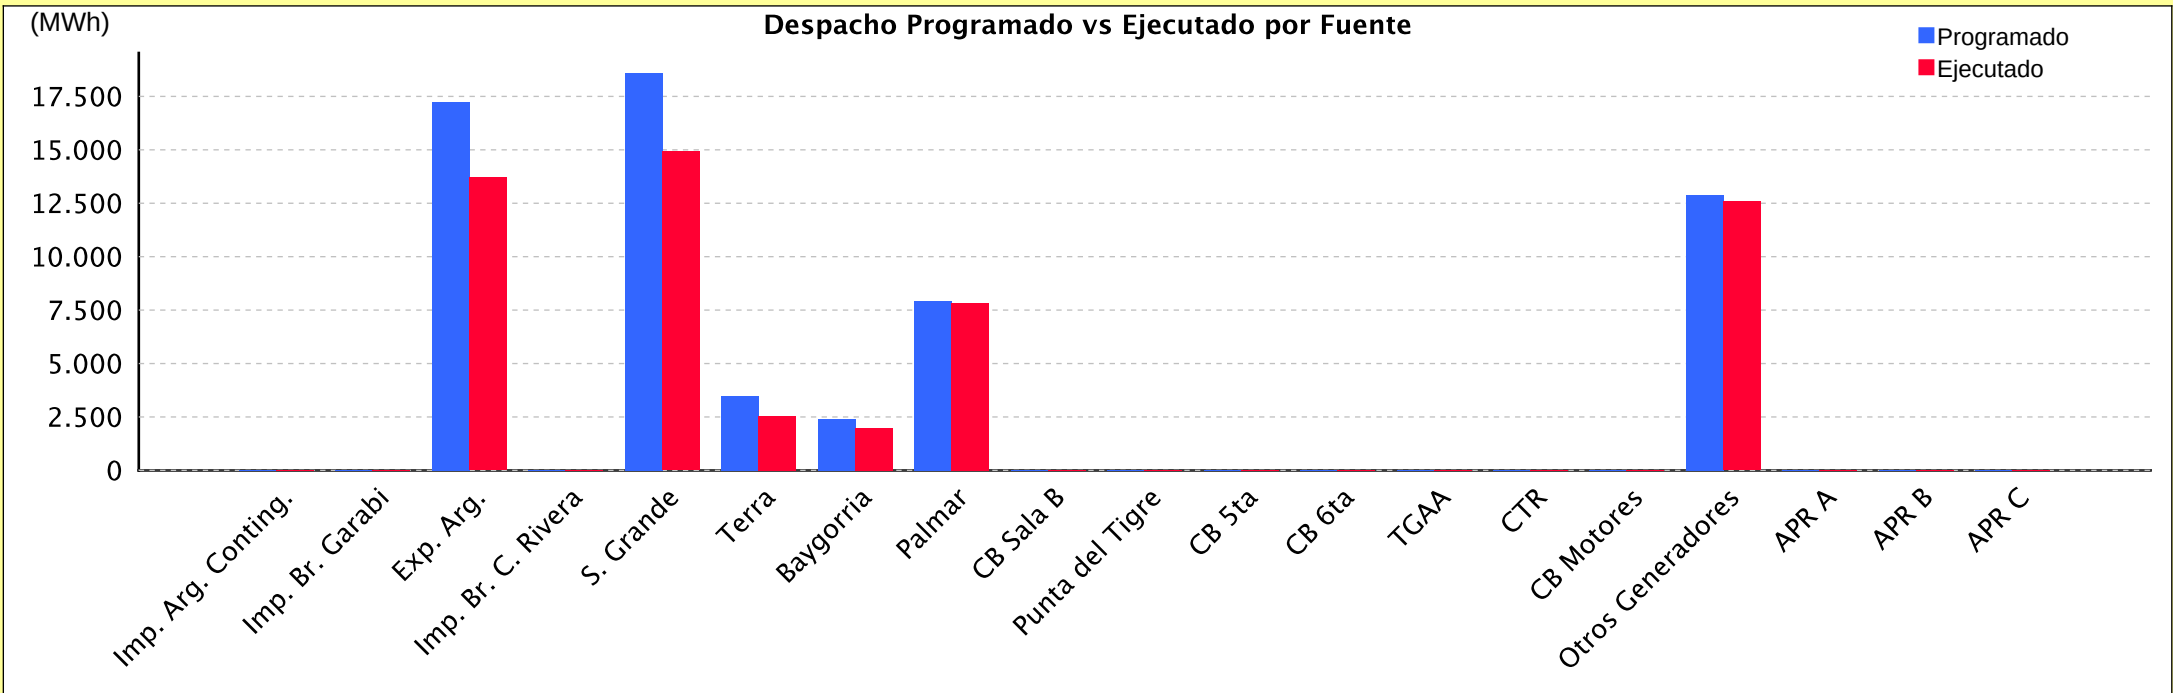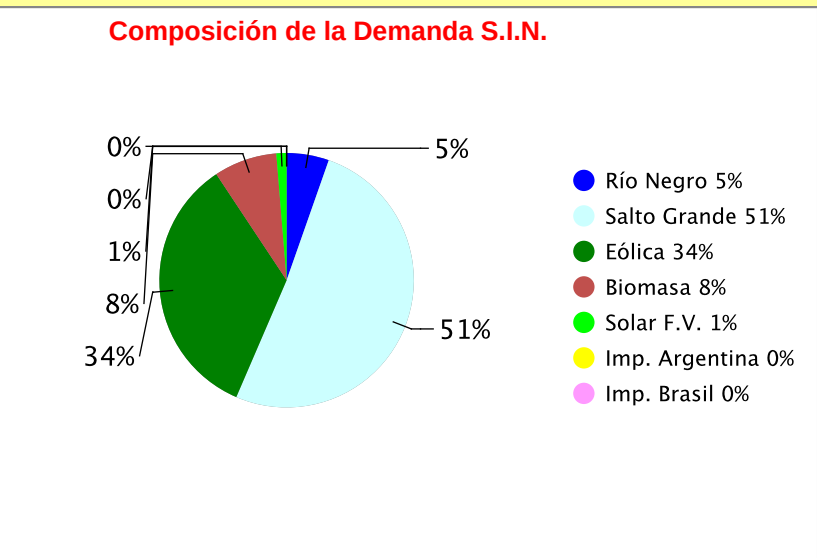



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

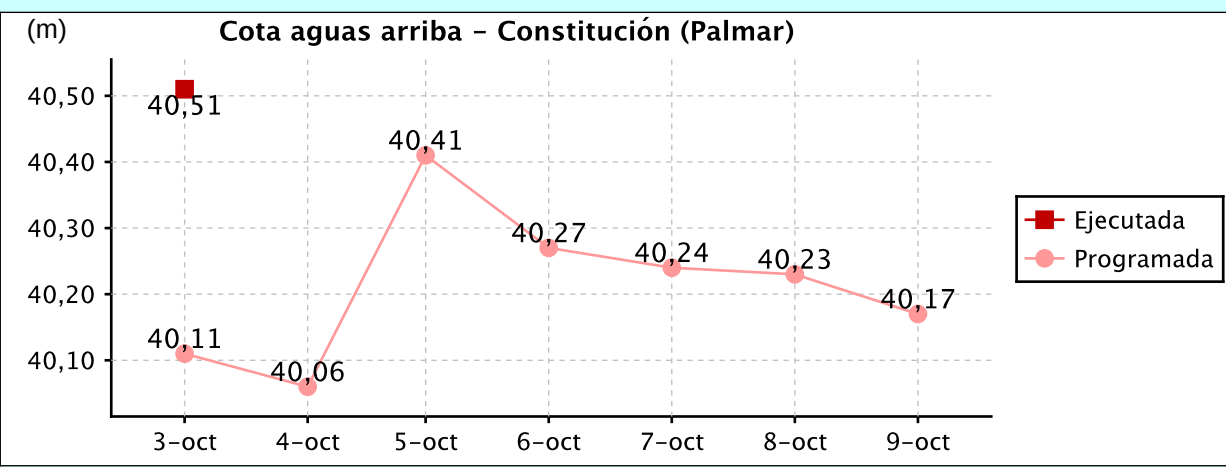
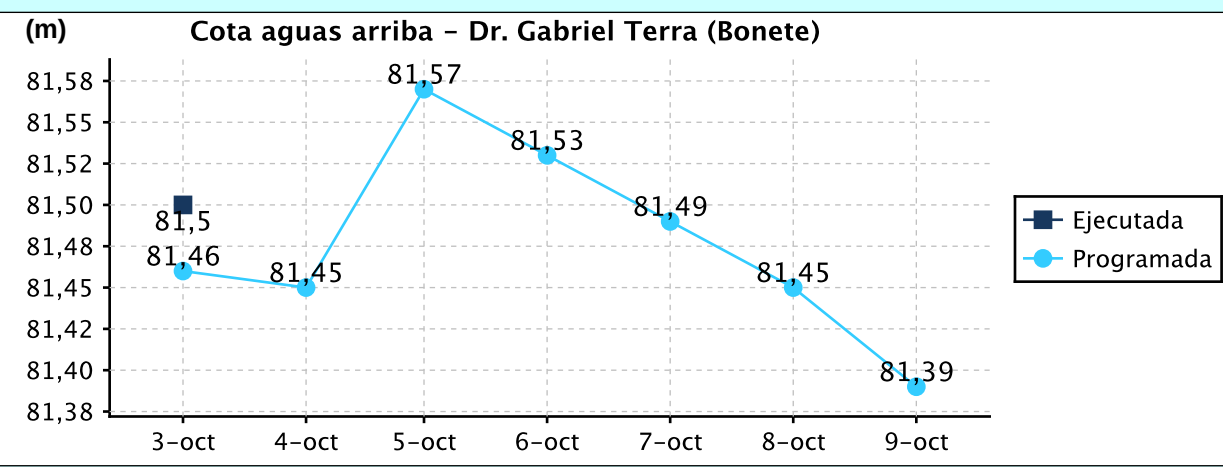


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,46	81,5
Baygorria	54,23	54,05
Palmar	40,11	40,51
SGU	33,07	33,41

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

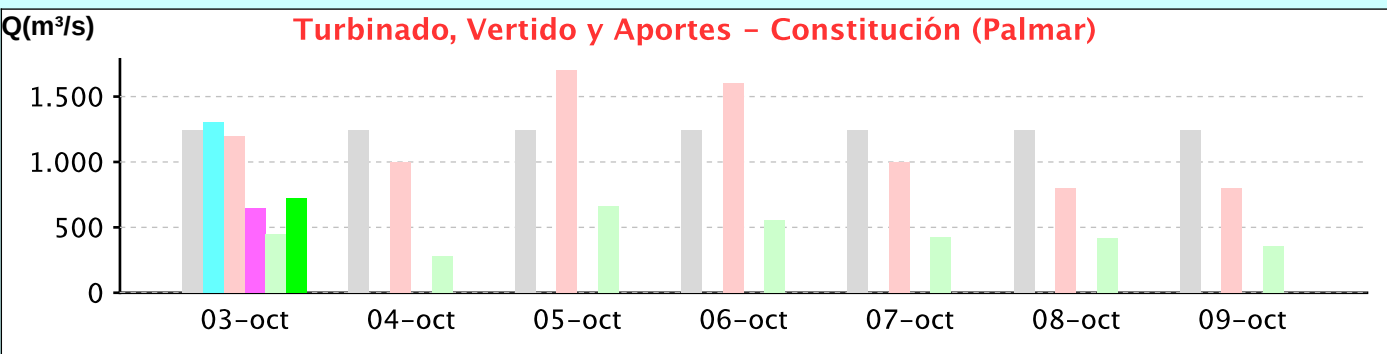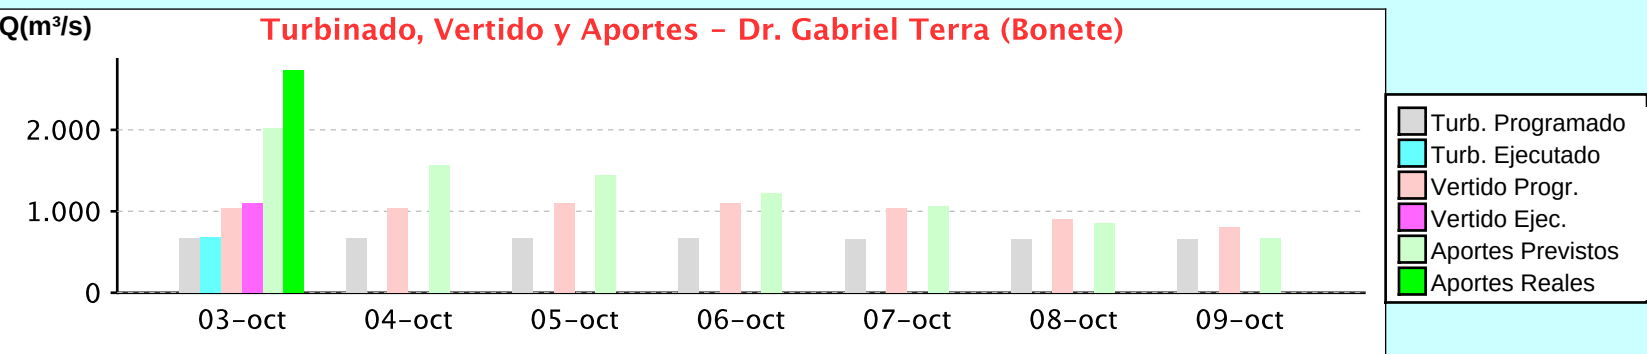

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

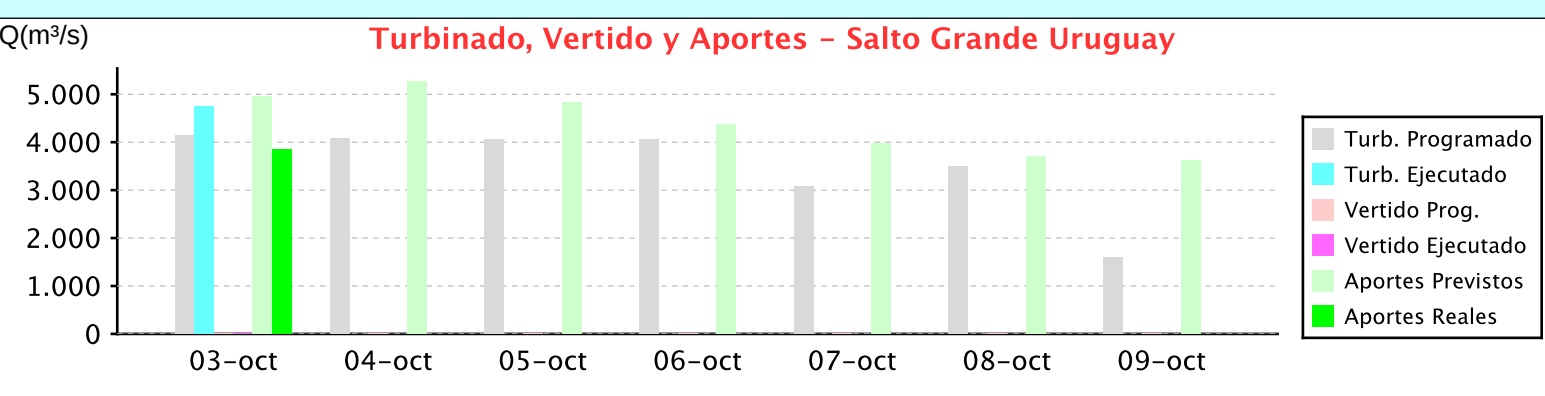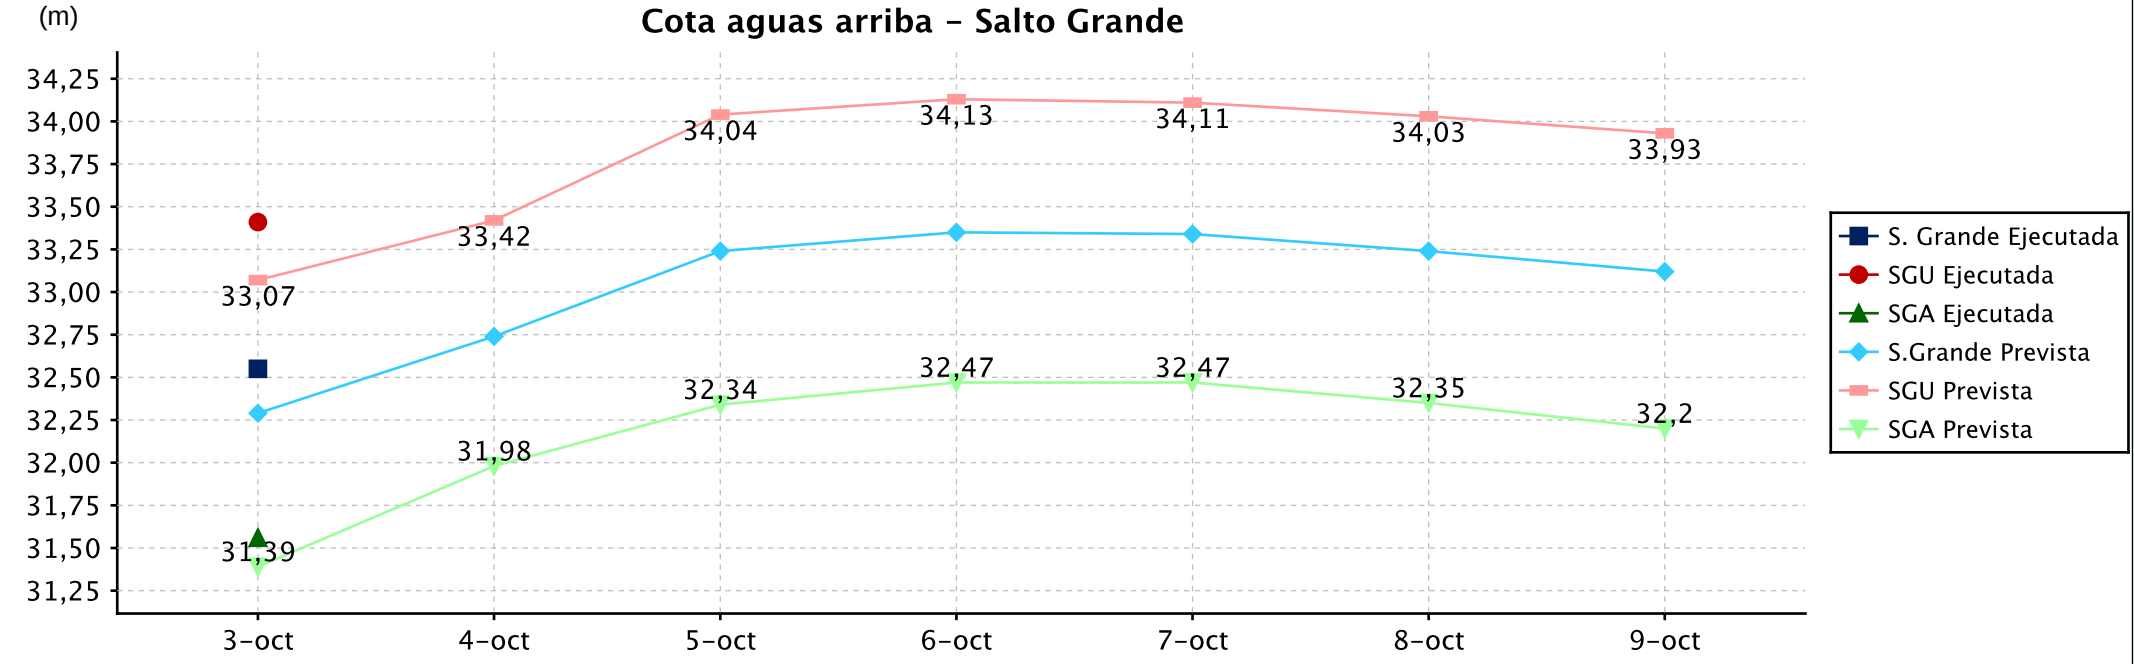

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,41
Cota Vista Arg	31,56
Cota real	32,55

Dif. Energ. (U-A)	30.454
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	677
Baygorria	887	804
Palmar	1.245	1.304
SGU	4.151	4.755

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.016	2.730
Baygorria	100	193
Palmar	451	720
SGU	4.950	3.840

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.040	1.103
Baygorria	1.000	1.380
Palmar	1.200	647
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
