




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 04 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-71
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.362
Baygorria	2.088
Palmar	7.861
Salto Grande	17.088
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	9.486
TOTAL Generación	39.804

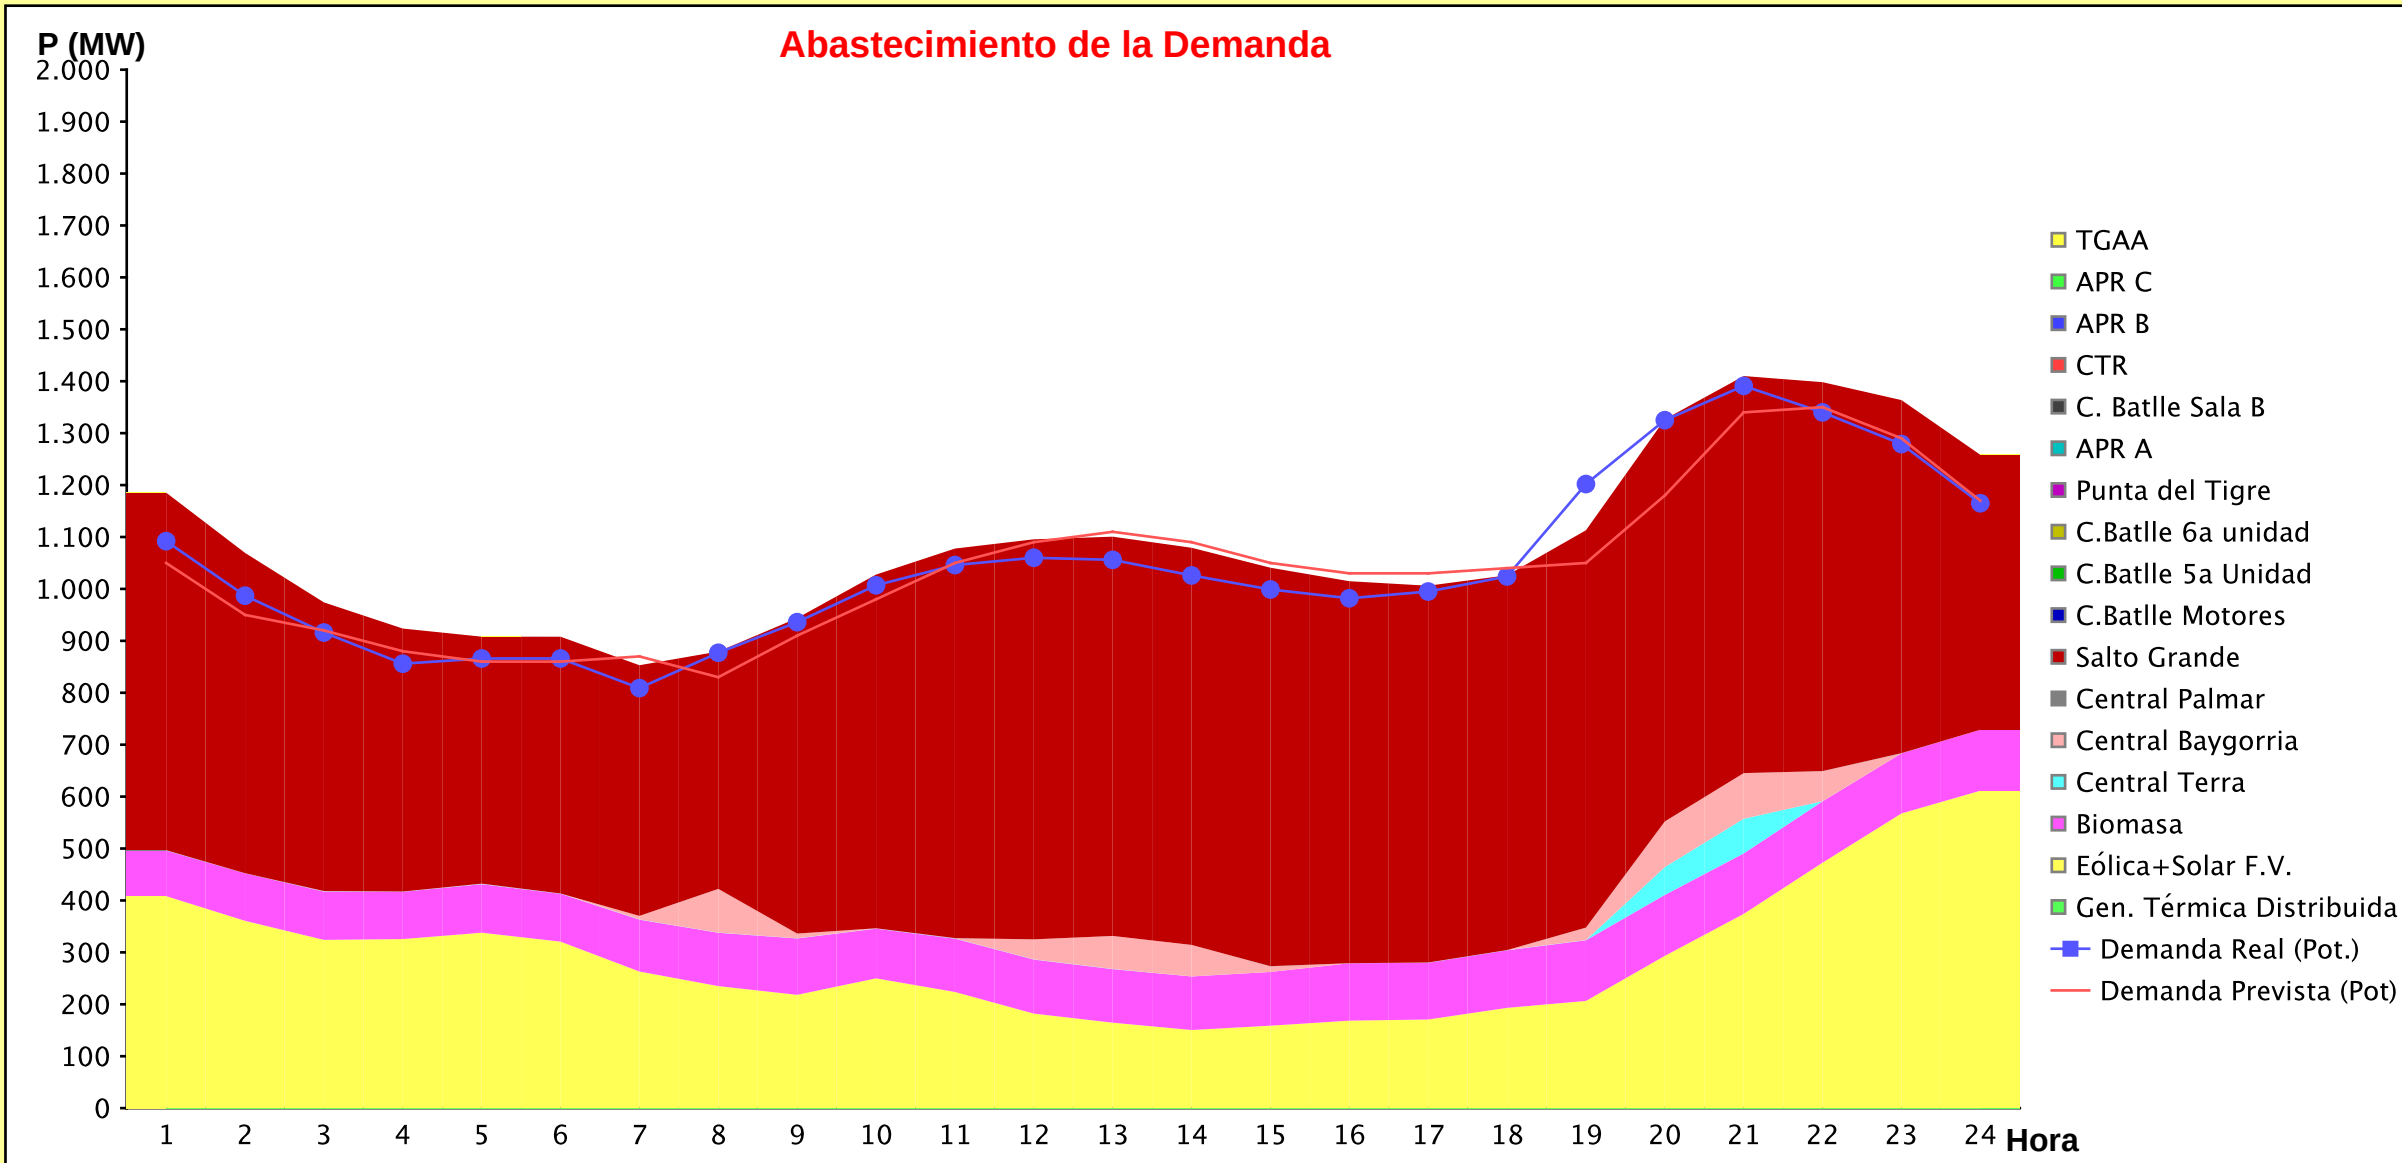

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	13.906
Hidráulica	13.906
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	13.906

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.898
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	24.980
Diferencia (MWh)	918
Ejecutada - Programada	3,68 %

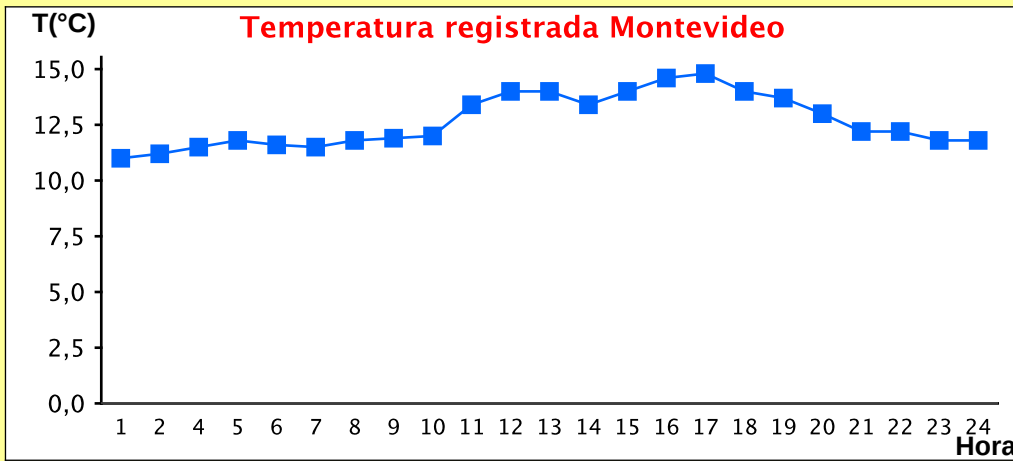

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1113 Hora 12:31
Potencia mínima:	843 Hora 06:46
Pico noche:	1434 Hora 20:52



Generación Media (MW)	
Eólica	281,4
Biomasa	105,7
Solar fotovoltaica	8,8
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

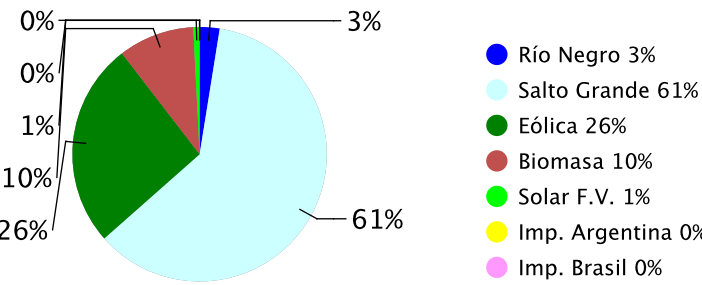



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

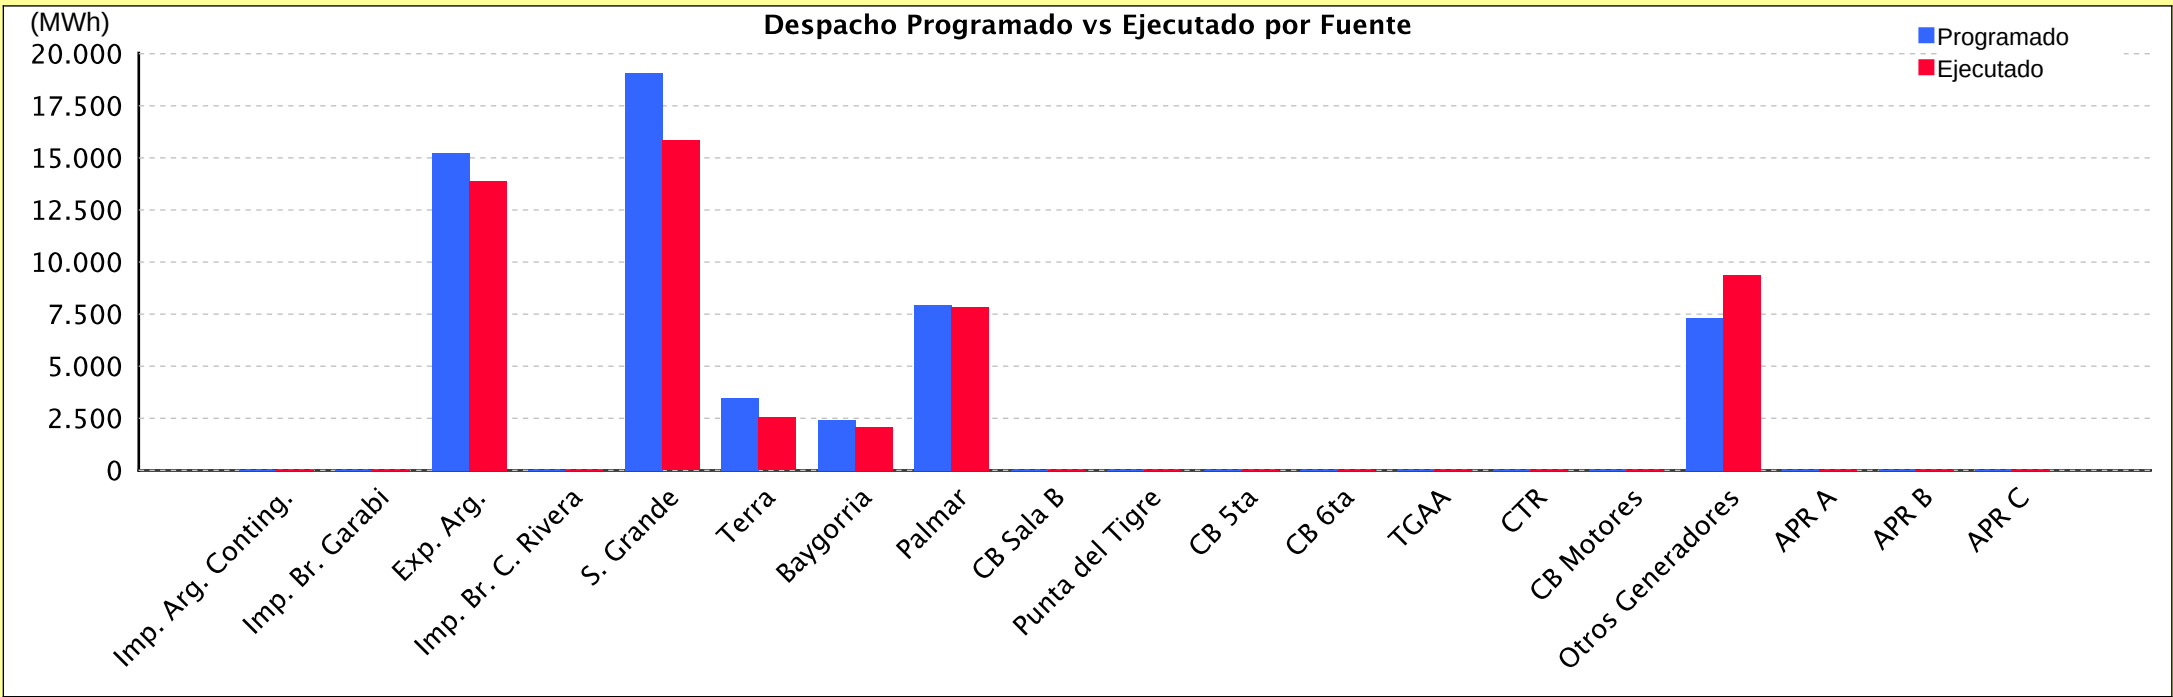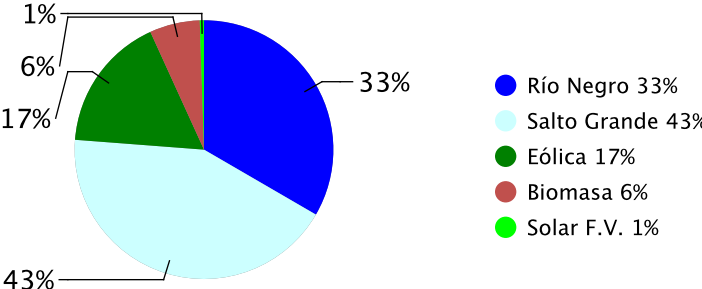



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

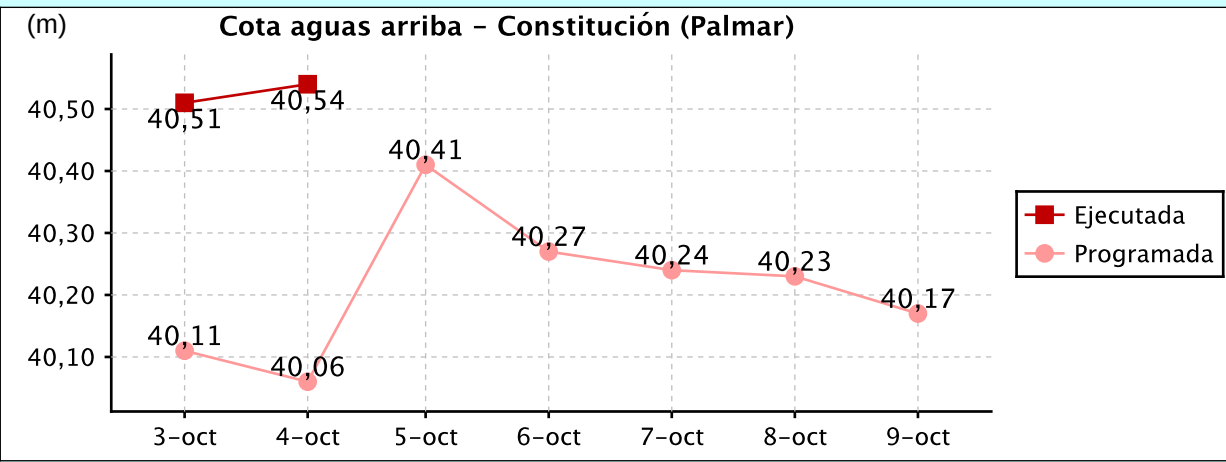
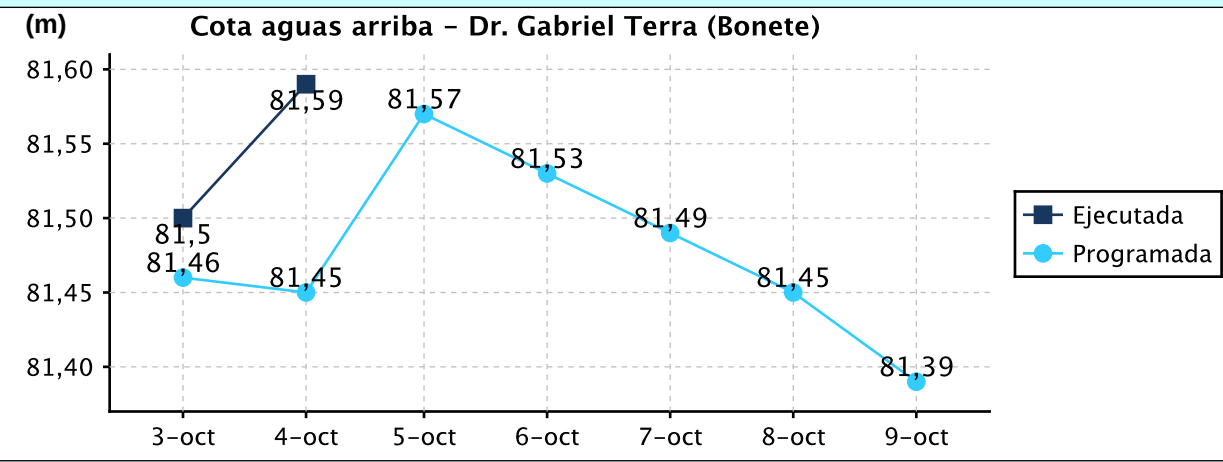


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,45	81,59
Baygorria	54,20	54,22
Palmar	40,06	40,54
SGU	33,42	33,88

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

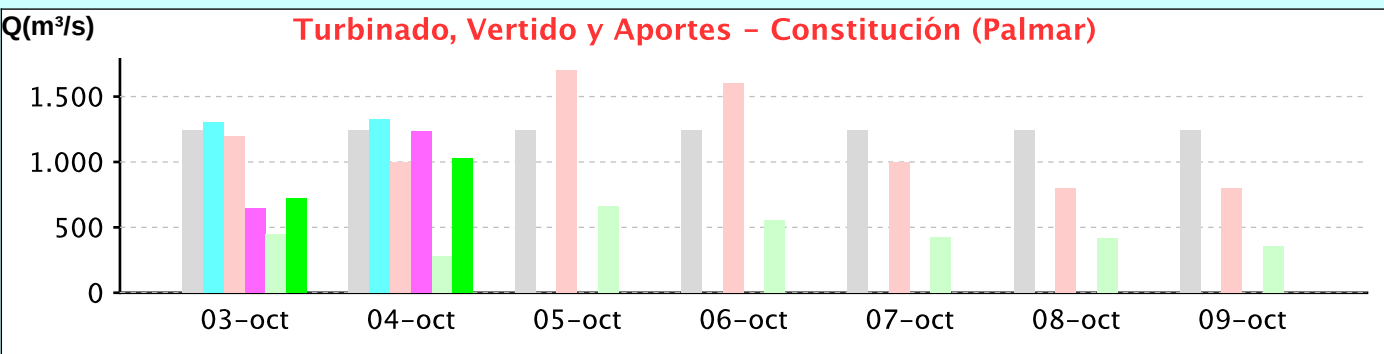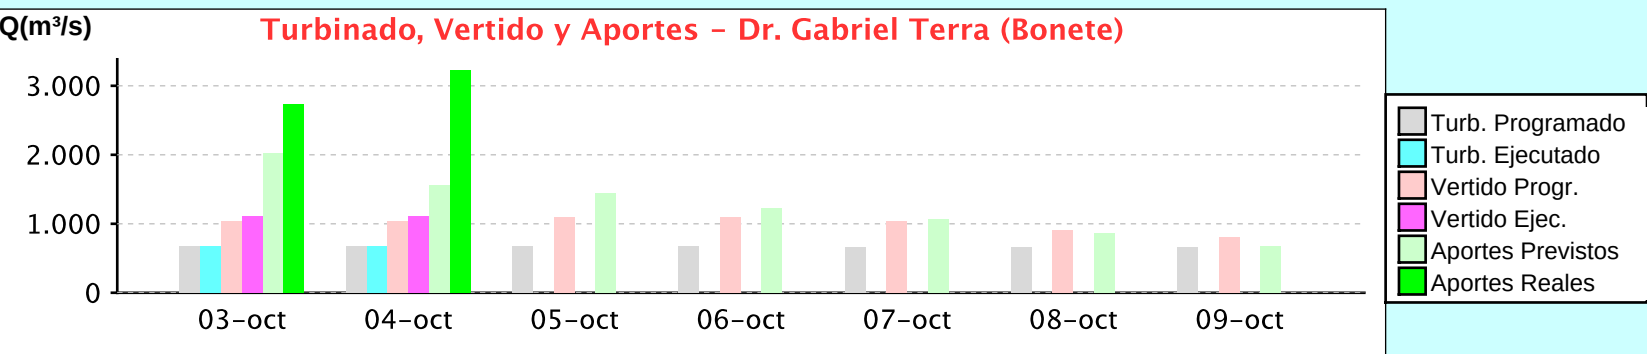

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

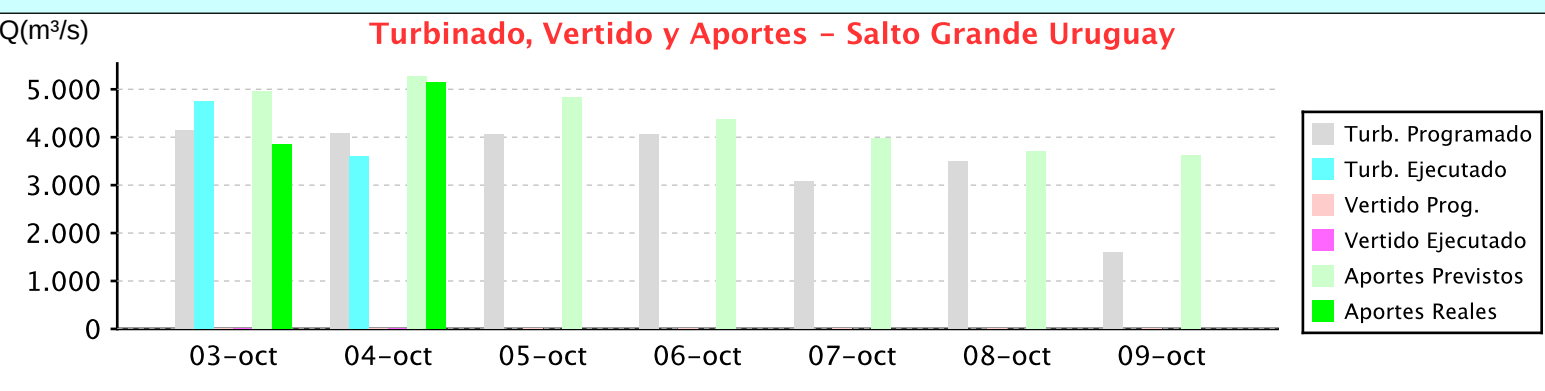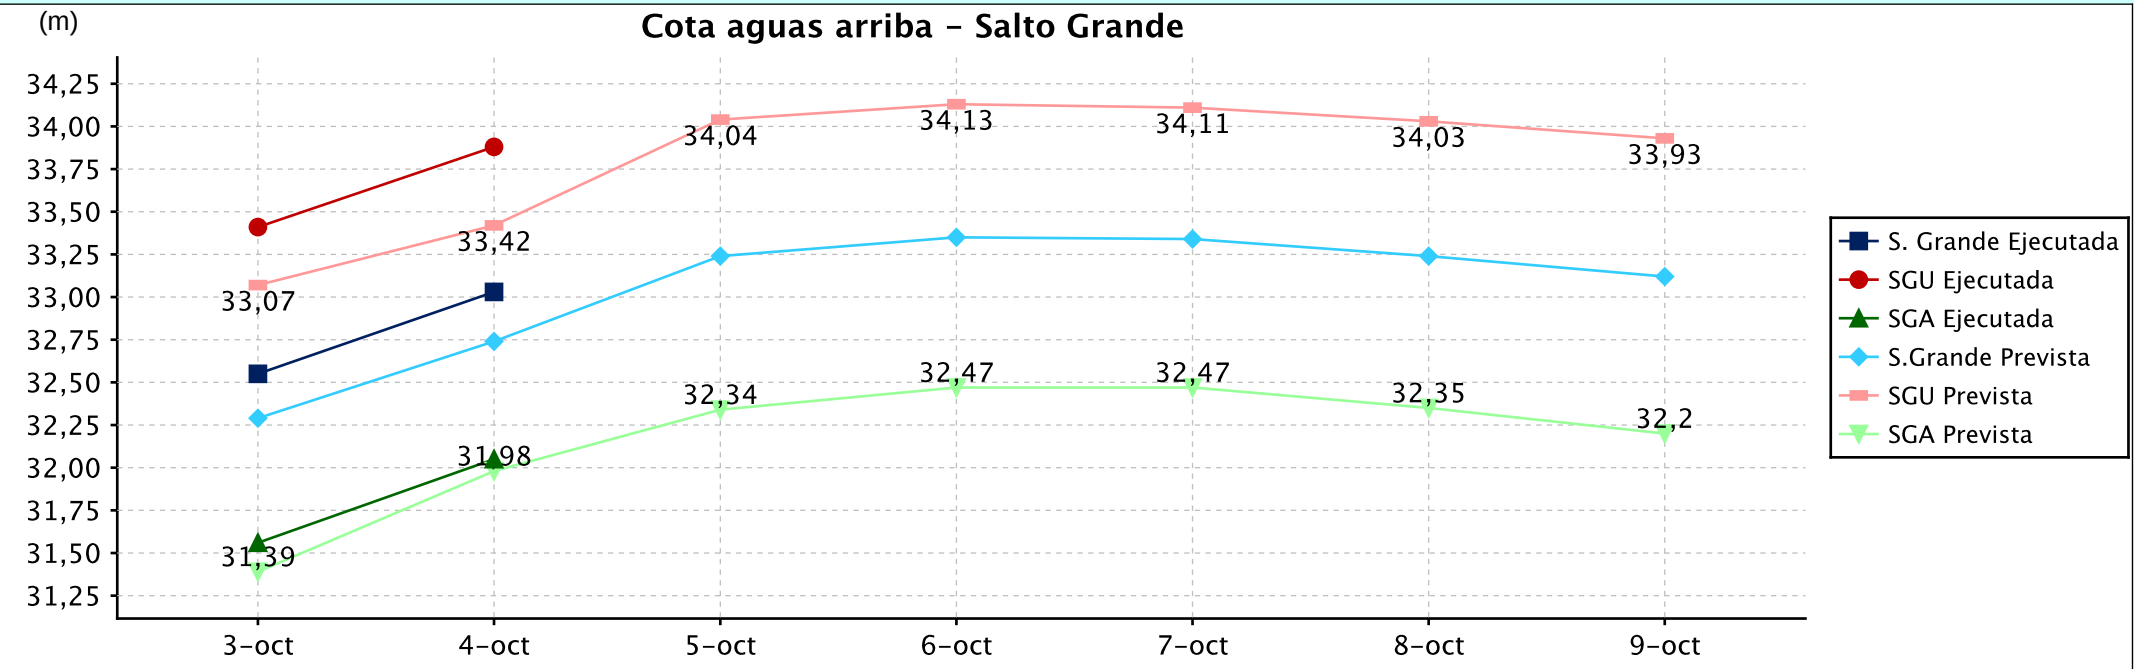

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,88
Cota Vista Arg	32,05
Cota real	33,03
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
32.480	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	669
Baygorria	887	823
Palmar	1.245	1.328
SGU	4.081	3.597

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.561	3.223
Baygorria	60	130
Palmar	282	1.025
SGU	5.275	5.144

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.040	1.108
Baygorria	900	854
Palmar	1.000	1.232
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
