




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 07 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.334
Baygorria	2.116
Palmar	7.879
Salto Grande	19.486
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	14.422
TOTAL Generación	47.145

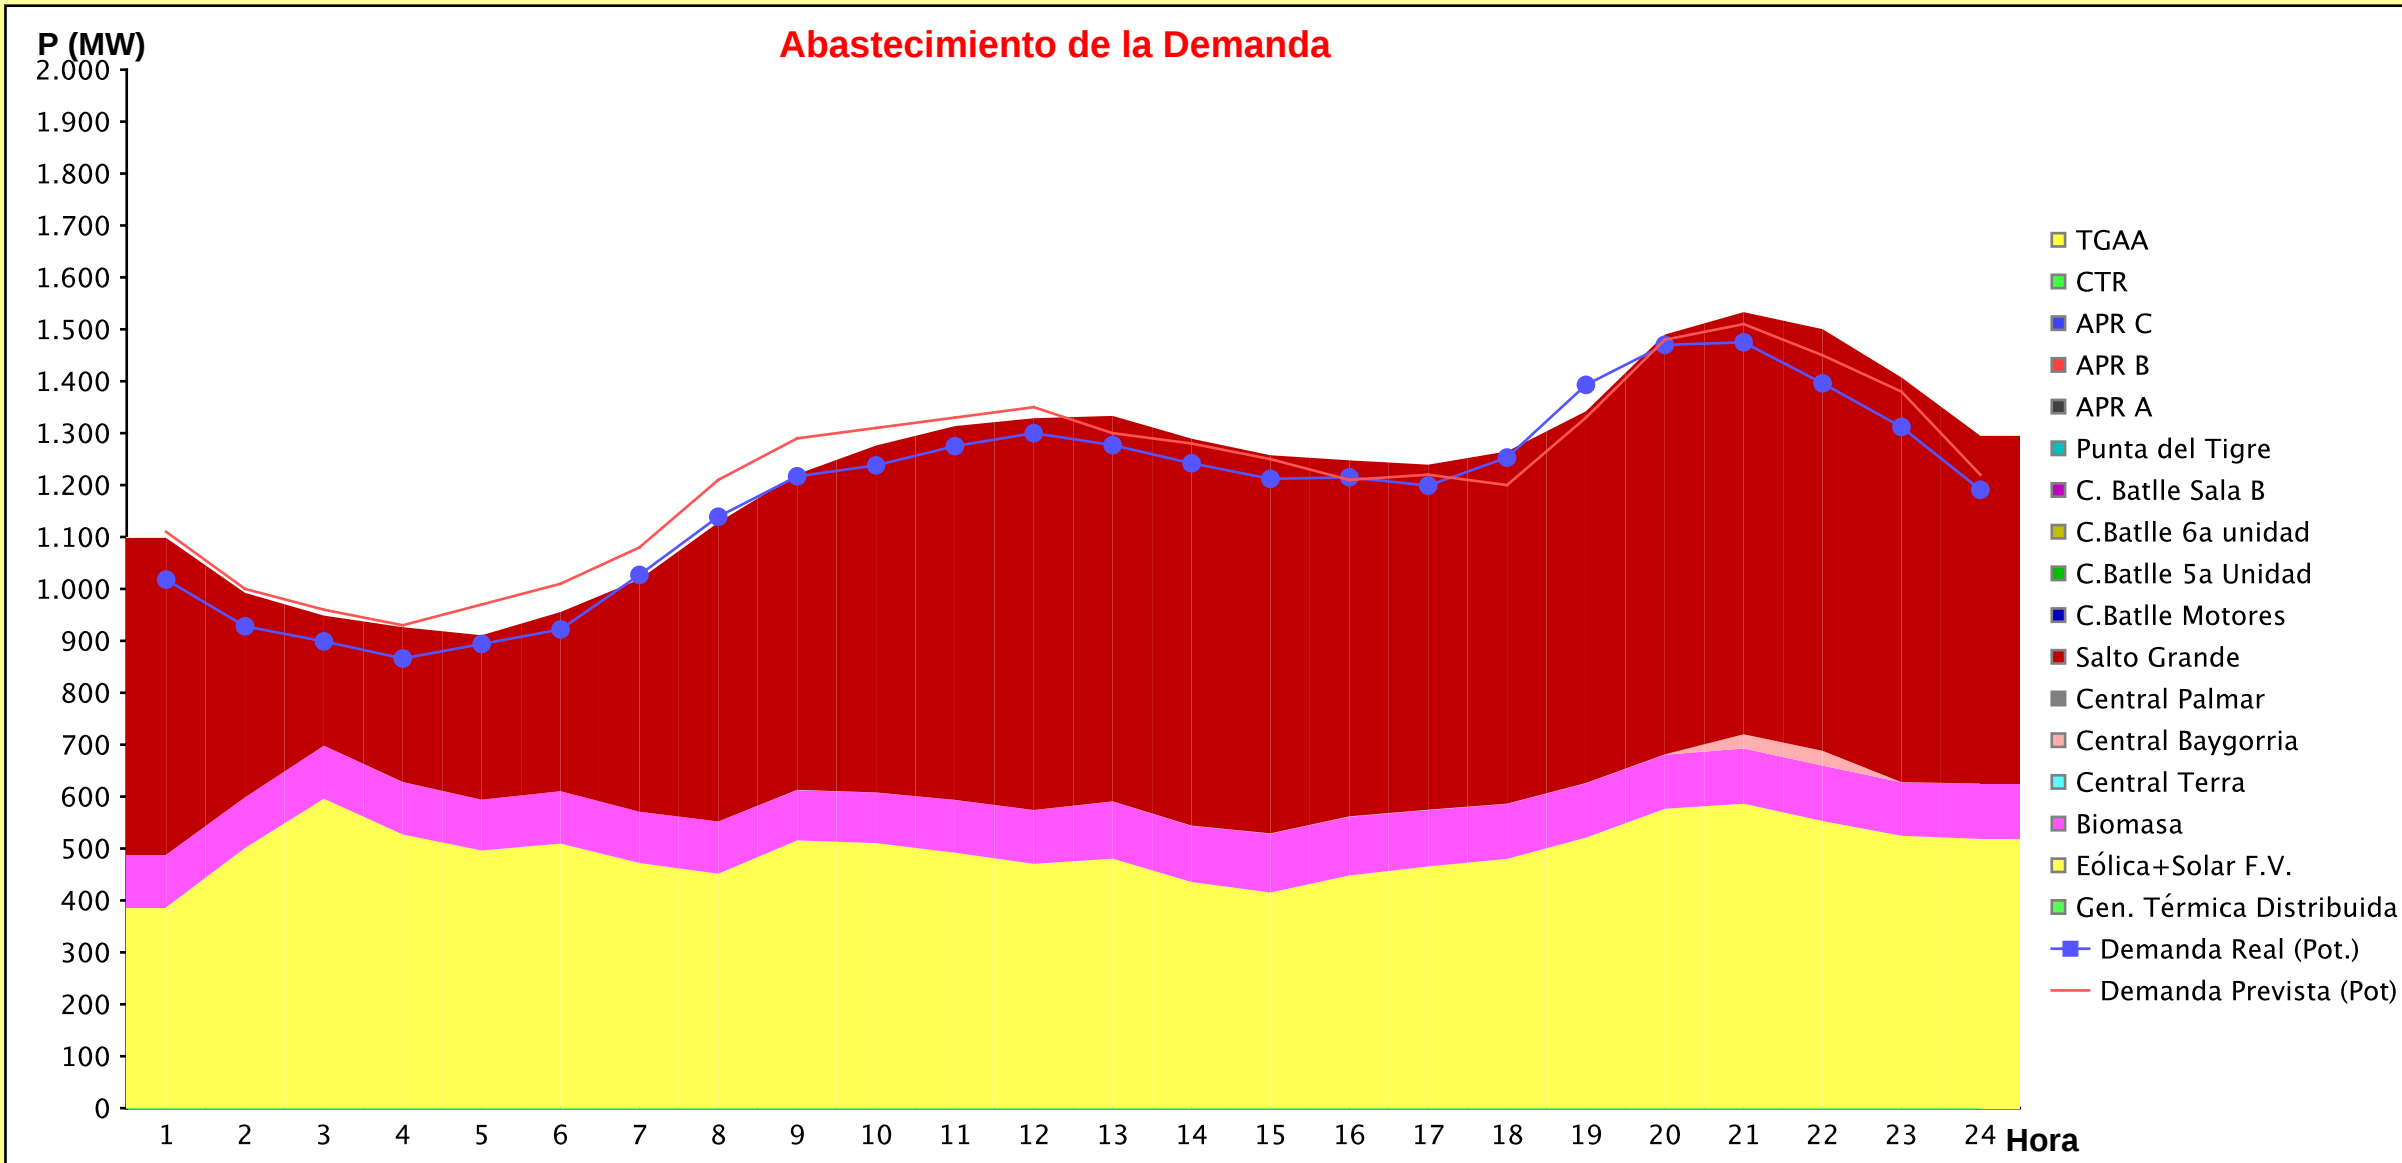

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	17.933
Hidráulica	17.933
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	17.933




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.212
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.380
Diferencia (MWh)	-168
Ejecutada - Programada	-0,57 %

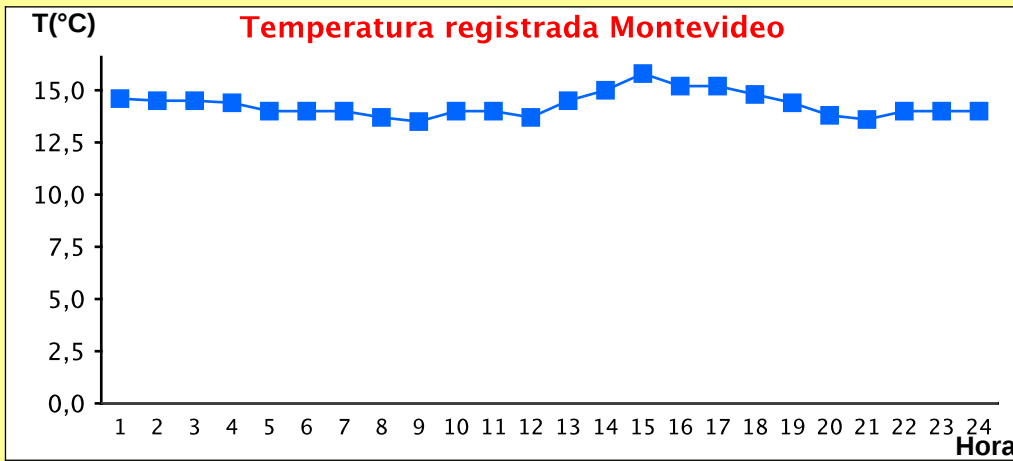



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1353 Hora 11:39
Potencia mínima:	907 Hora 04:10
Pico noche:	1552 Hora 20:45

Generación Media (MW)	
Eólica	494,2
Biomasa	104,4
Solar fotovoltaica	1,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

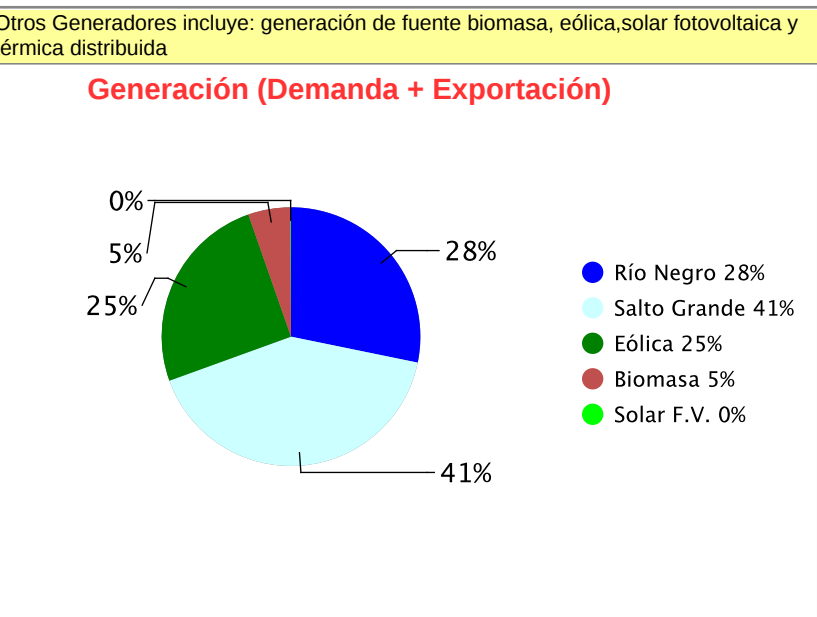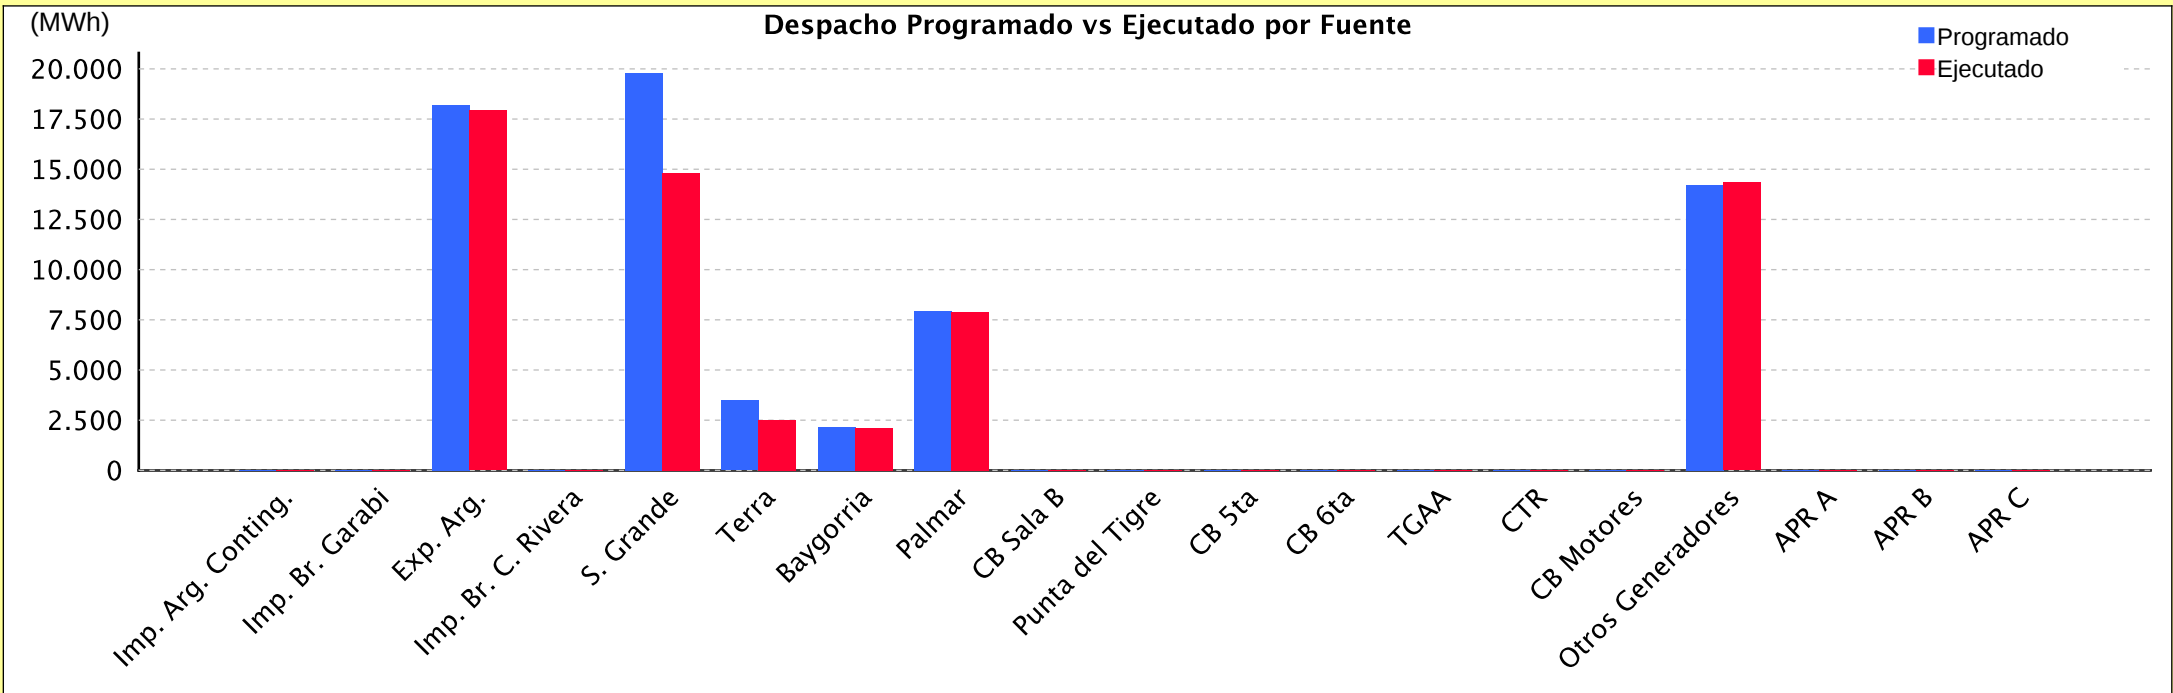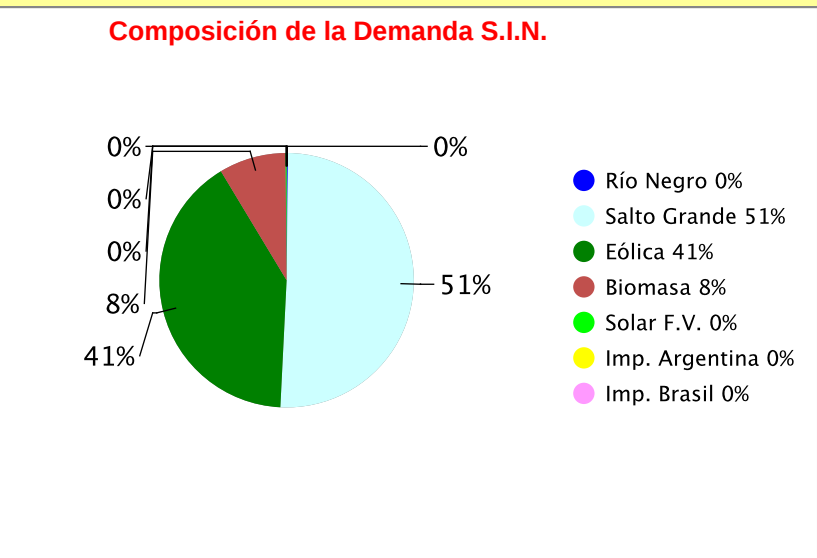



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

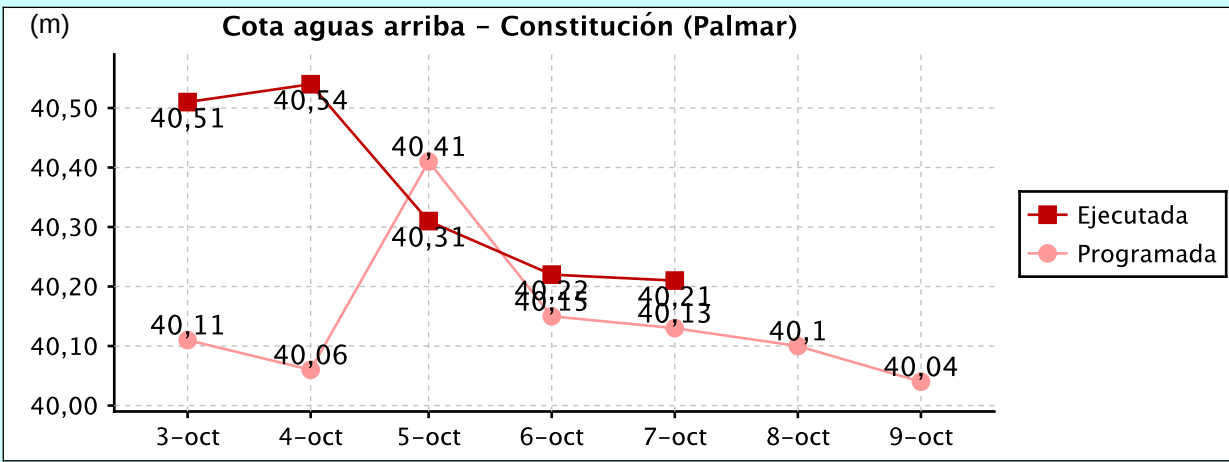
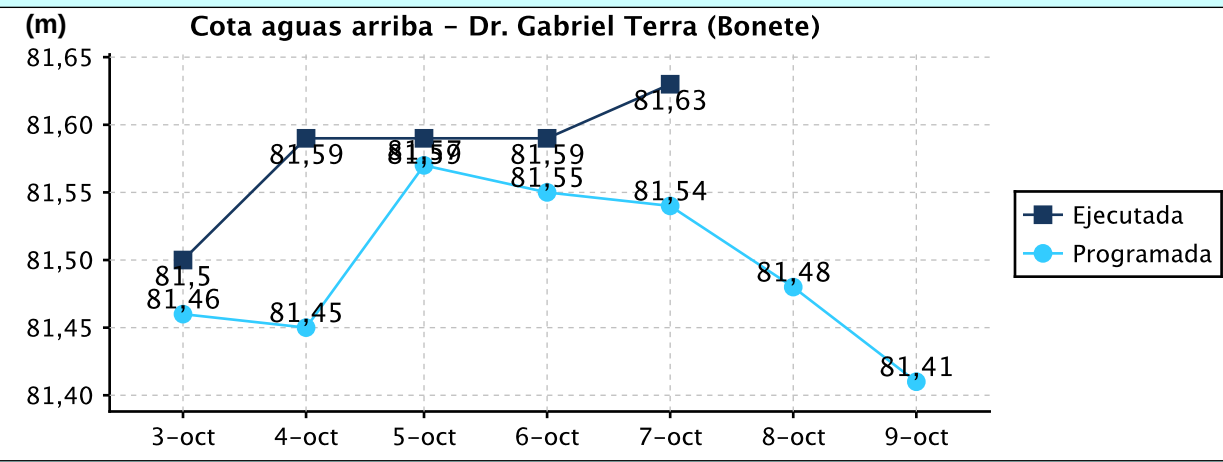


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,54	81,63
Baygorria	54,14	54,17
Palmar	40,13	40,21
SGU	34,28	34,16

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

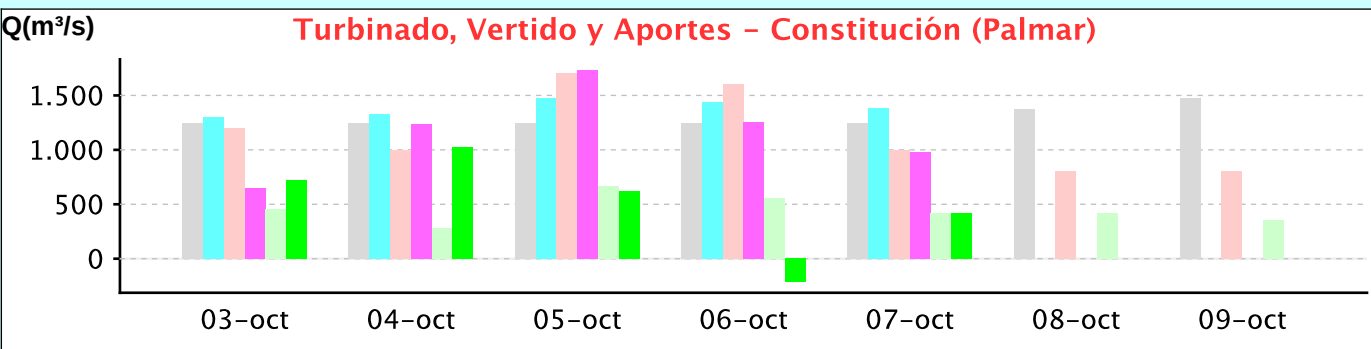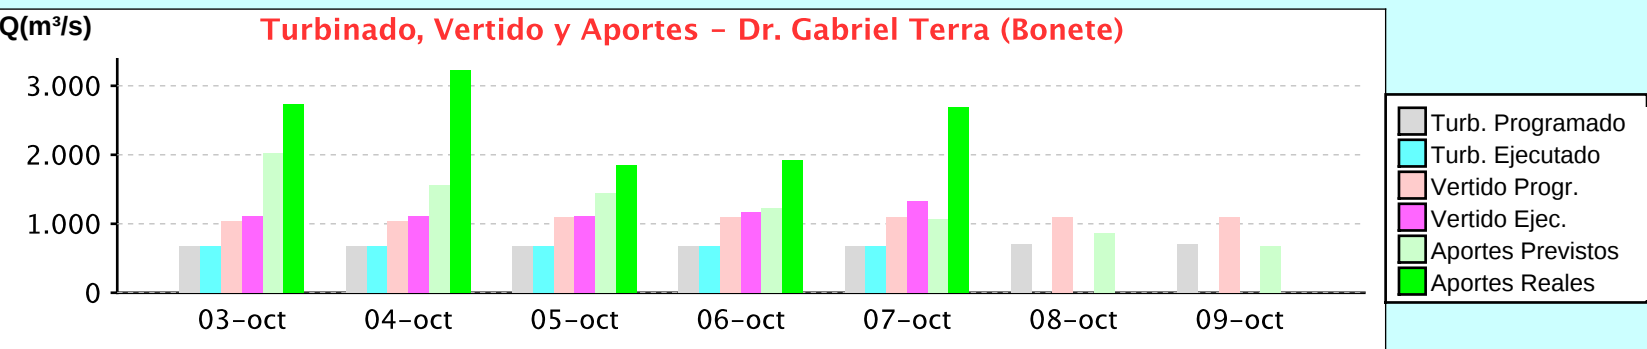

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

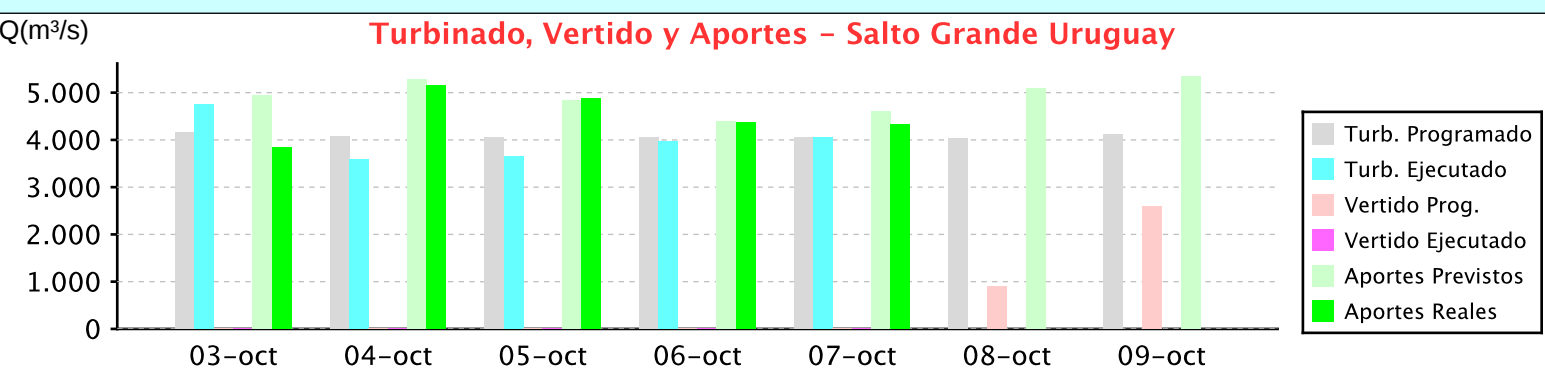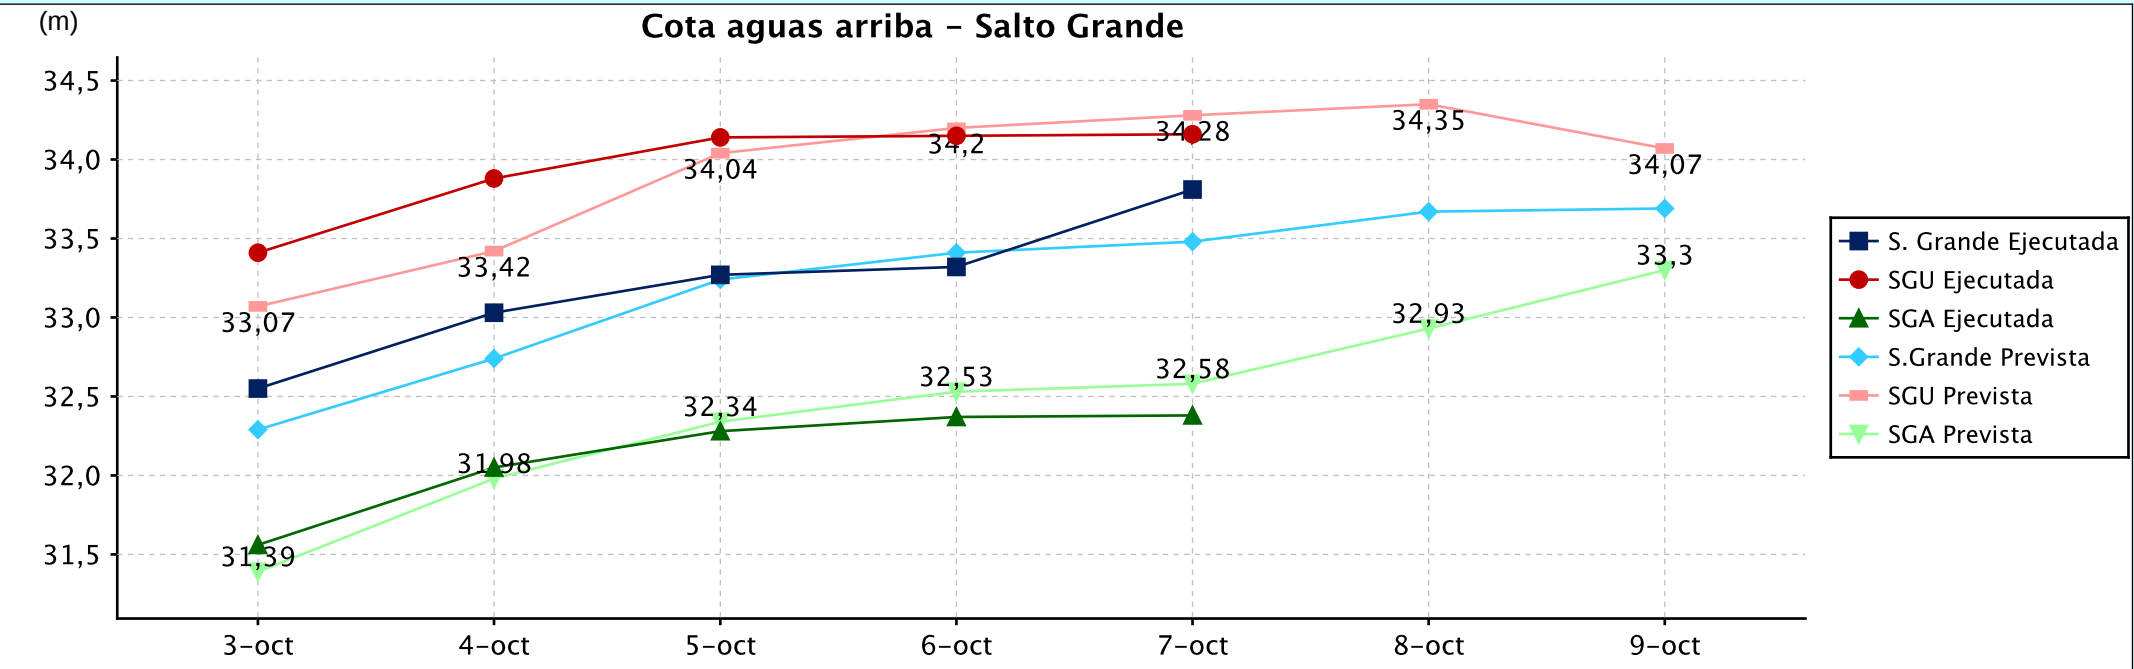

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,16
Cota Vista Arg	32,38
Cota real	33,81

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	33.146
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	669	674
Baygorria	799	829
Palmar	1.245	1.384
SGU	4.060	4.059

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.059	2.686
Baygorria	0	33
Palmar	422	416
SGU	4.600	4.320

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.330
Baygorria	850	1.106
Palmar	1.000	976
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
