




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 08 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.320
Baygorria	2.140
Palmar	7.881
Salto Grande	19.520
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	18.327
TOTAL Generación	51.098

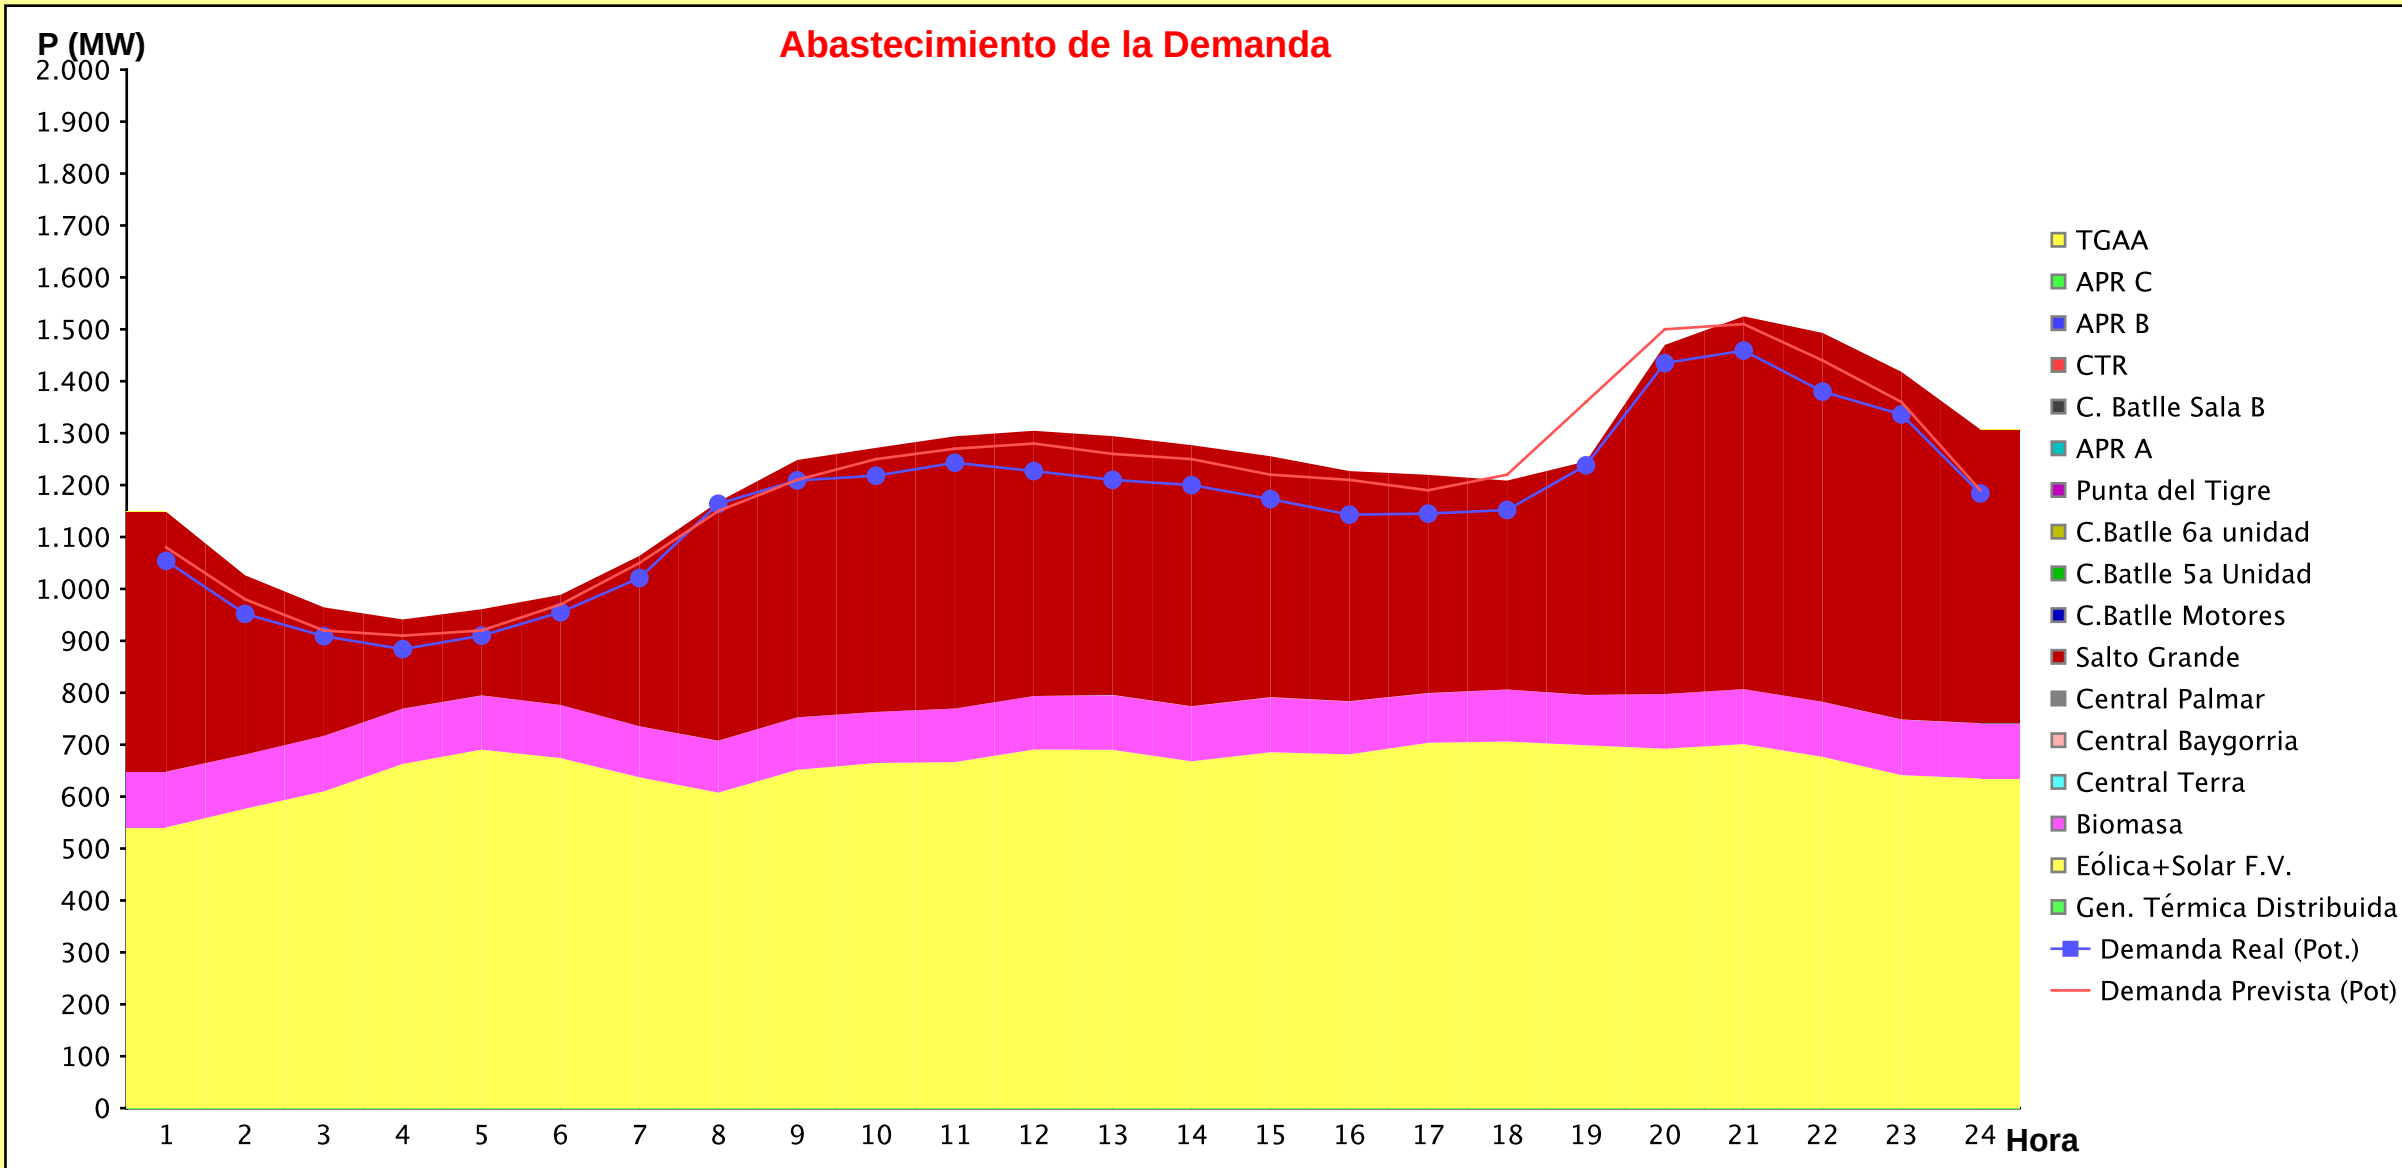

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	21.880
Hidráulica	21.880
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	21.880




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.218
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.700
Diferencia (MWh)	518
Ejecutada - Programada	1,81 %

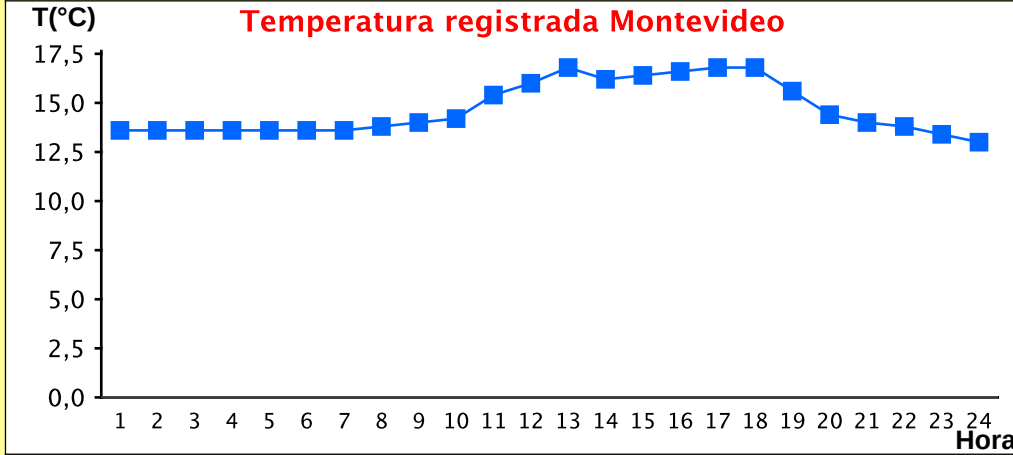



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1329 Hora 11:30
Potencia mínima:	939 Hora 03:42
Pico noche:	1541 Hora 20:43

Generación Media (MW)	
Eólica	654,2
Biomasa	103,1
Solar fotovoltaica	4,3
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

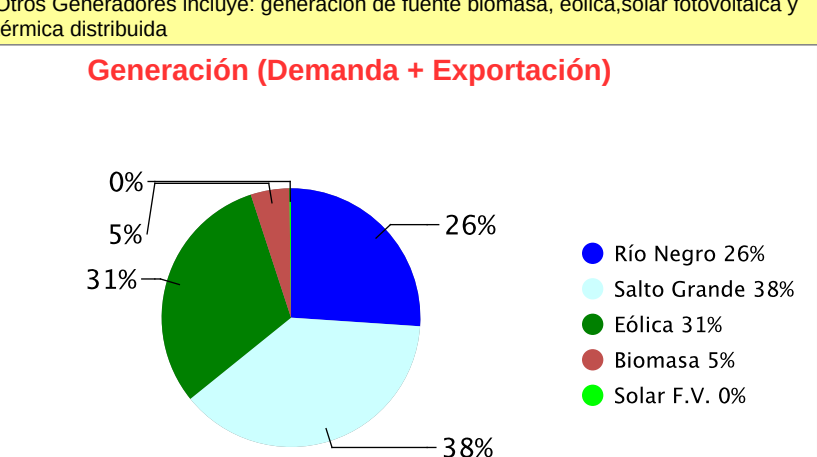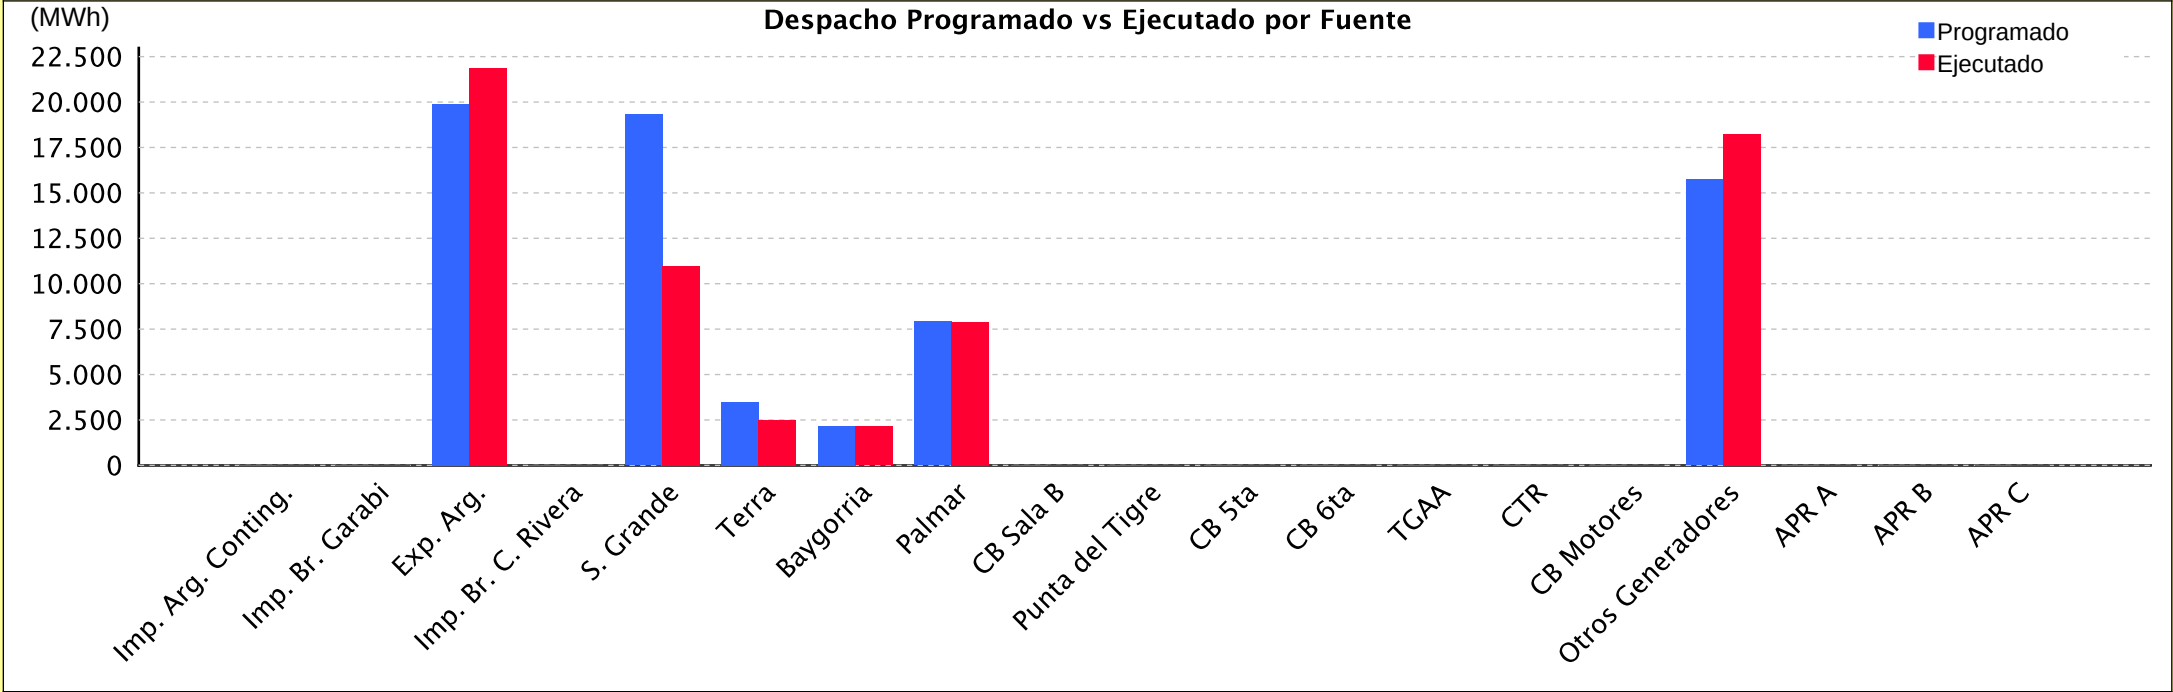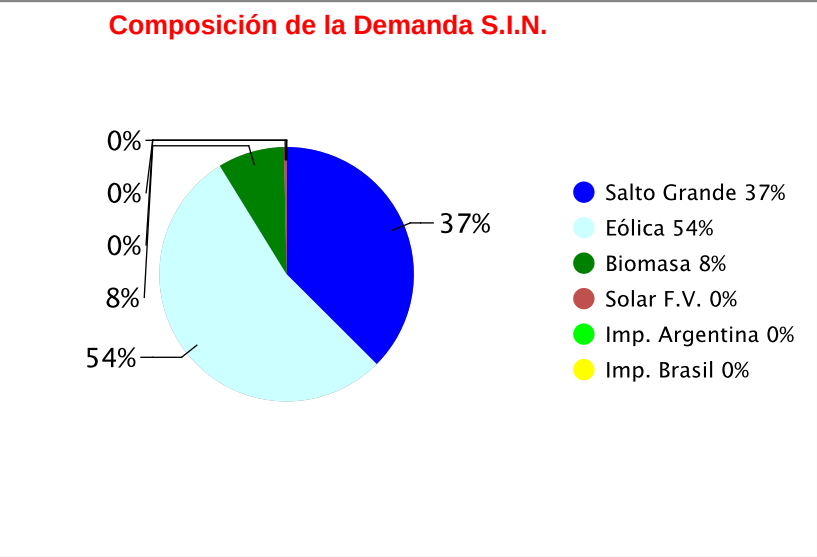



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

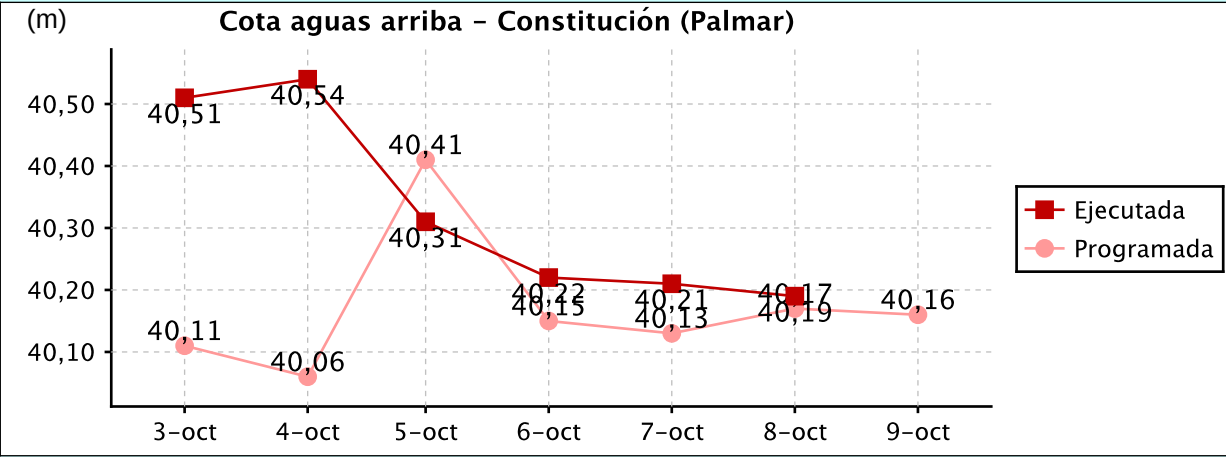
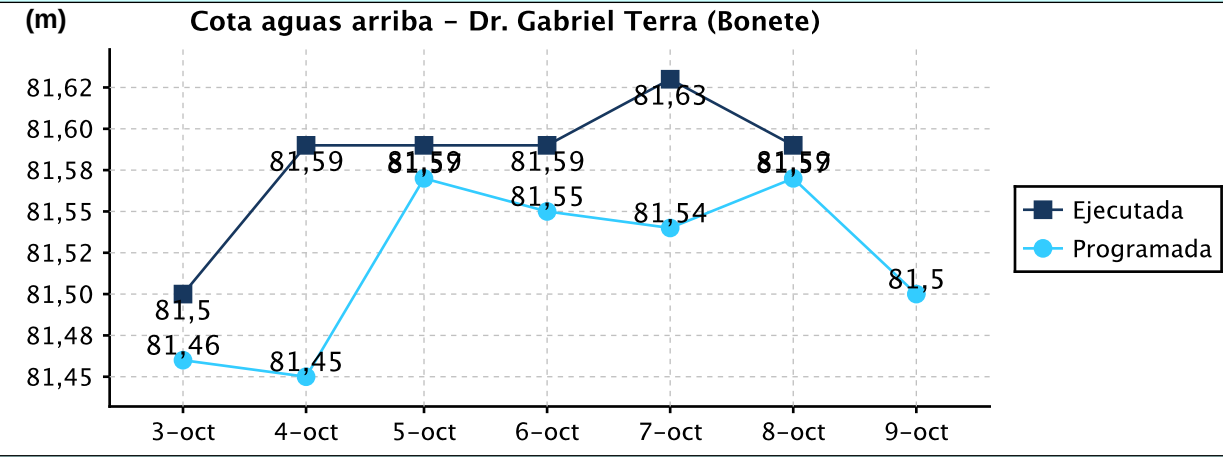


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,57	81,59
Baygorria	54,21	54,28
Palmar	40,17	40,19
SGU	34,28	34,49

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

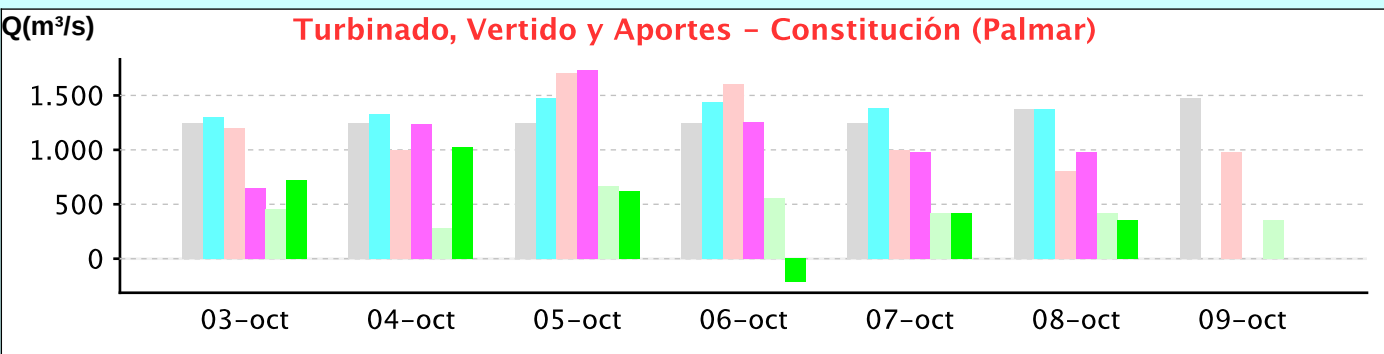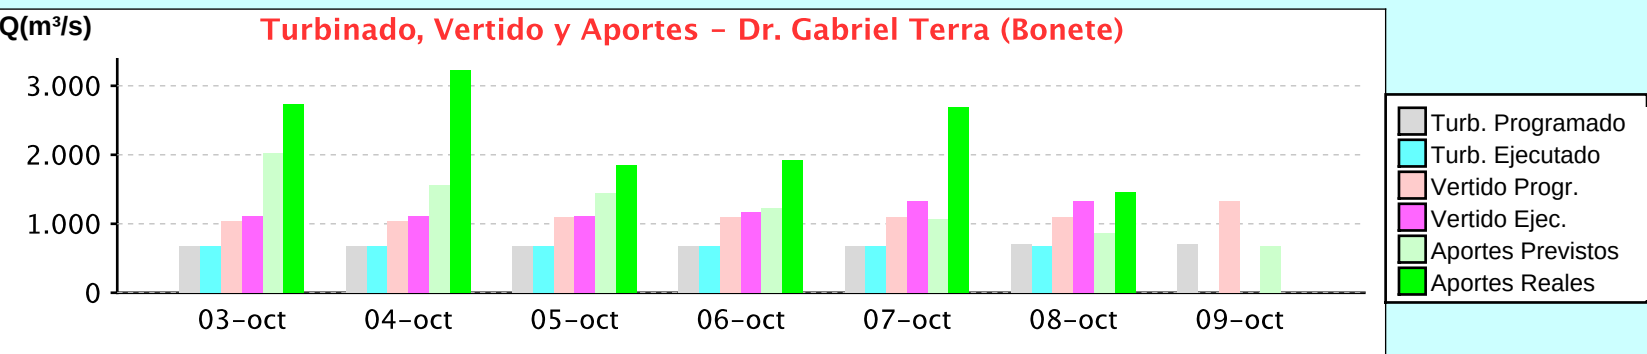

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

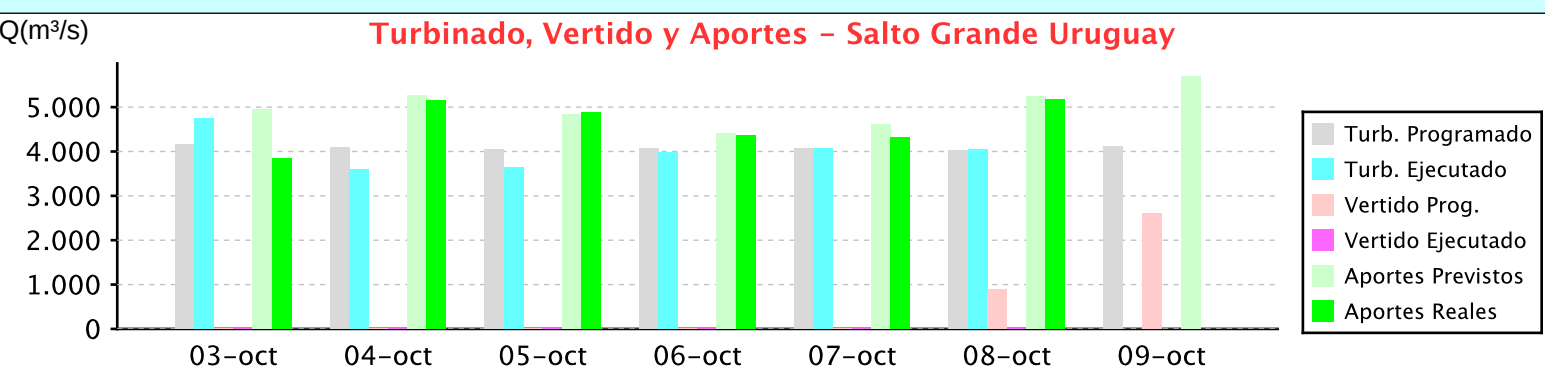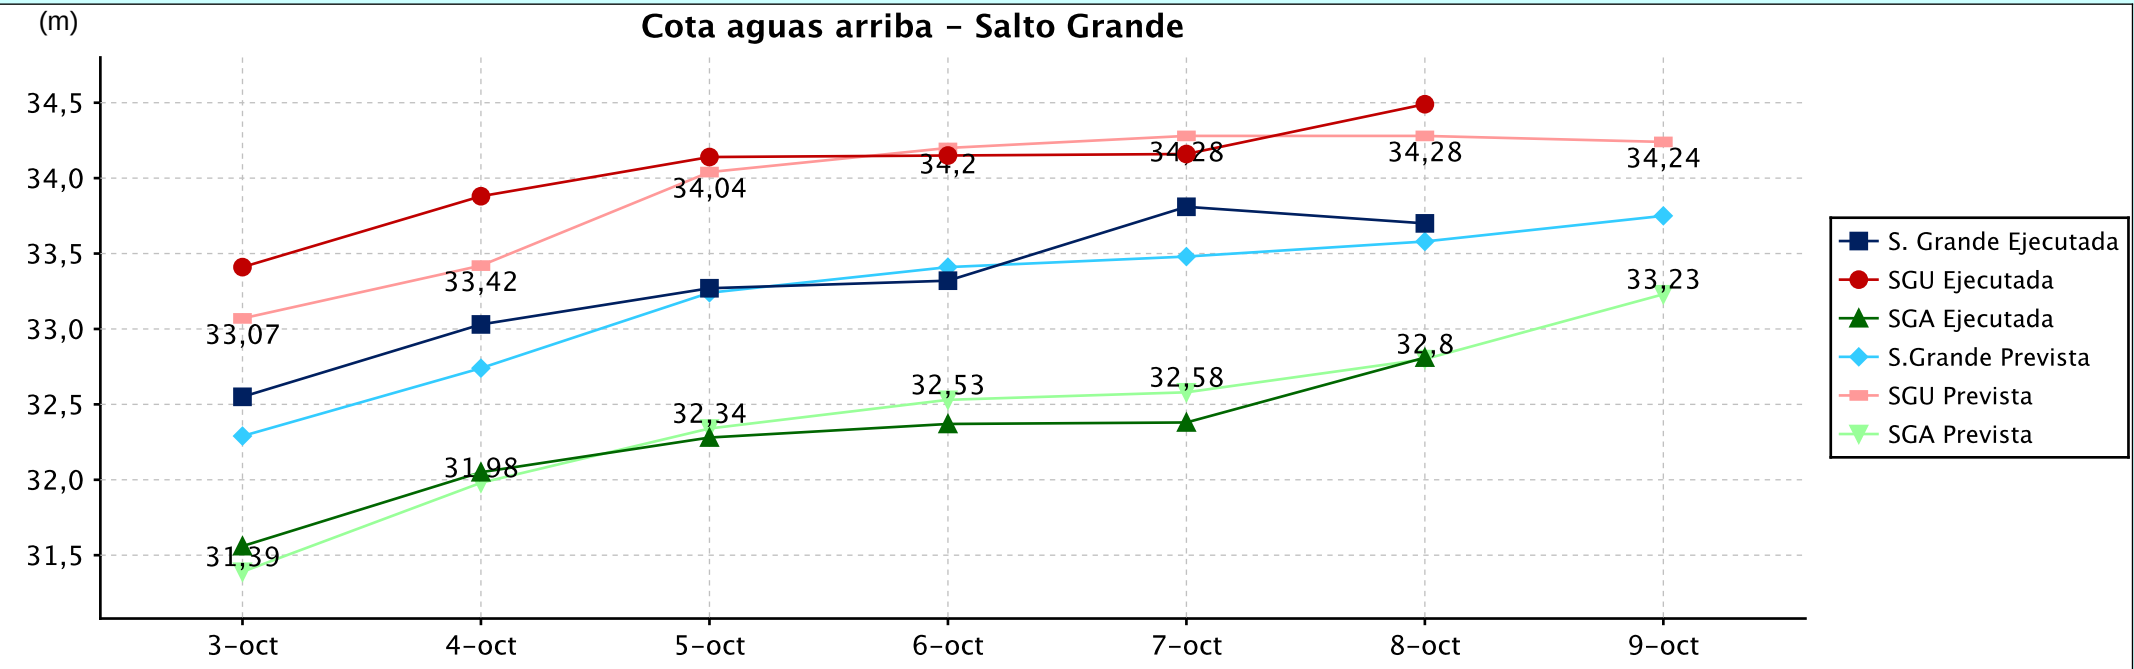

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,49
Cota Vista Arg	32,81
Cota real	33,70

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	33.260
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	697	673
Baygorria	854	842
Palmar	1.374	1.375
SGU	4.029	4.036

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	859	1.458
Baygorria	0	100
Palmar	416	352
SGU	5.250	5.184

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.330
Baygorria	850	1.112
Palmar	800	975
SGU	900	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
