




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 14 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.796
Baygorria	1.785
Palmar	7.861
Salto Grande	12.520
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	14.758
TOTAL Generación	39.626

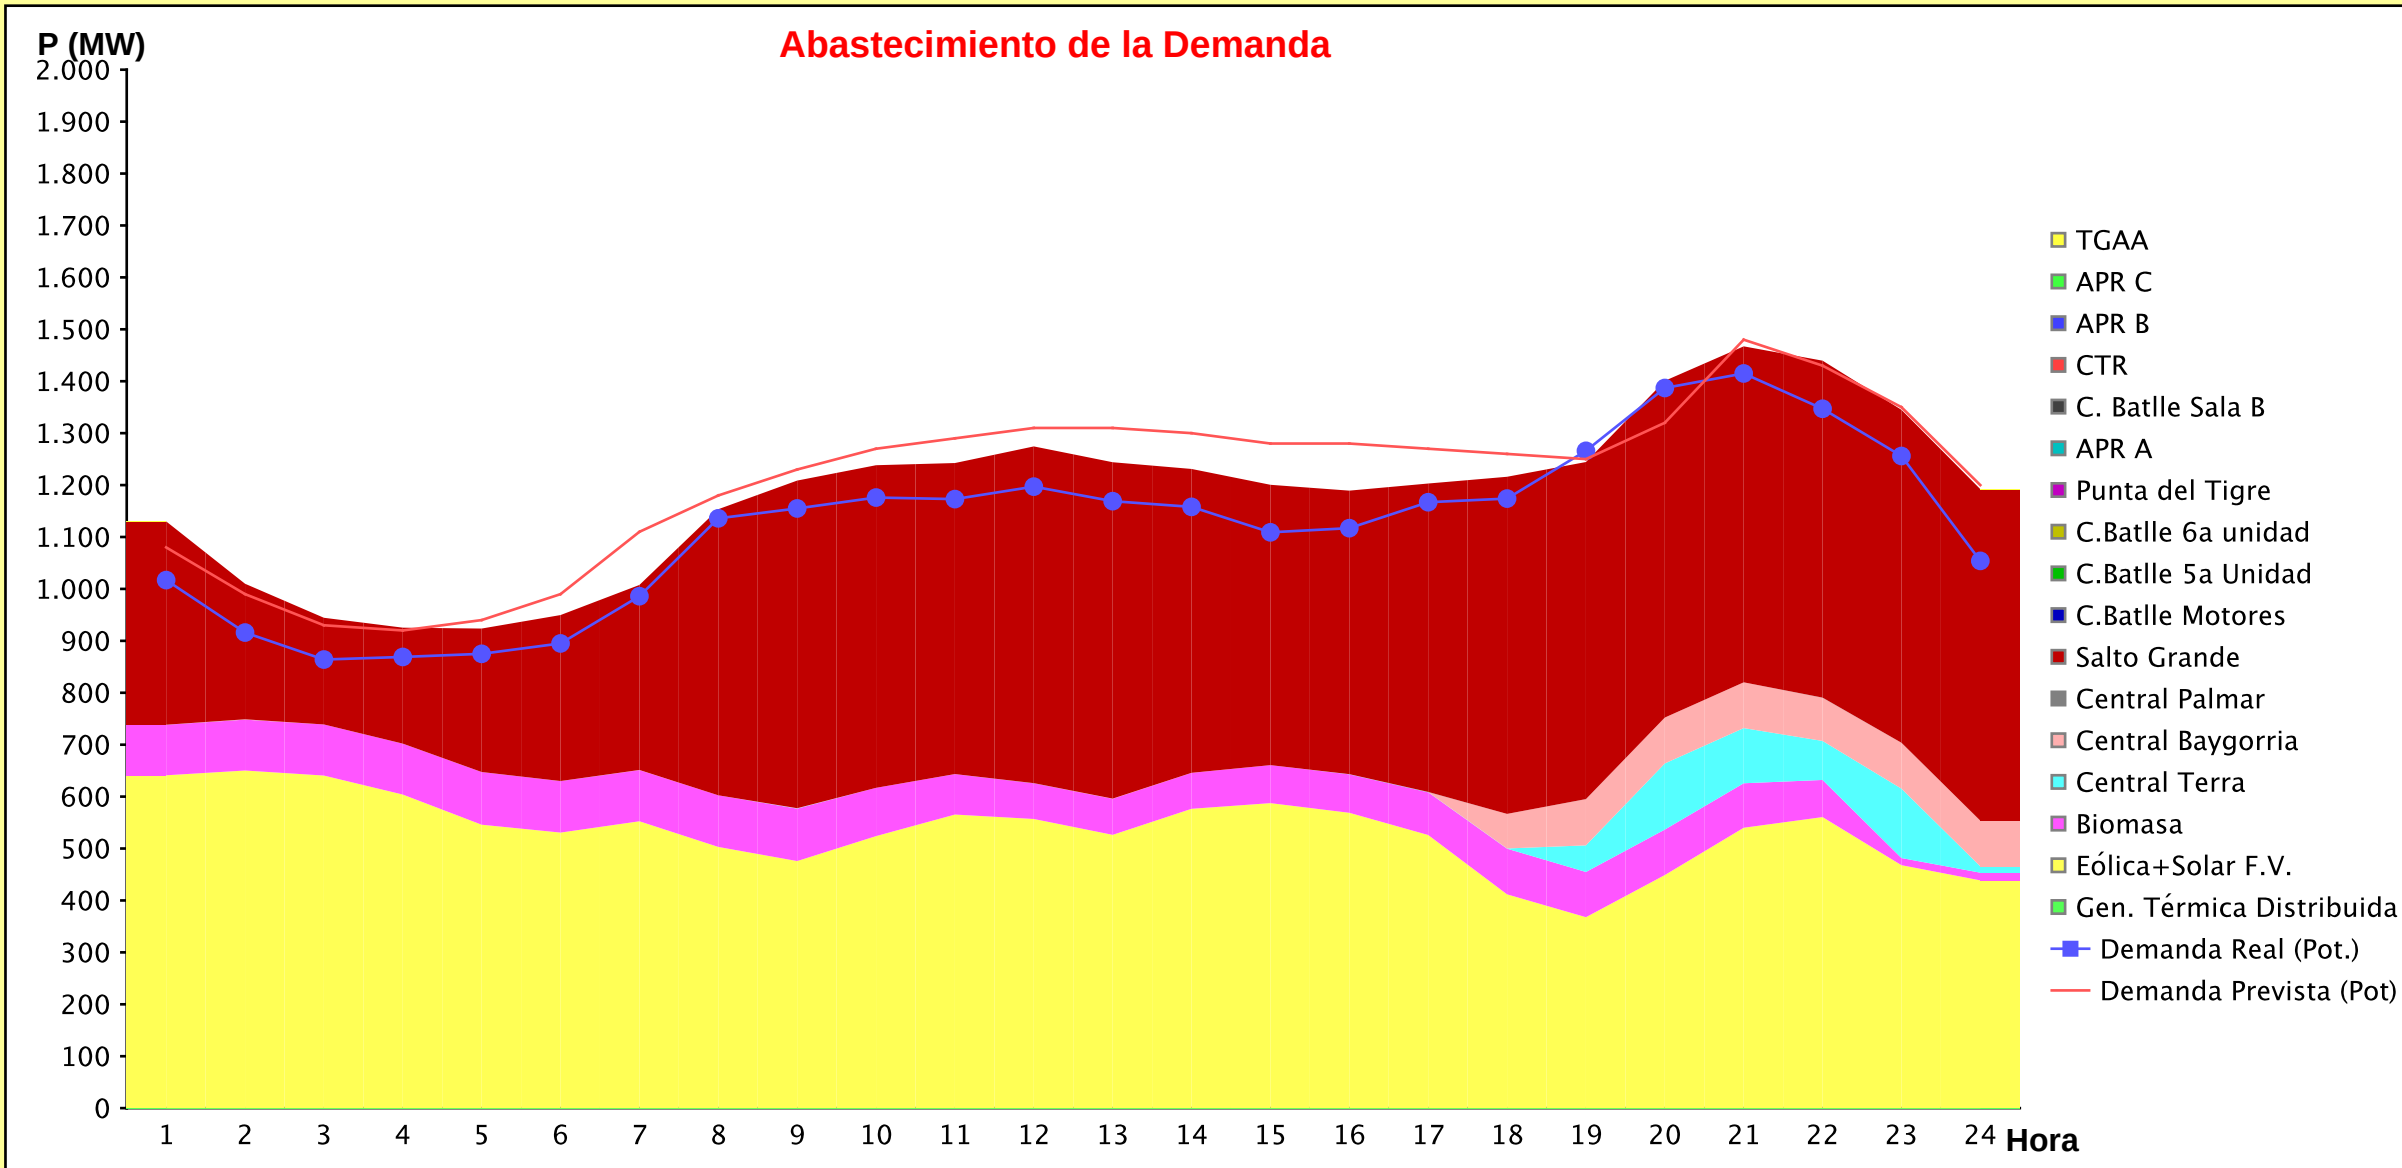

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.348
Hidráulica	11.348
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.348




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.278
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.970
Diferencia (MWh)	-692
Ejecutada - Programada	-2,39 %

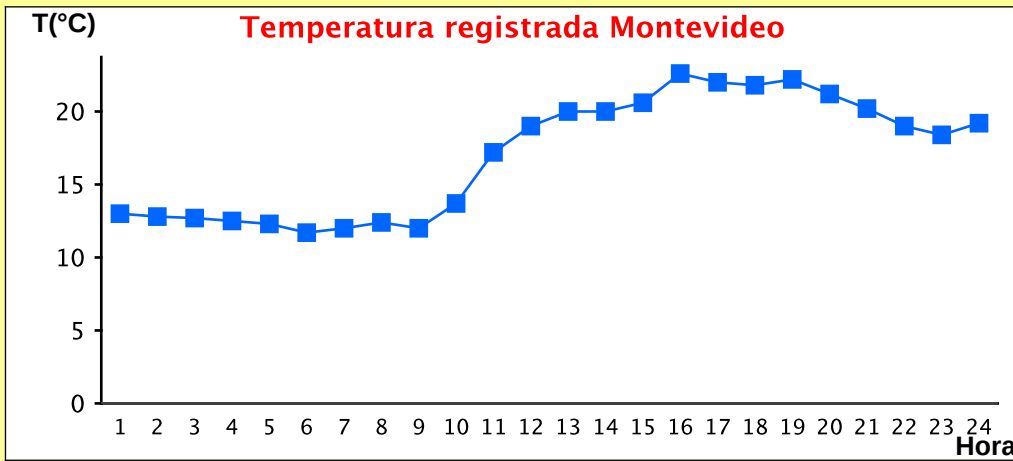



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1300 Hora 11:48
Potencia mínima:	910 Hora 03:49
Pico noche:	1488 Hora 20:45

Generación Media (MW)	
Eólica	522,4
Biomasa	81,5
Solar fotovoltaica	9,8
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

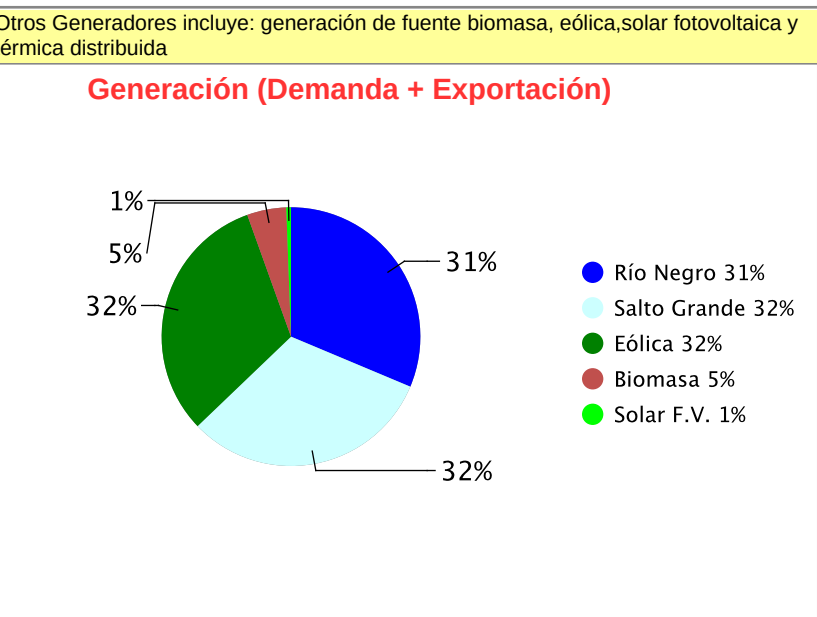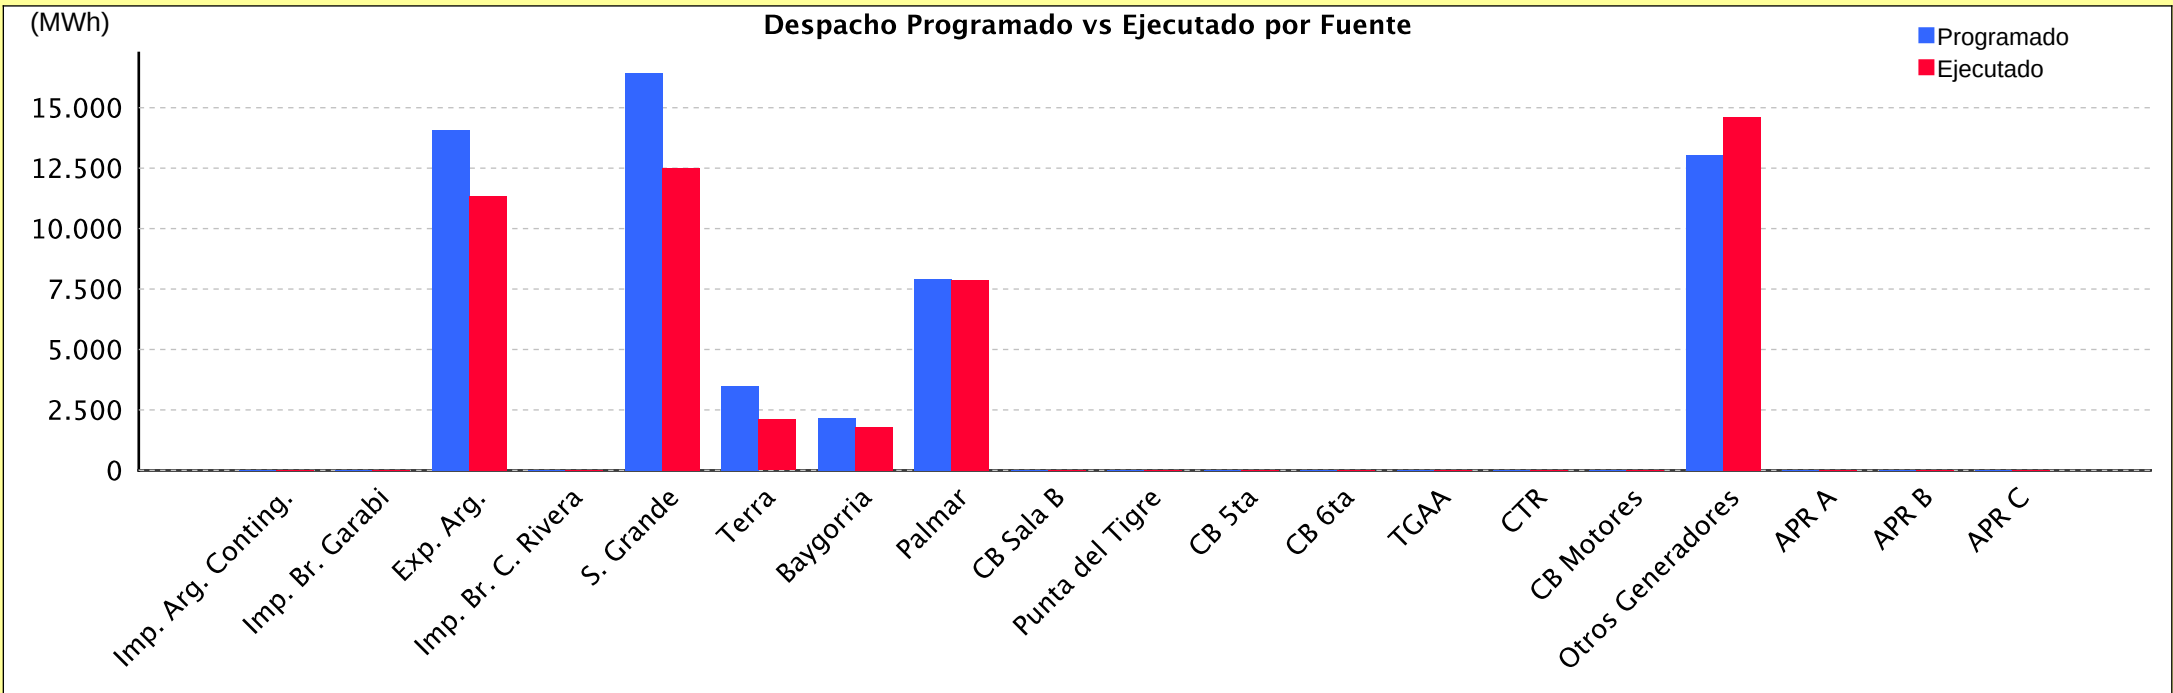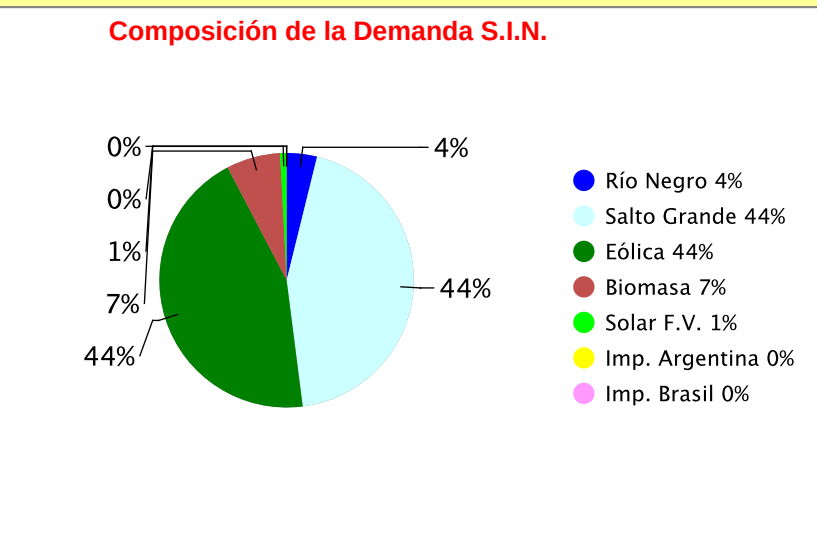



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

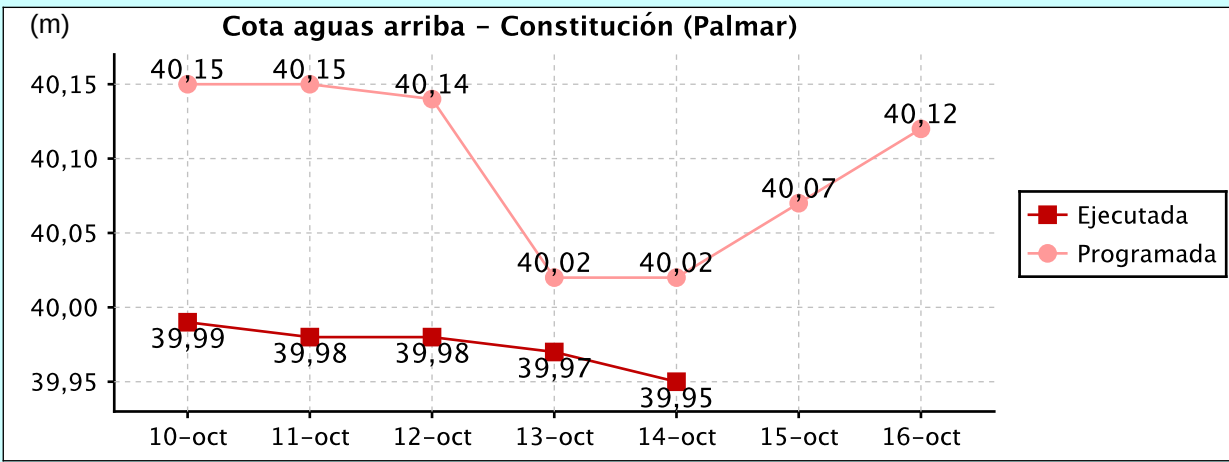
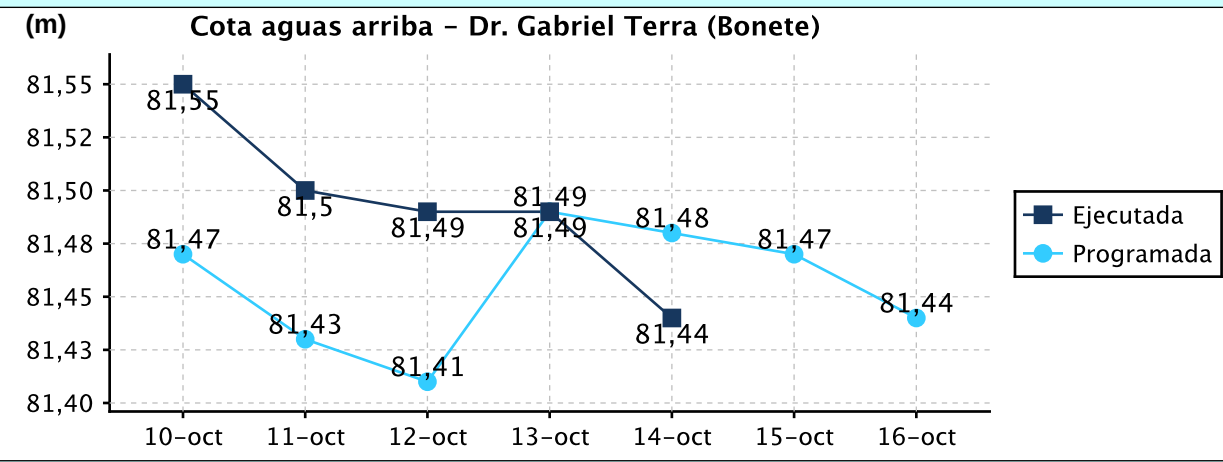


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,48	81,44
Baygorria	54,33	54,13
Palmar	40,02	39,95
SGU	33,50	33,27

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

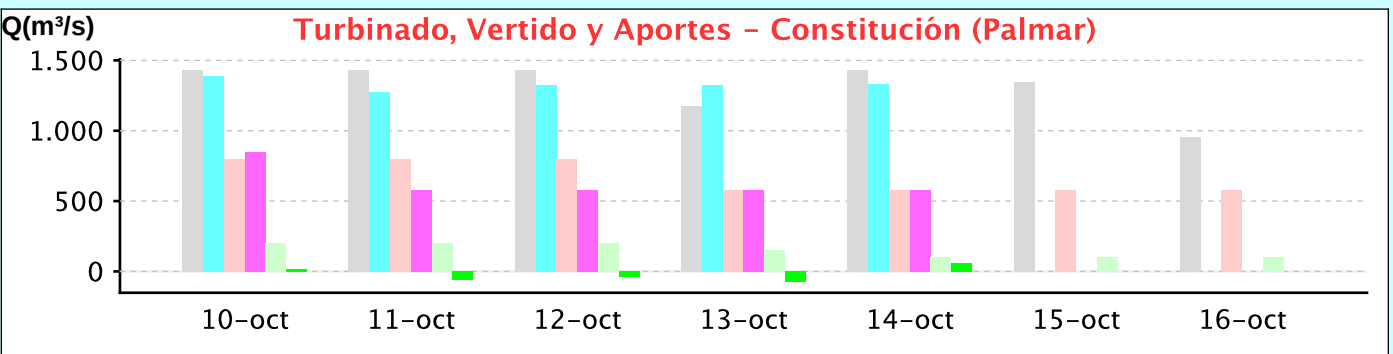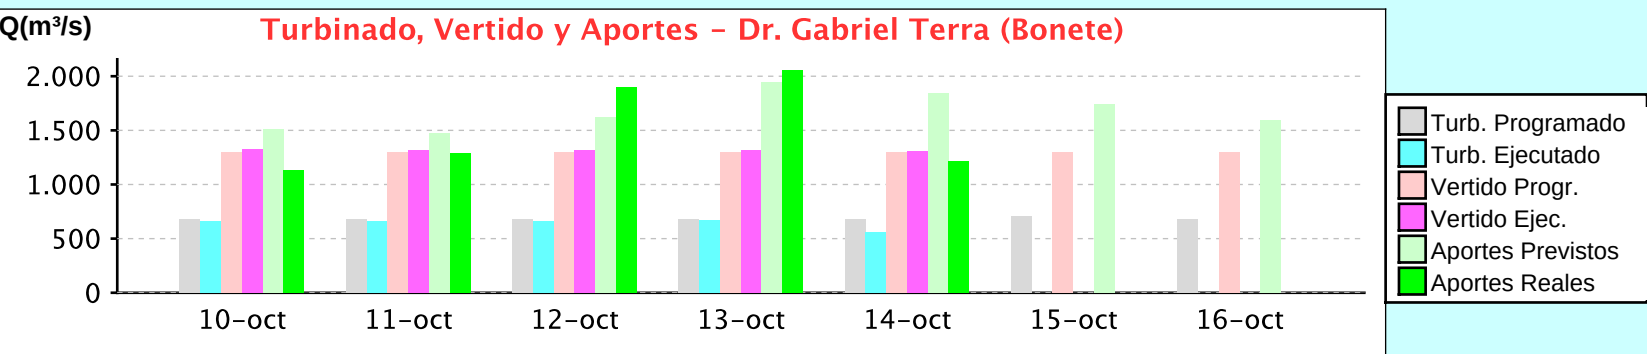

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

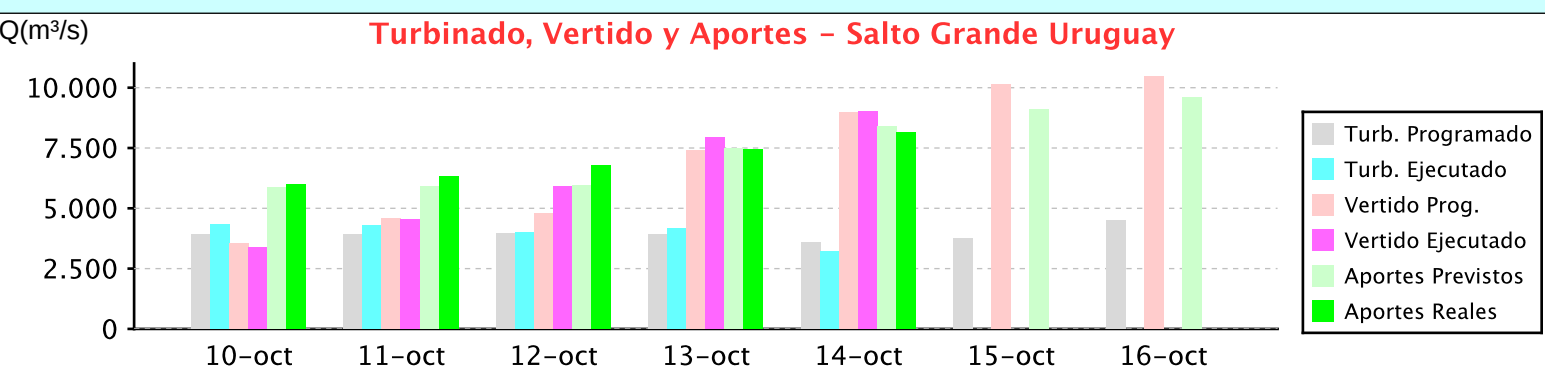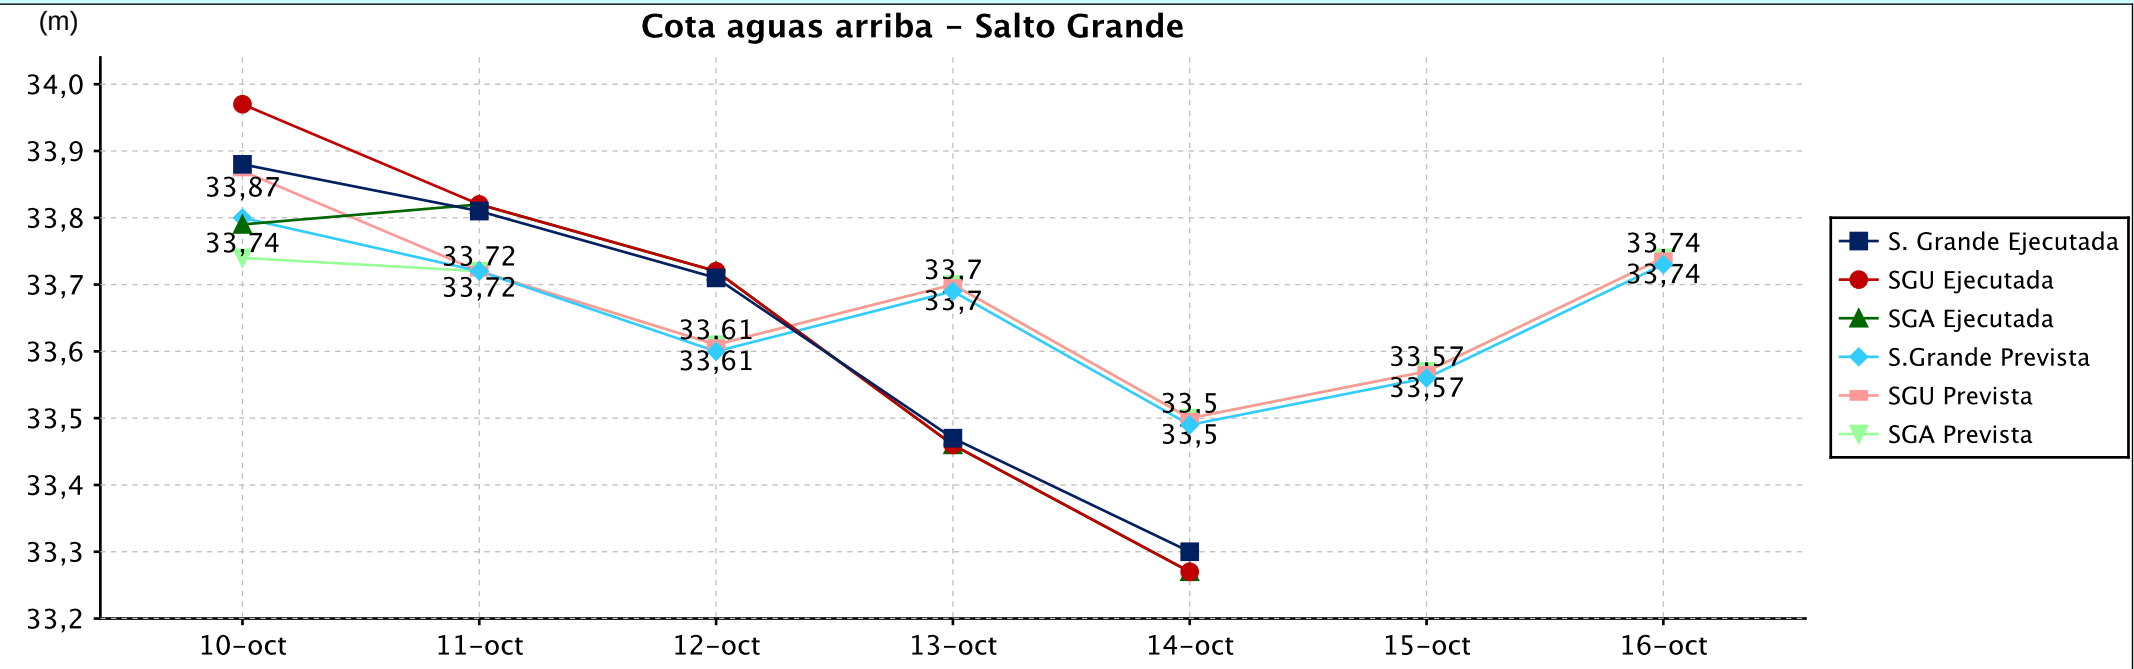

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,27
Cota Vista Arg	33,27
Cota real	33,30

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	563
Baygorria	862	694
Palmar	1.432	1.333
SGU	3.570	3.232

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.841	1.214
Baygorria	0	-253
Palmar	100	62
SGU	8.400	8.148

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	1.311
Baygorria	1.150	1.114
Palmar	580	581
SGU	8.984	8.999

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
