




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 15 de octubre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	2.285
Baygorria	1.544
Palmar	7.884
Salto Grande	14.858
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.387
TOTAL Generación	39.861

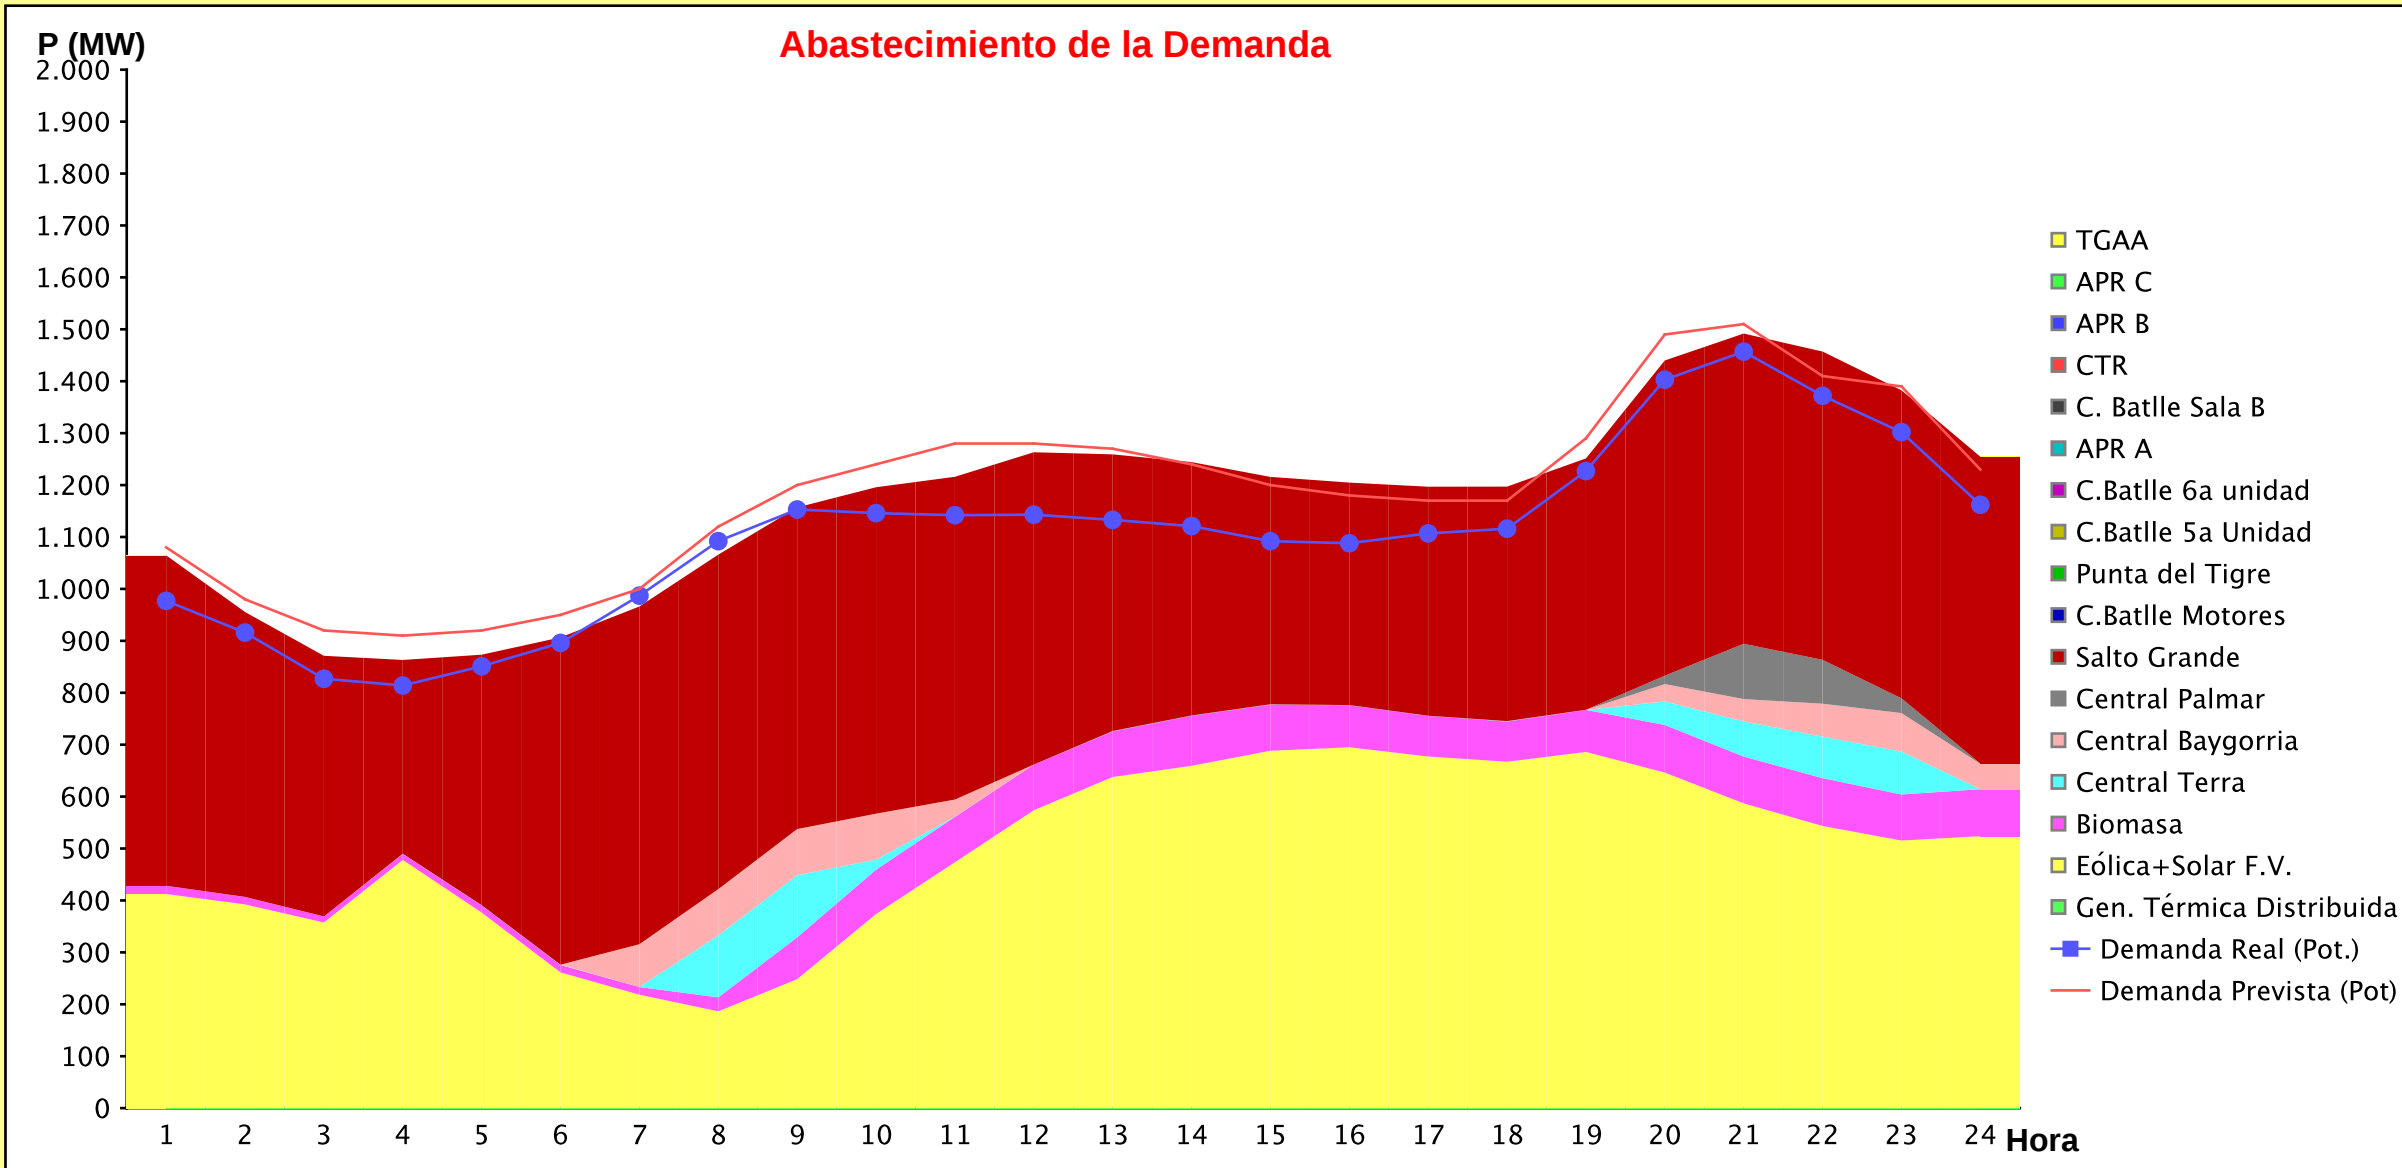




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.972
Hidráulica	11.972
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.972

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.889
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.430
Diferencia (MWh)	-541
Ejecutada - Programada	-1.90 %

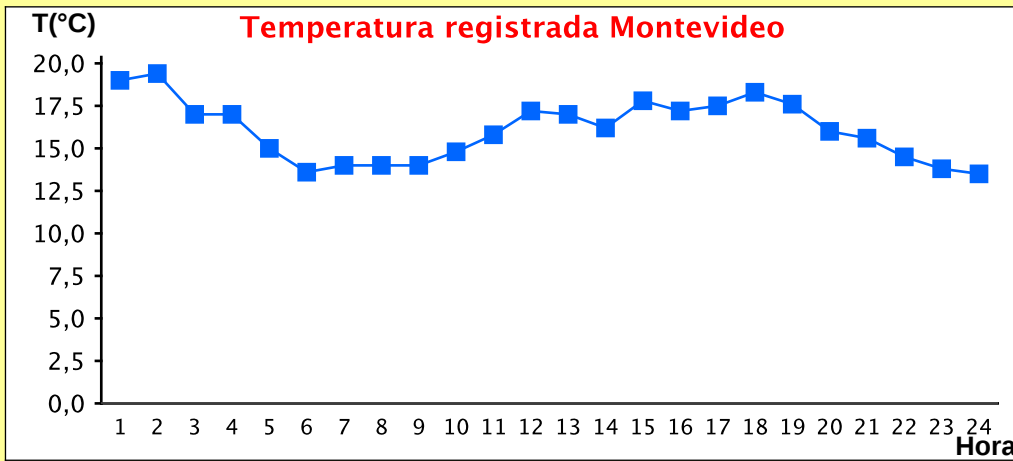



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1294 Hora 11:48
Potencia mínima:	854 Hora 04:42
Pico noche:	1505 Hora 20:44

Generación Media (MW)	
Eólica	476,7
Biomasa	63,4
Solar fotovoltaica	16,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

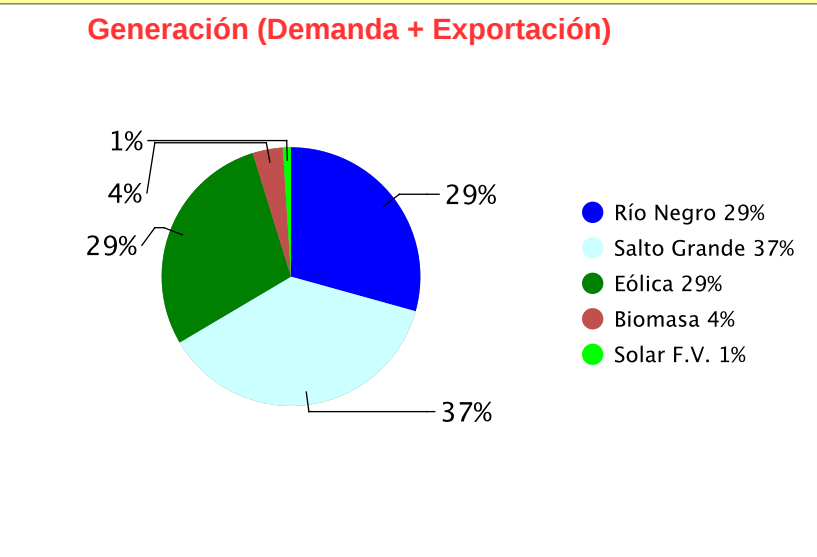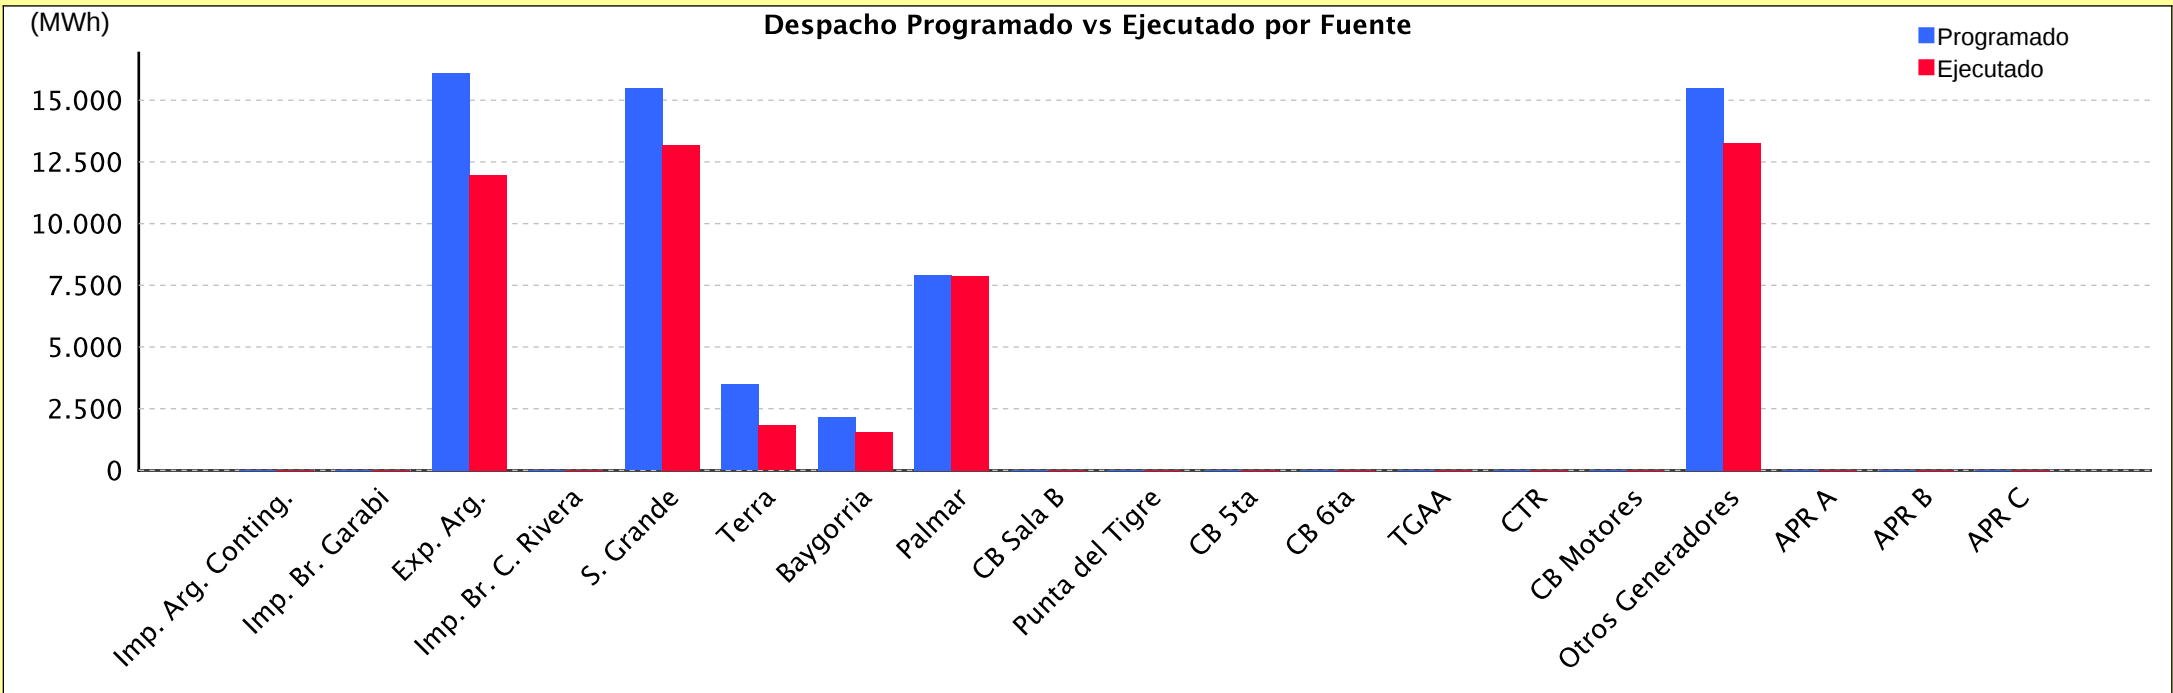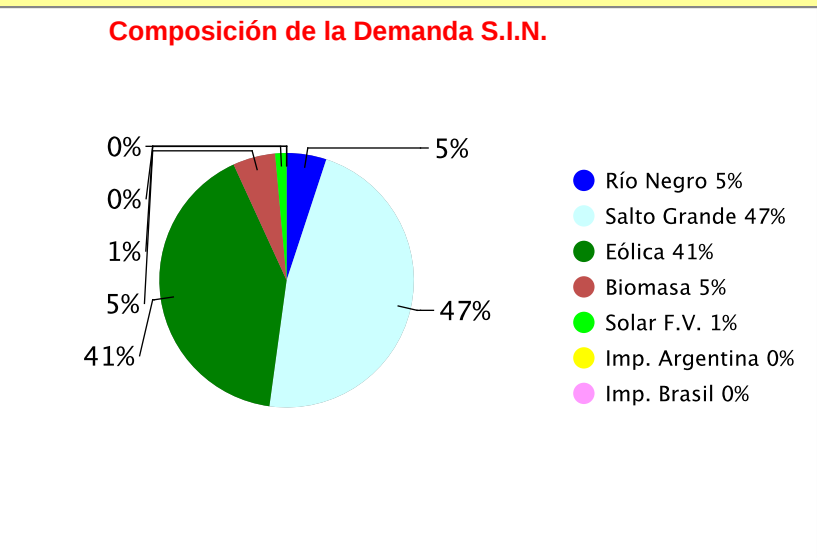



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

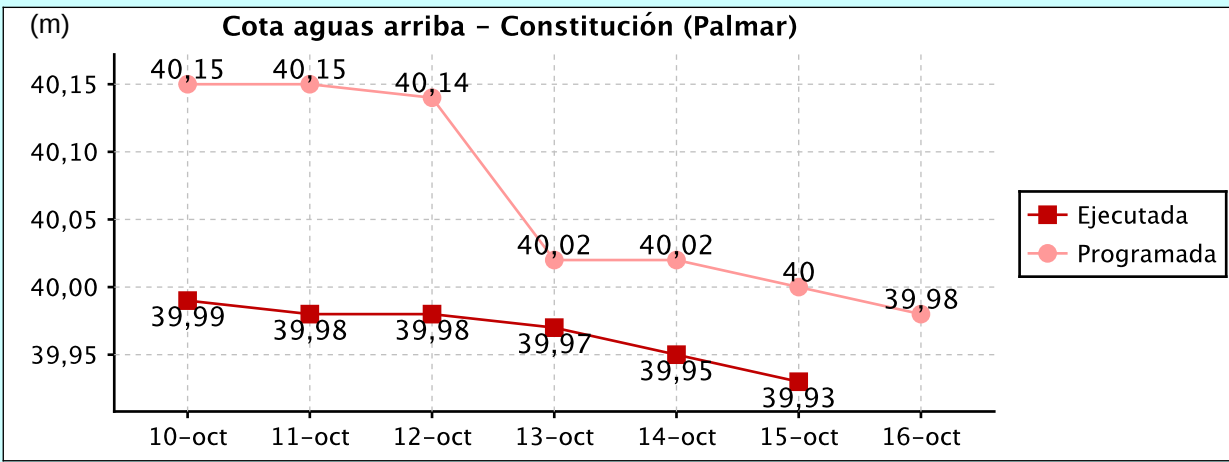
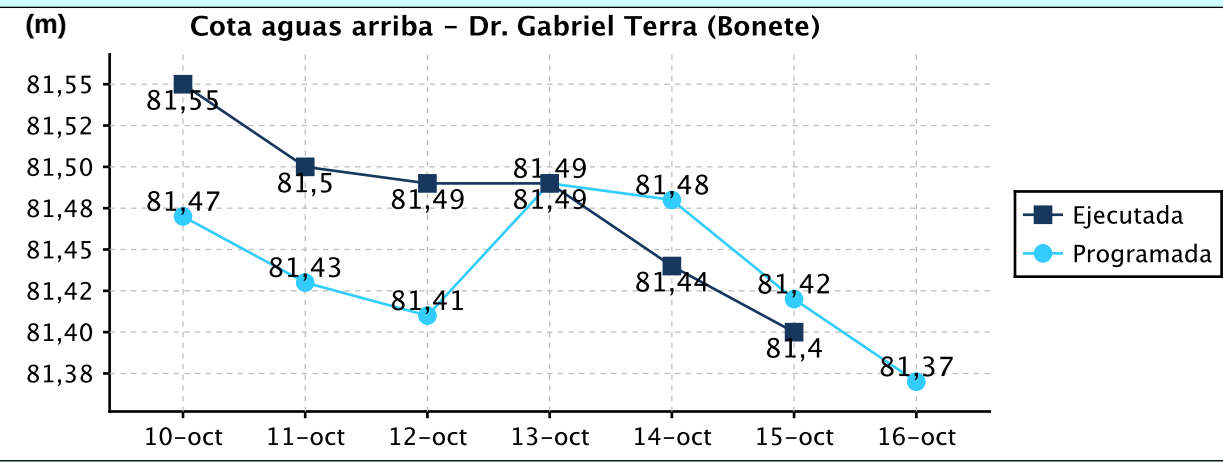


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,42	81,4
Baygorria	54,12	54,19
Palmar	40,00	39,93
SGU	33,35	33,1

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

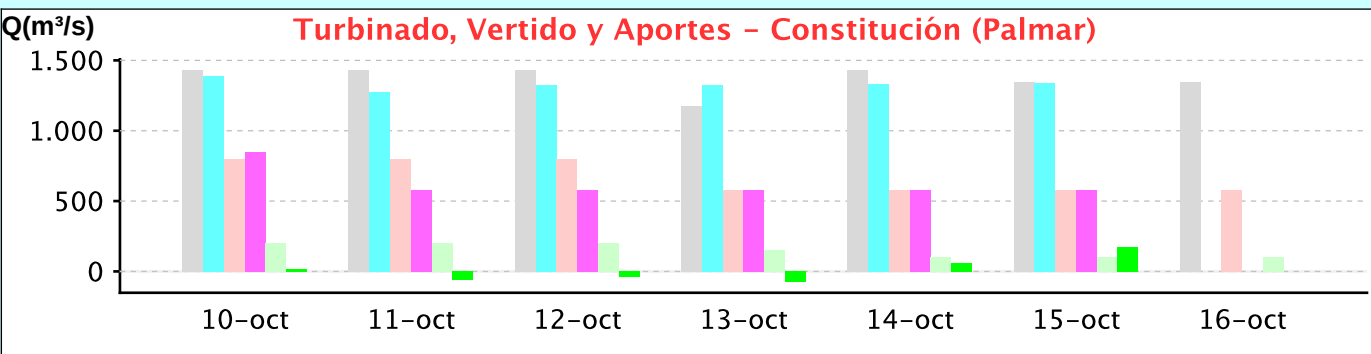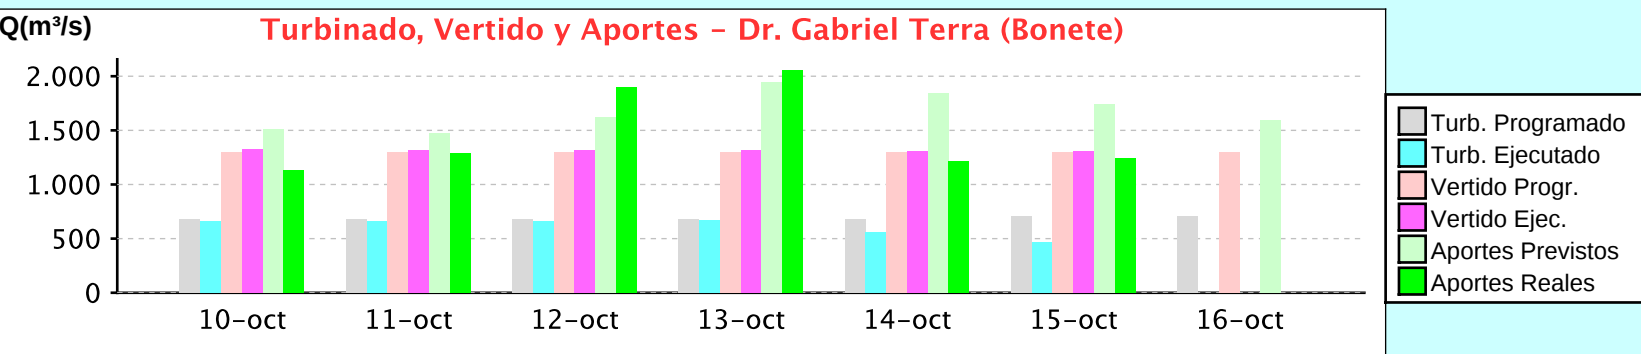

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

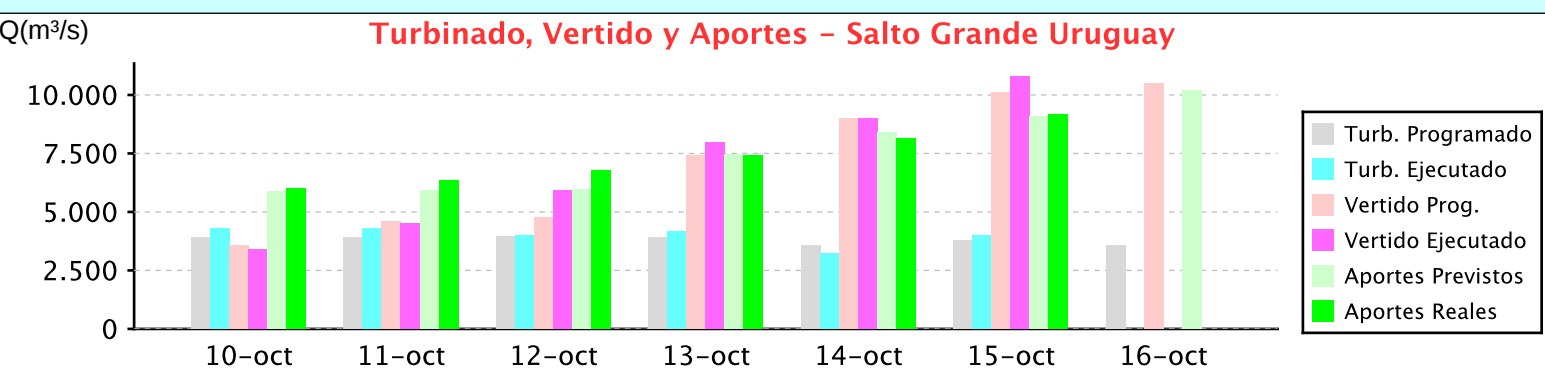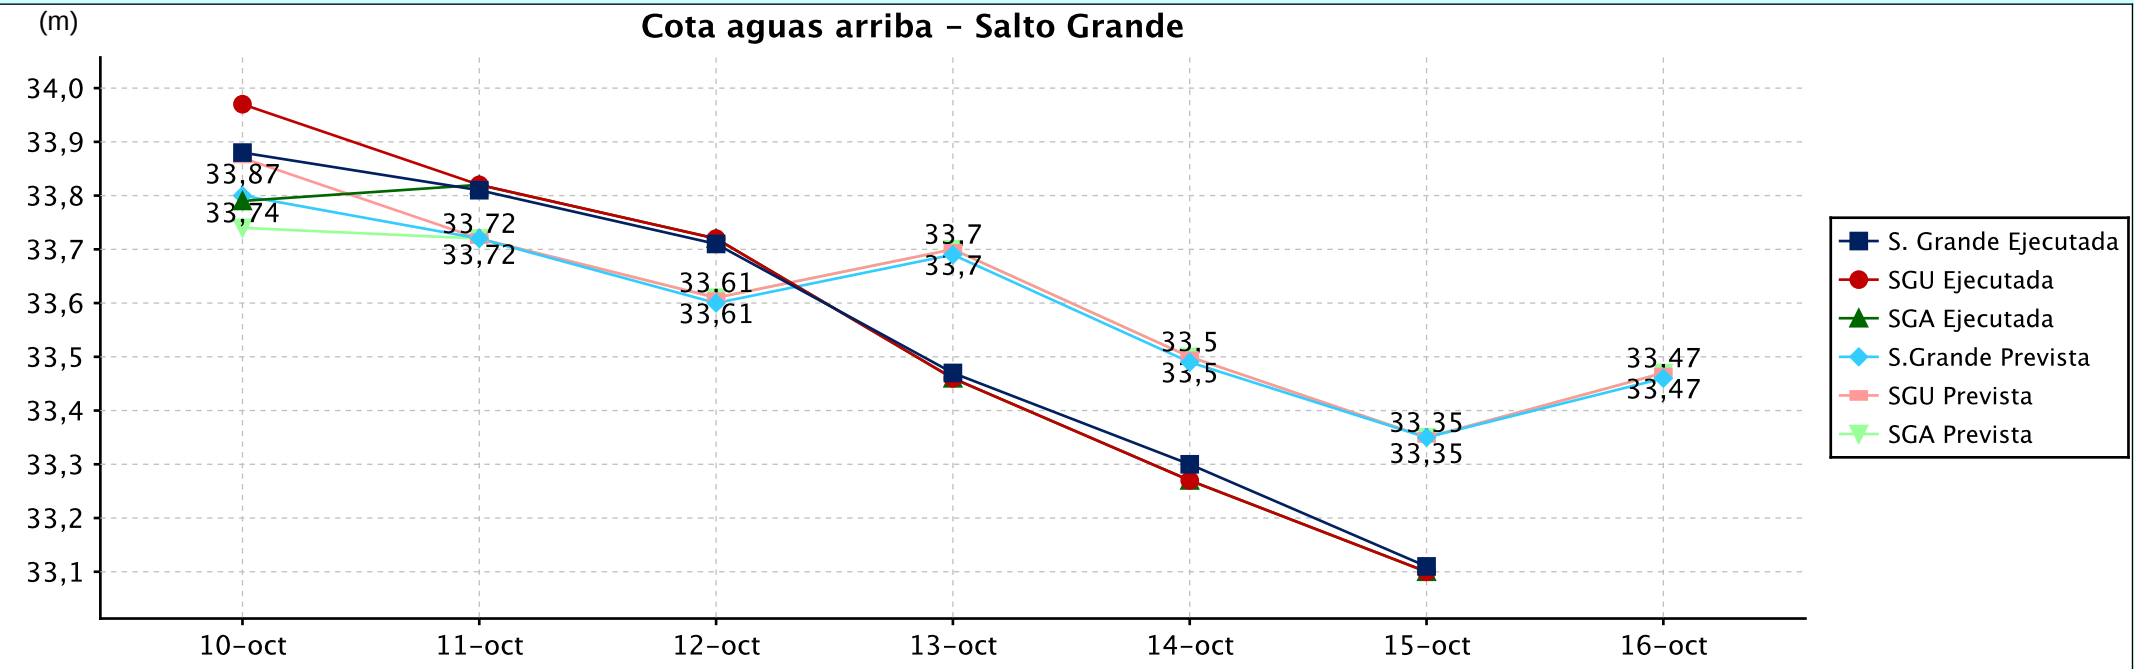

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,10
Cota Vista Arg	33,10
Cota real	33,11

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	707	463
Baygorria	839	596
Palmar	1.344	1.341
SGU	3.769	4.016

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.737	1.244
Baygorria	0	29
Palmar	100	174
SGU	9.100	9.173

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	1.303
Baygorria	1.150	1.108
Palmar	580	581
SGU	10.129	10.806

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
