




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 16 de octubre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-85
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.010
Baygorria	1.601
Palmar	7.881
Salto Grande	14.111
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.336
TOTAL Generación	39.841



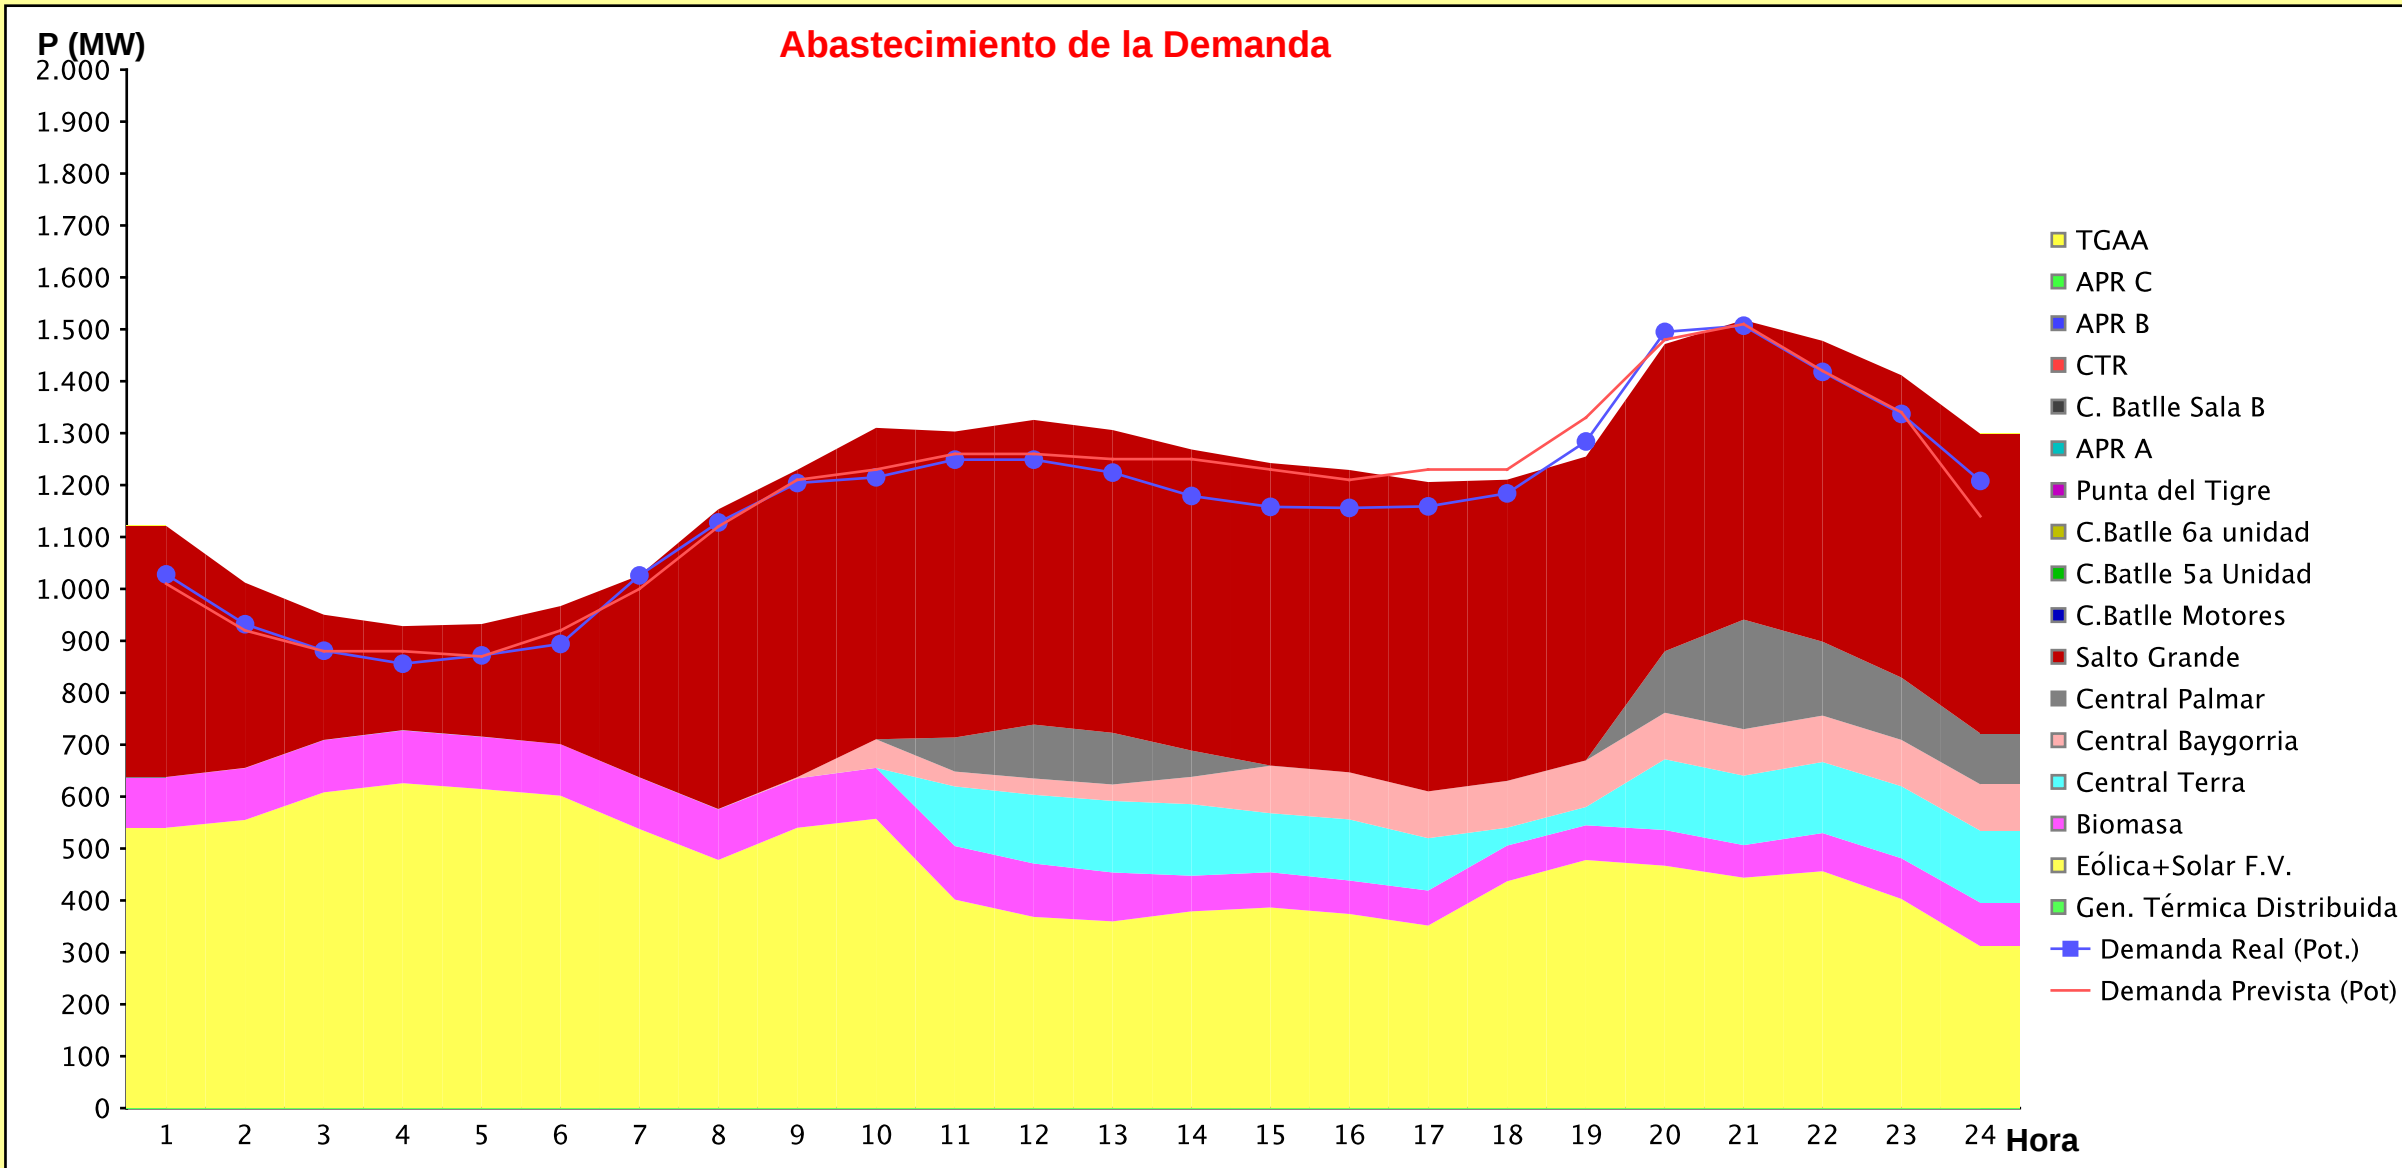


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	10.792
Hidráulica	10.792
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	10.792

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.049
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.180
Diferencia (MWh)	869
Ejecutada - Programada	3,08 %


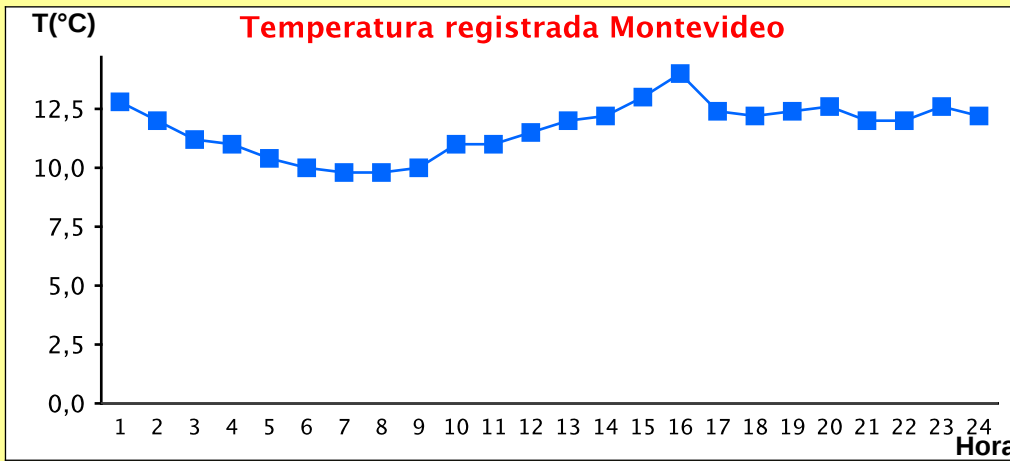


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1341 Hora 11:44
Potencia mínima:	925 Hora 03:34
Pico noche:	1552 Hora 20:24
Generación Media (MW)	
Eólica	451,7
Biomasa	93,2
Solar fotovoltaica	16,5
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

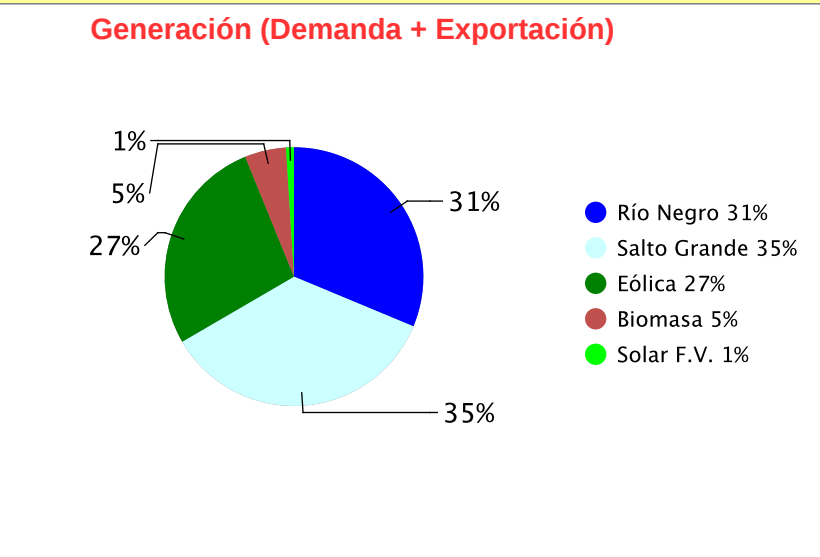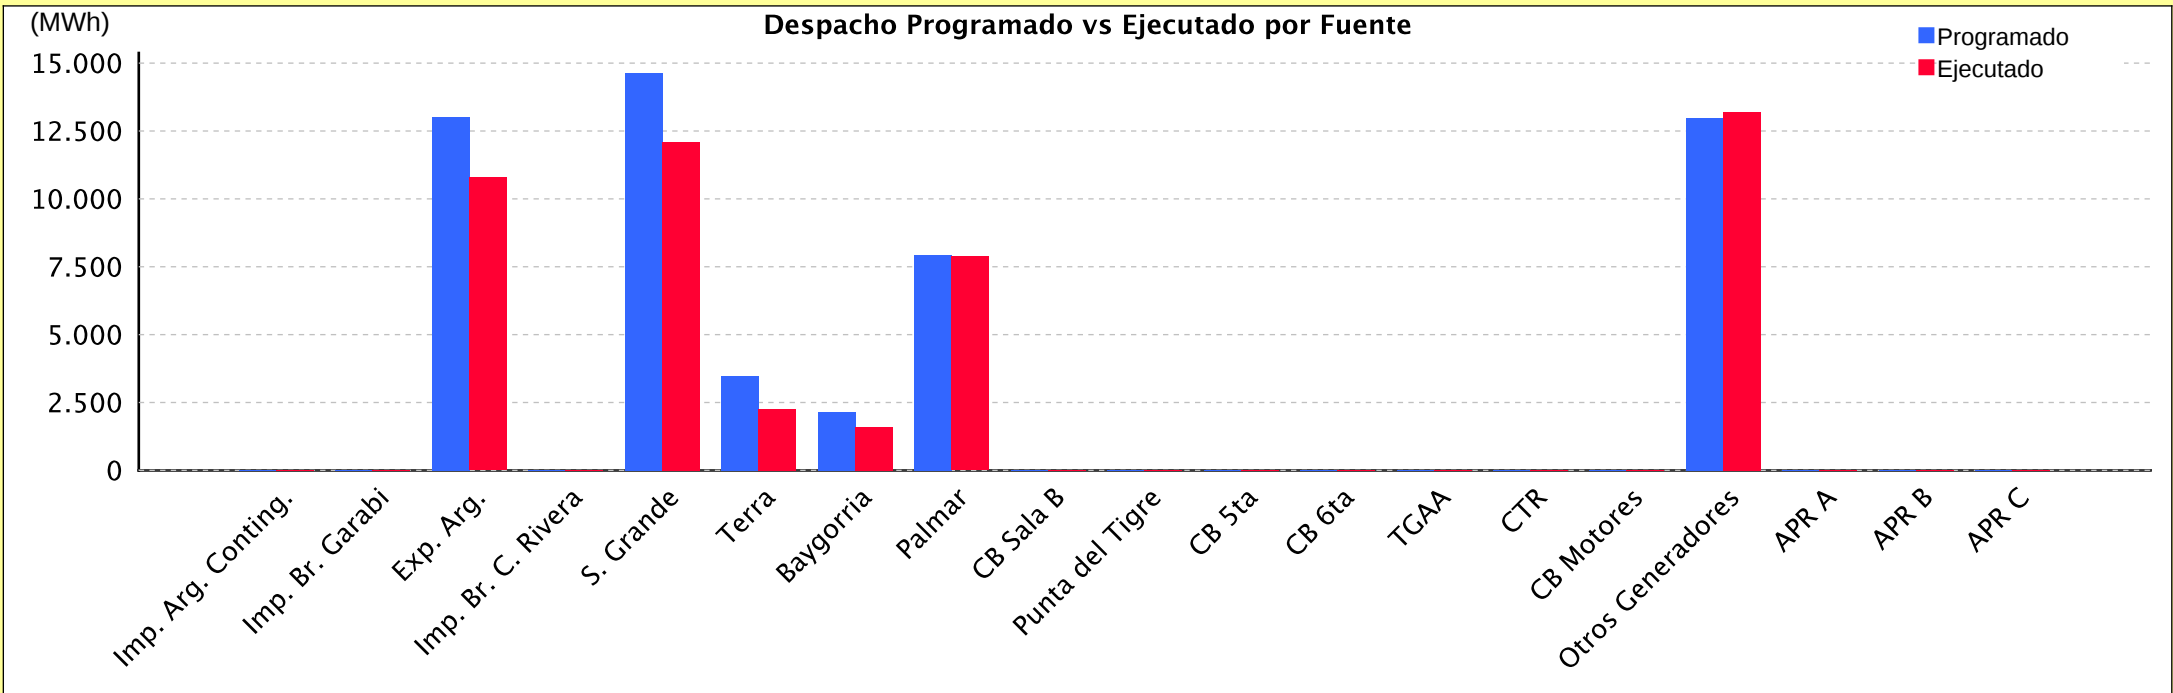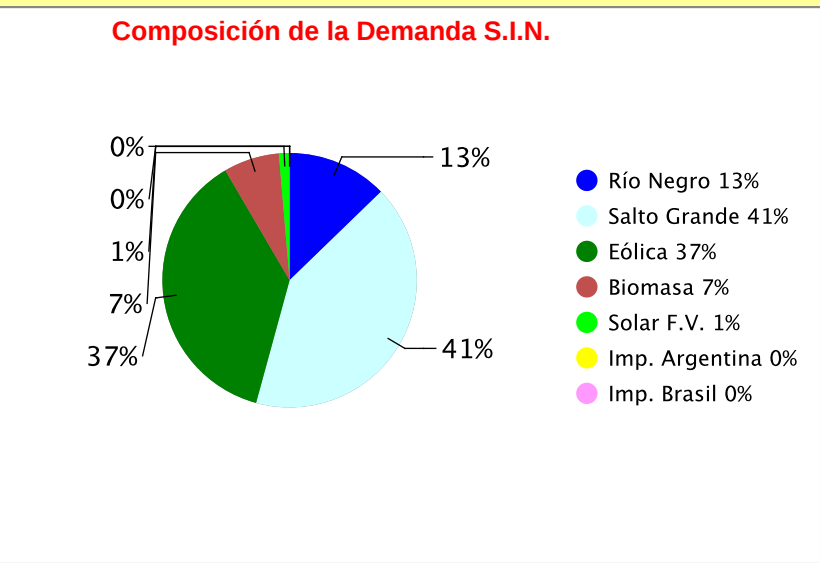



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

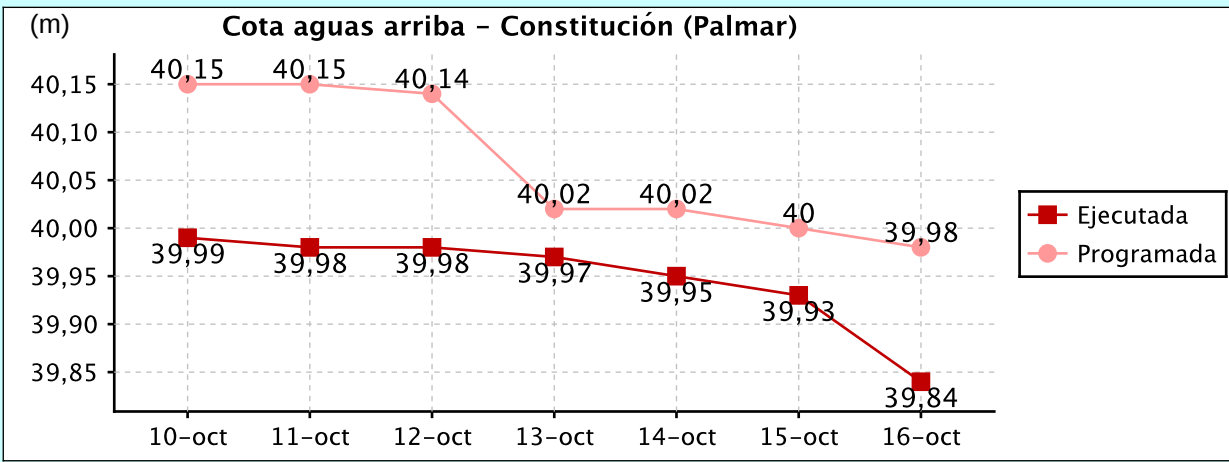
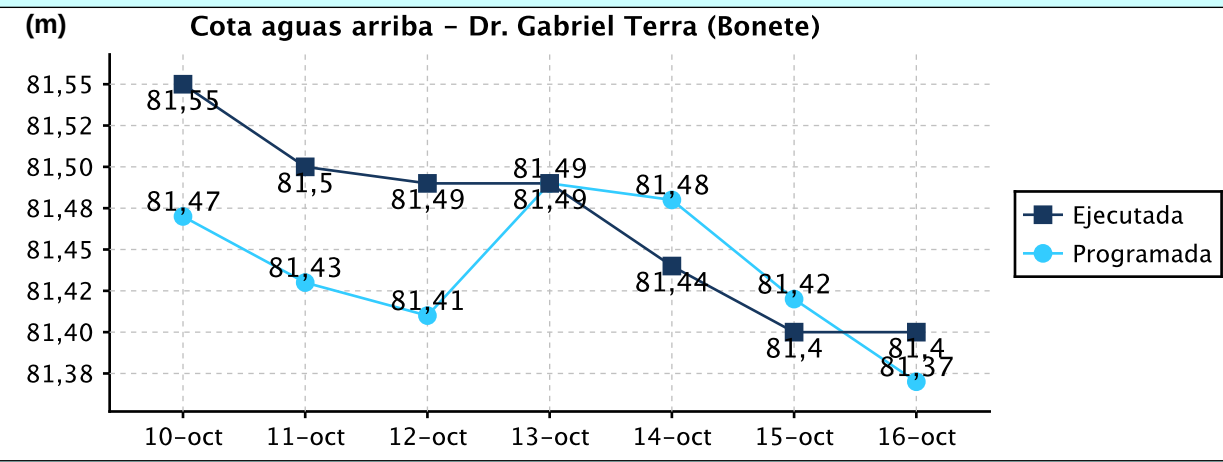


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,37	81,4
Baygorria	54,18	54,26
Palmar	39,98	39,84
SGU	33,47	33,1

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

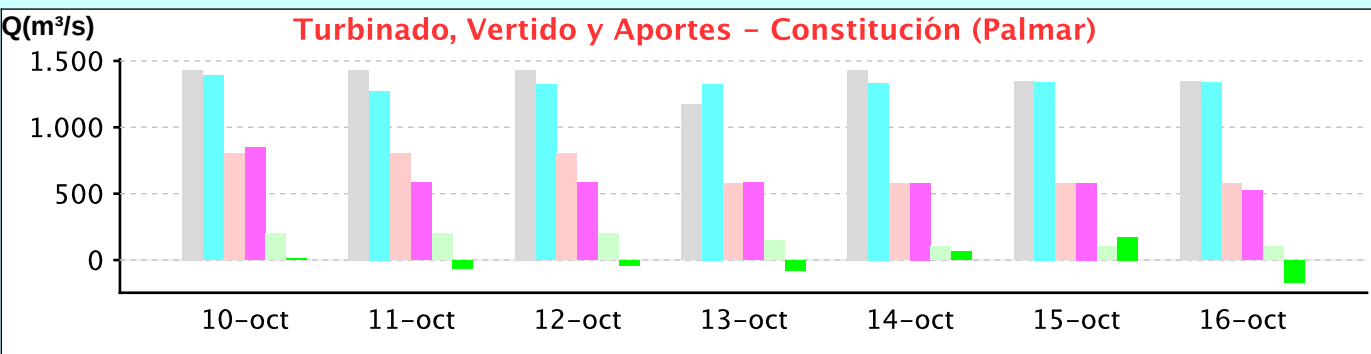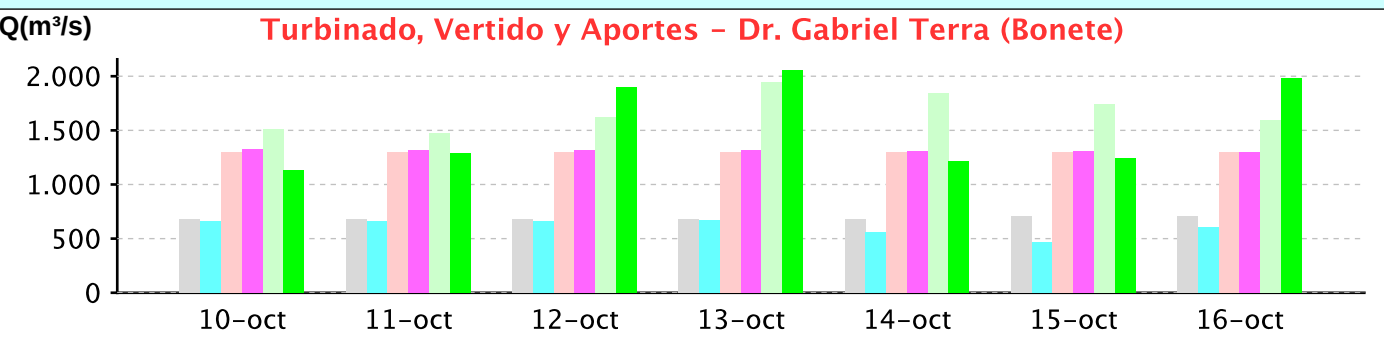

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

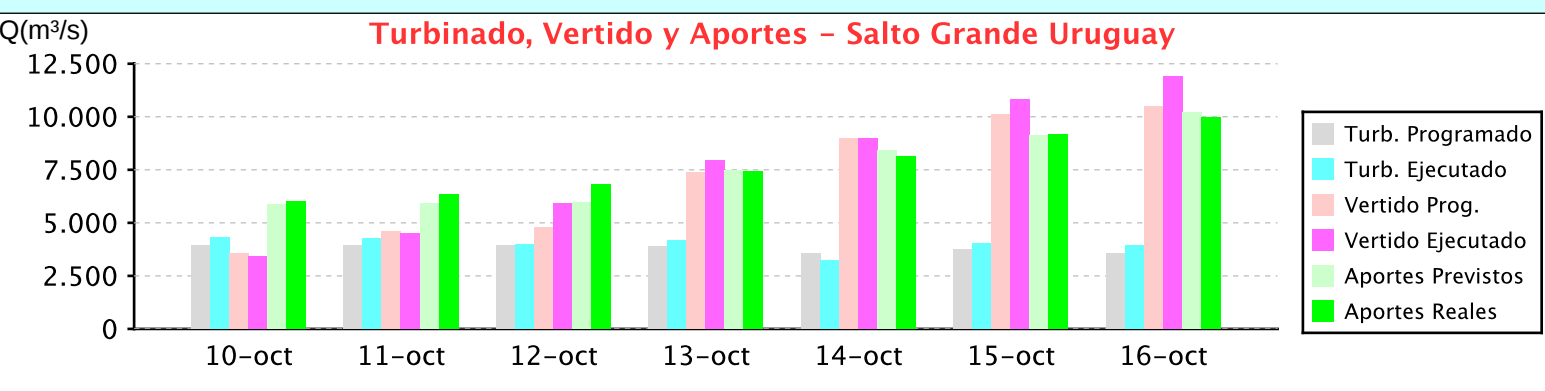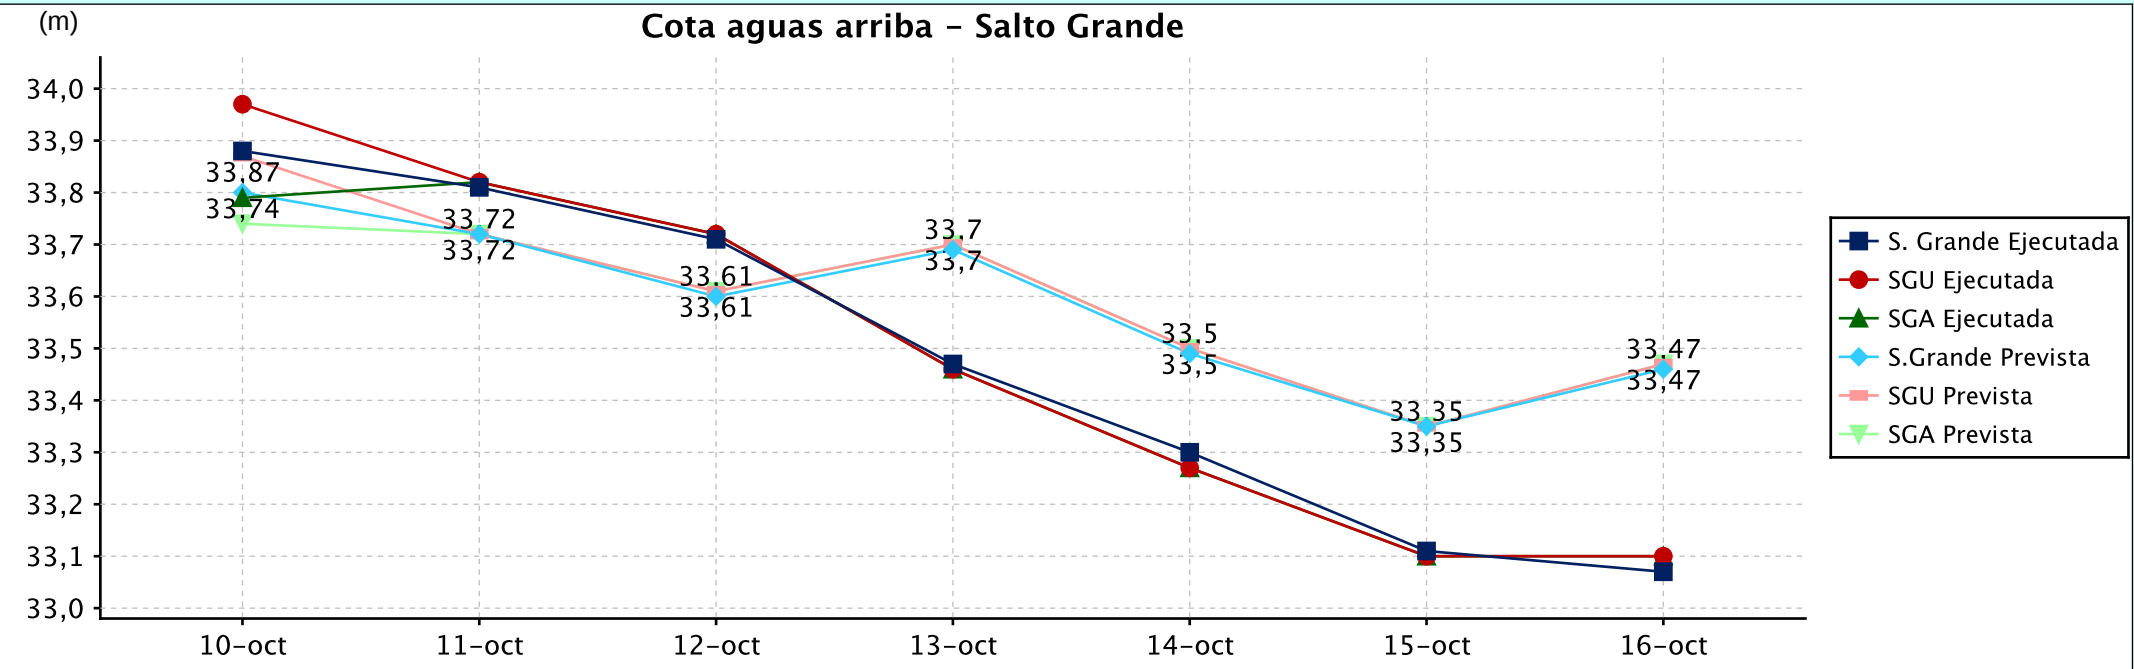

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,10
Cota Vista Arg	33,10
Cota real	33,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	707	608
Baygorria	839	602
Palmar	1.344	1.339
SGU	3.561	3.938

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.597	1.978
Baygorria	0	-102
Palmar	100	-166
SGU	10.200	9.968

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	1.301
Baygorria	1.150	1.114
Palmar	580	521
SGU	10.481	11.917

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
