




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 17 de octubre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-92
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.244
Baygorria	2.021
Palmar	7.873
Salto Grande	14.095
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	12.055
TOTAL Generación	39.186

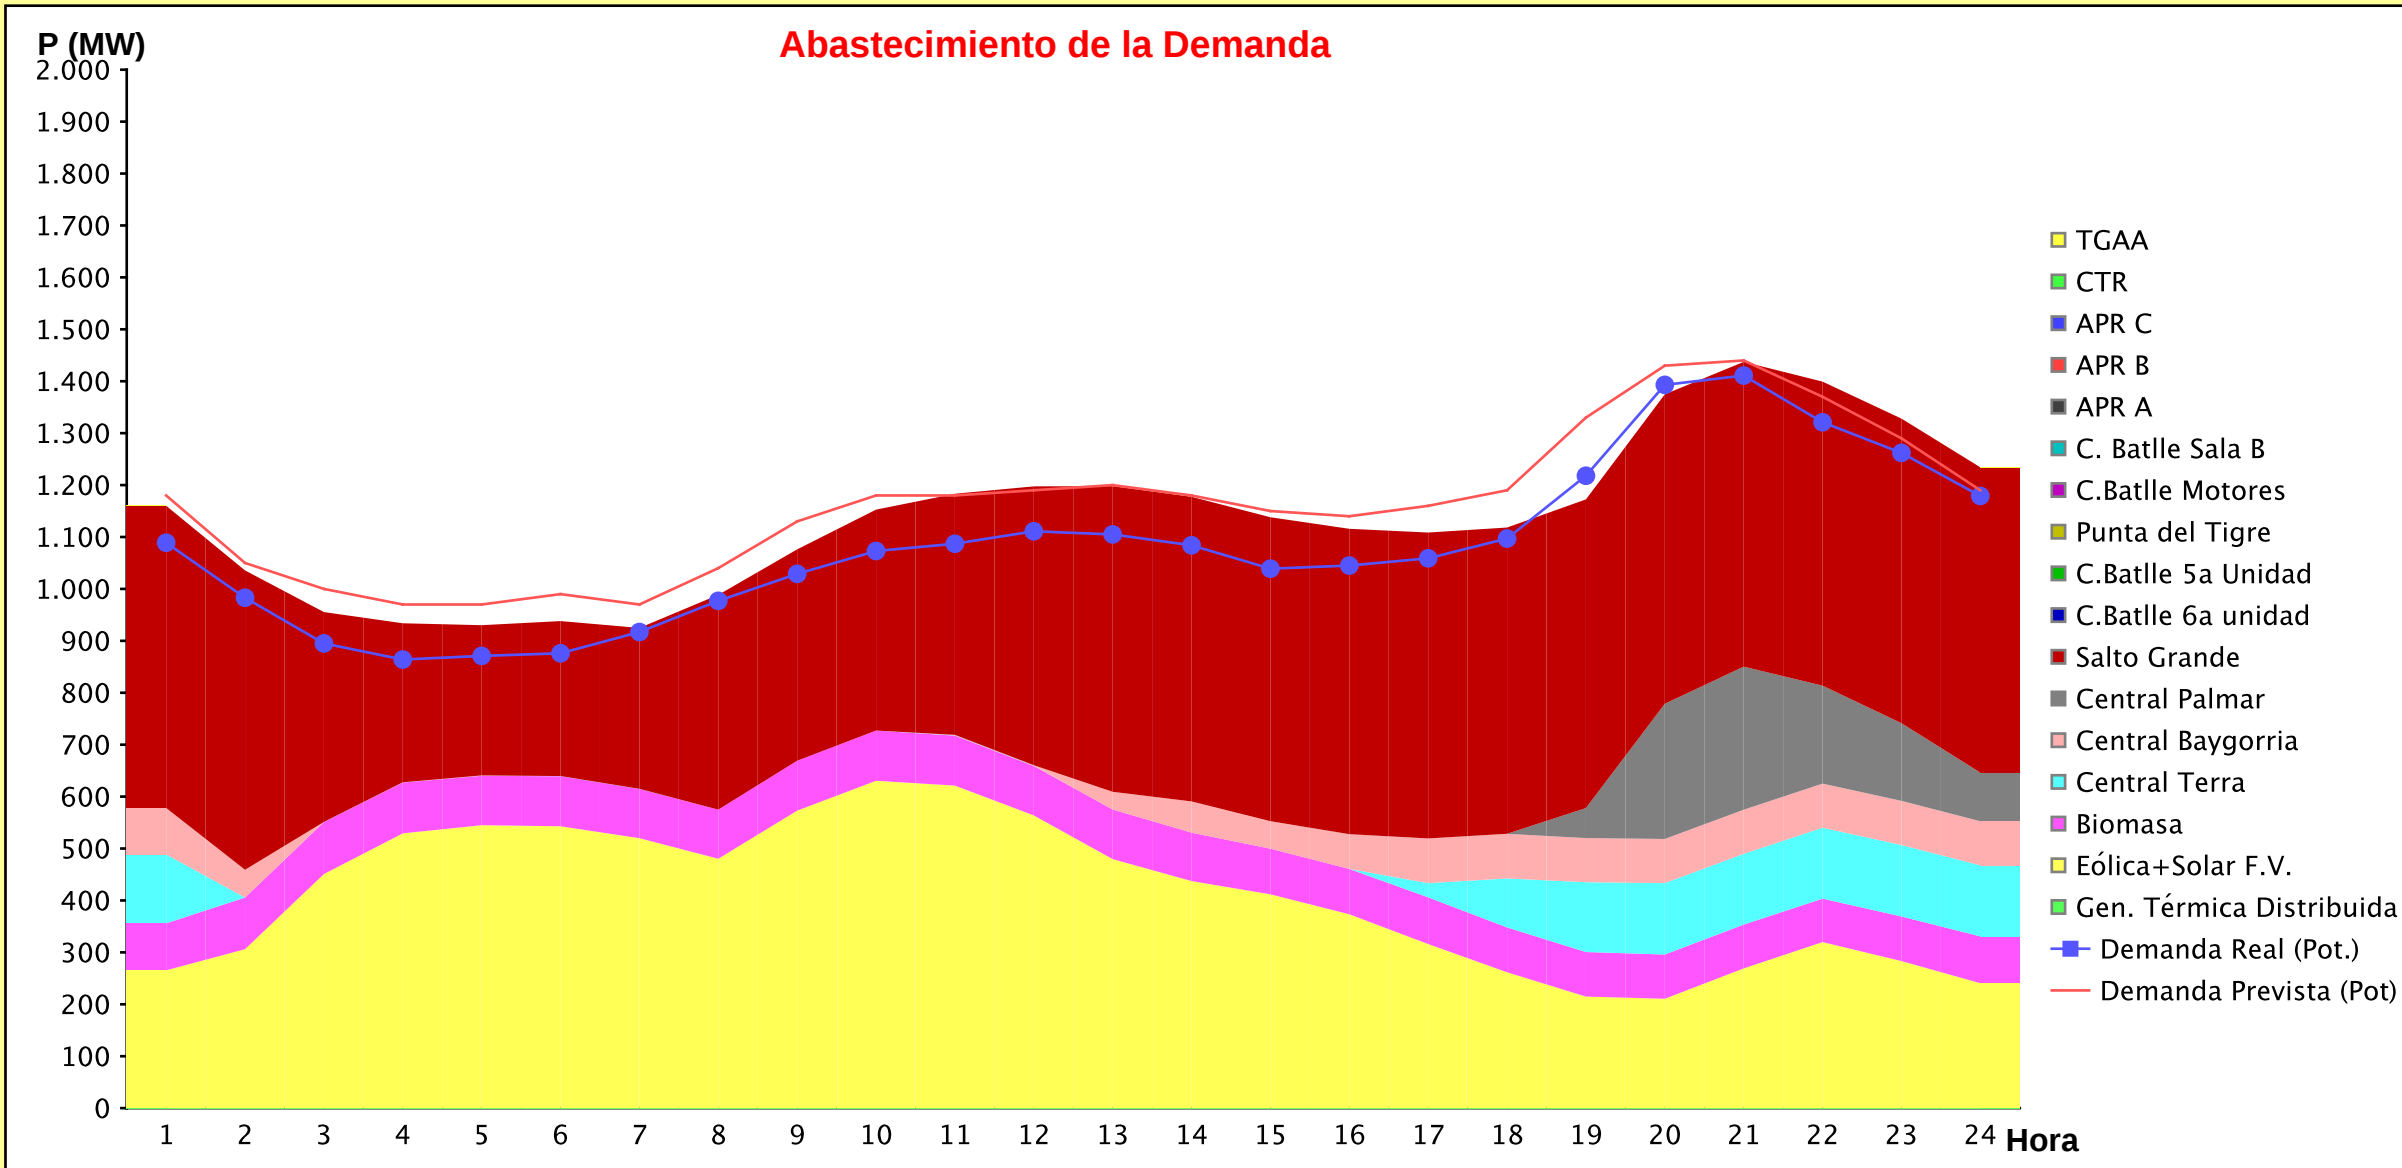

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.017
Hidráulica	12.017
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.017



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.169
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.920
Diferencia (MWh)	-751
Ejecutada - Programada	-2,69 %

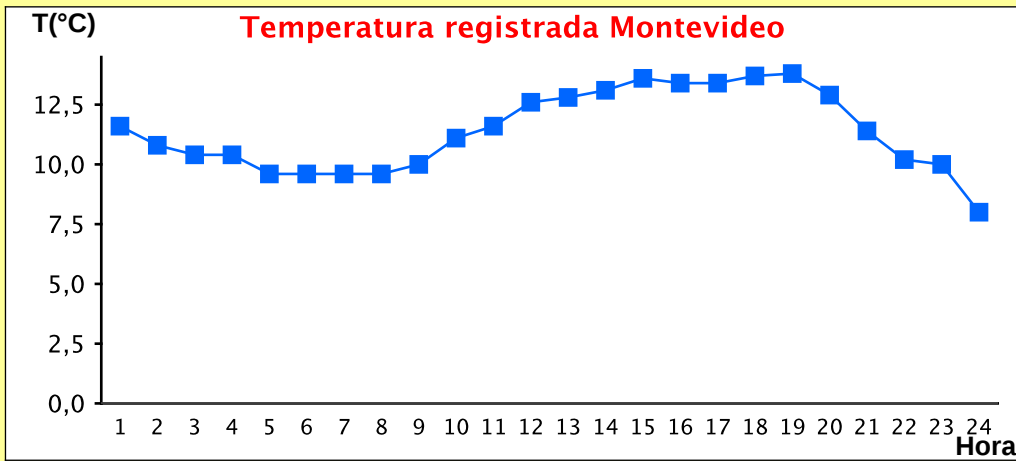


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1208 Hora 11:22
Potencia mínima:	907 Hora 06:07
Pico noche:	1463 Hora 20:29

Generación Media (MW)	
Eólica	391,7
Biomasa	93,2
Solar fotovoltaica	17,5
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

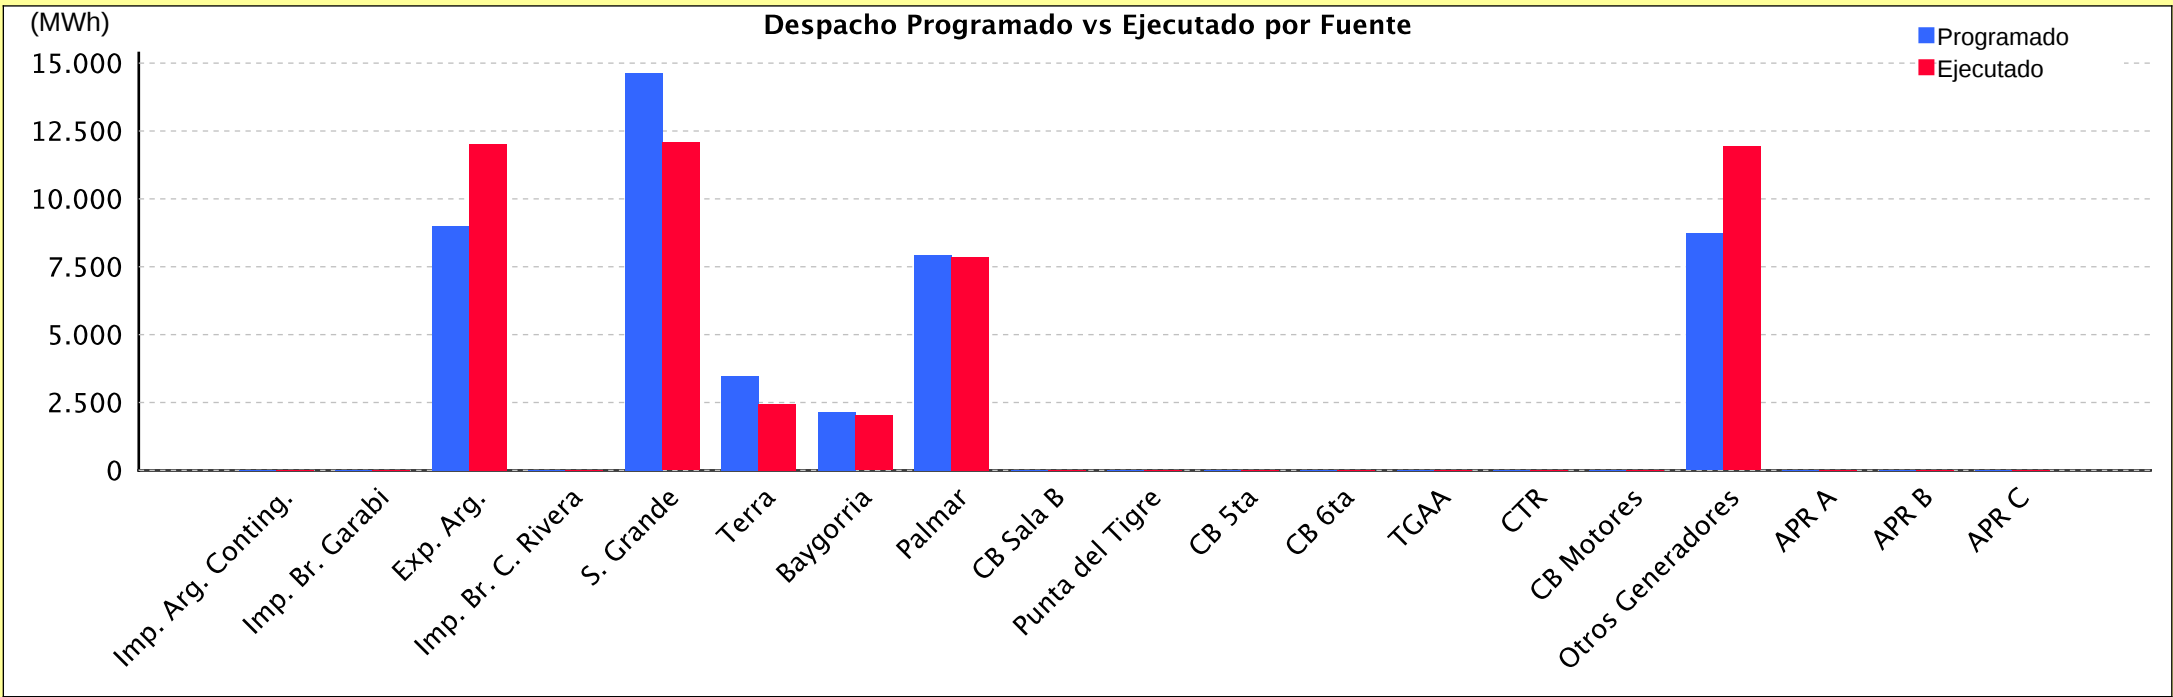
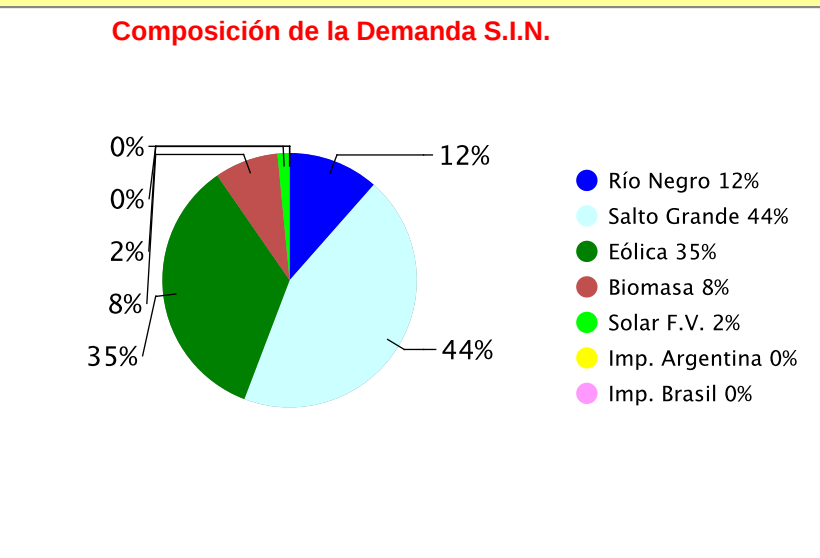


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

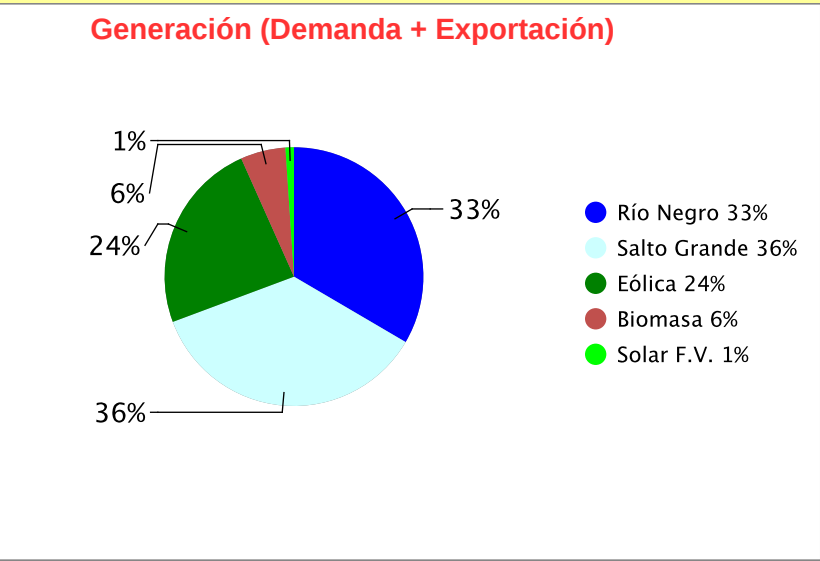



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

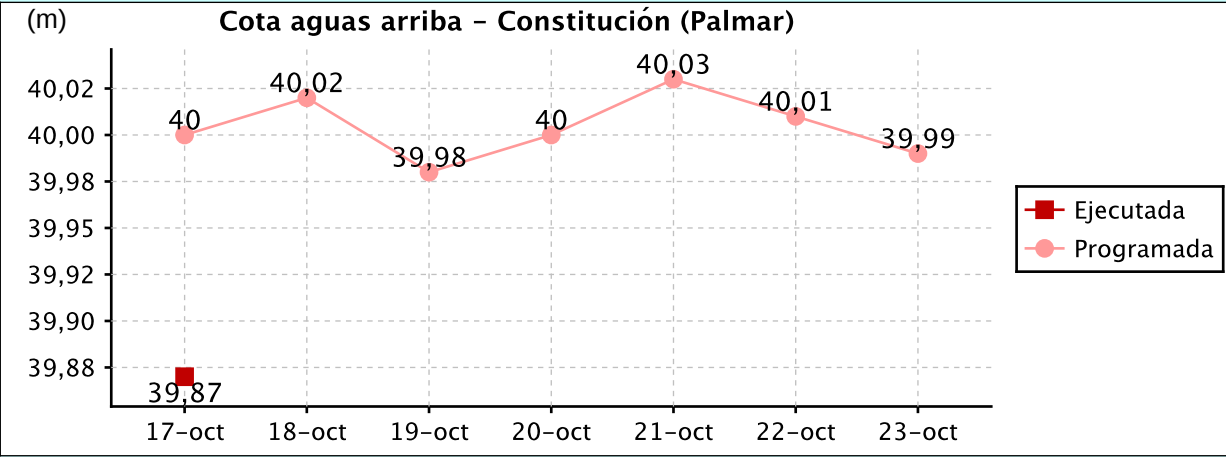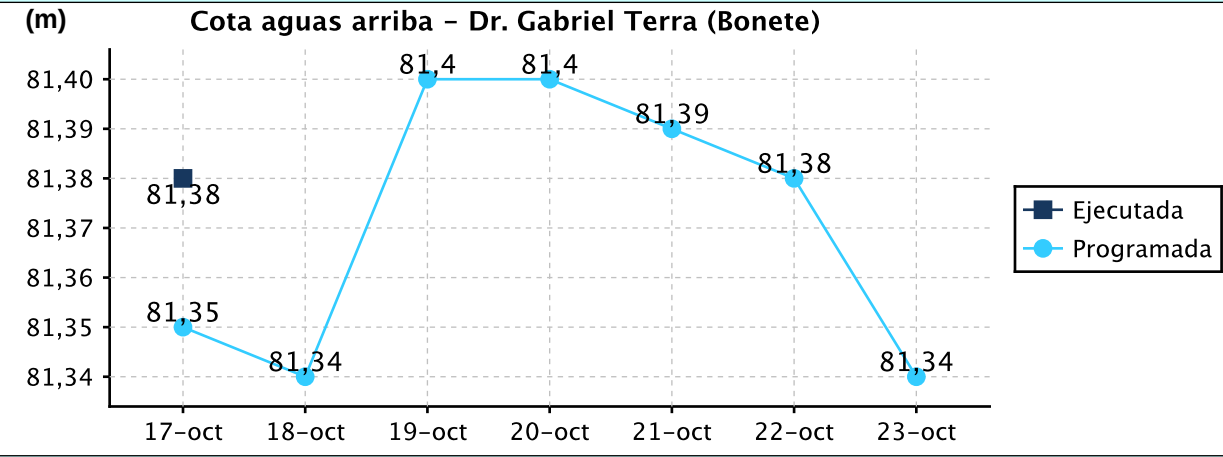


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,35	81,38
Baygorria	54,18	54,22
Palmar	40,00	39,87
SGU	33,55	33,18

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

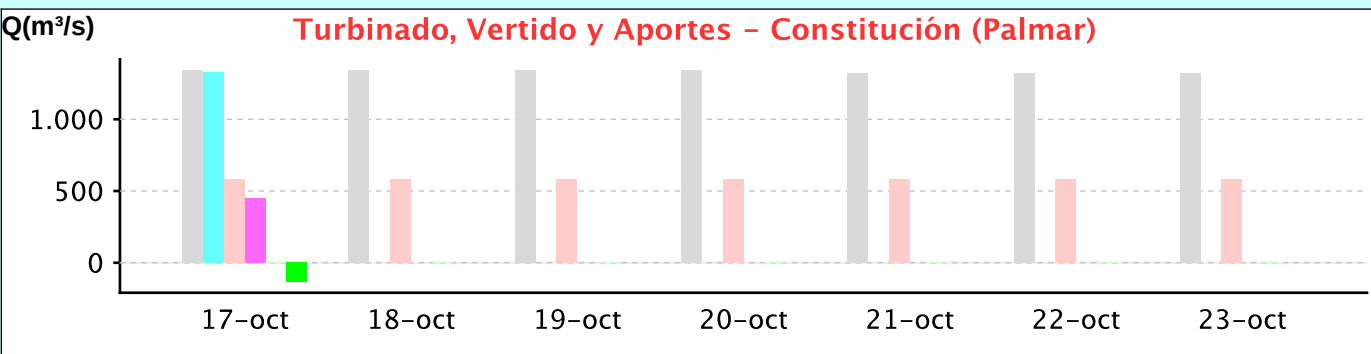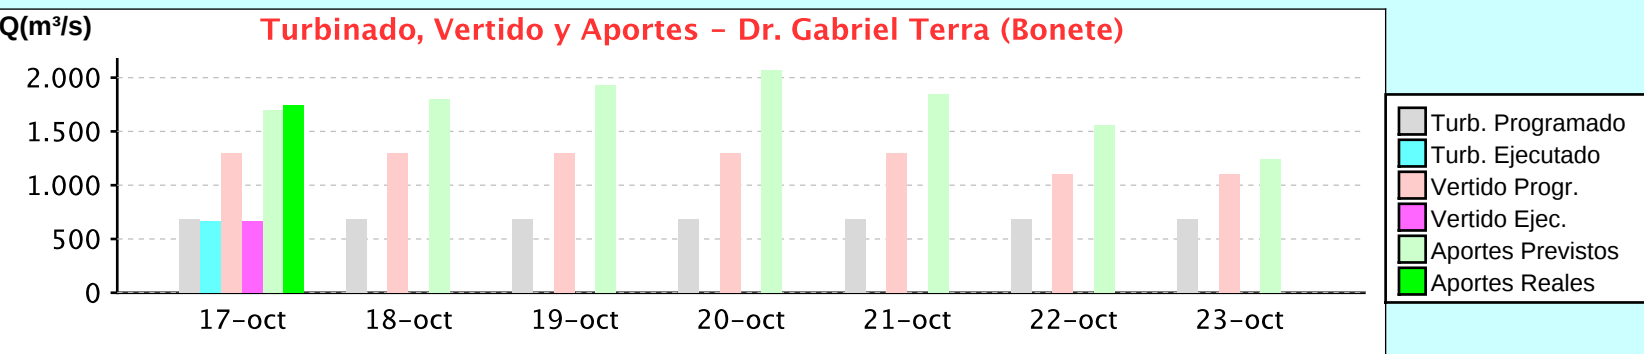

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

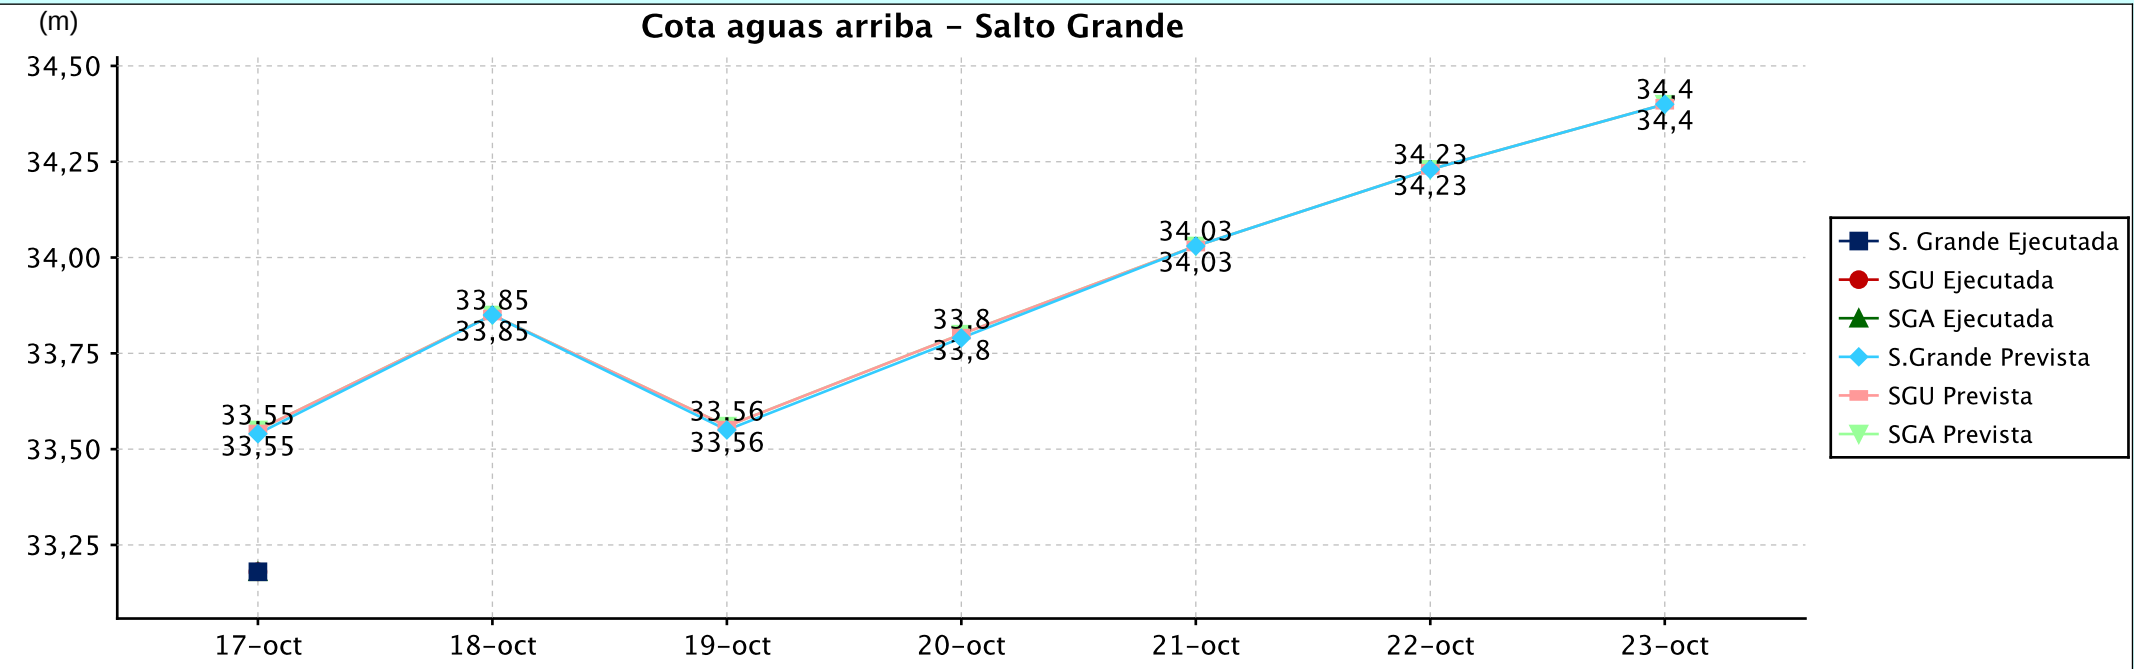


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	661
Baygorria	839	774
Palmar	1.344	1.326
SGU	3.579	3.959

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.696	1.740
Baygorria	0	680
Palmar	0	-135
SGU	10.825	10.248

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	661
Baygorria	1.100	1.264
Palmar	580	447
SGU	6.084	12.029

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

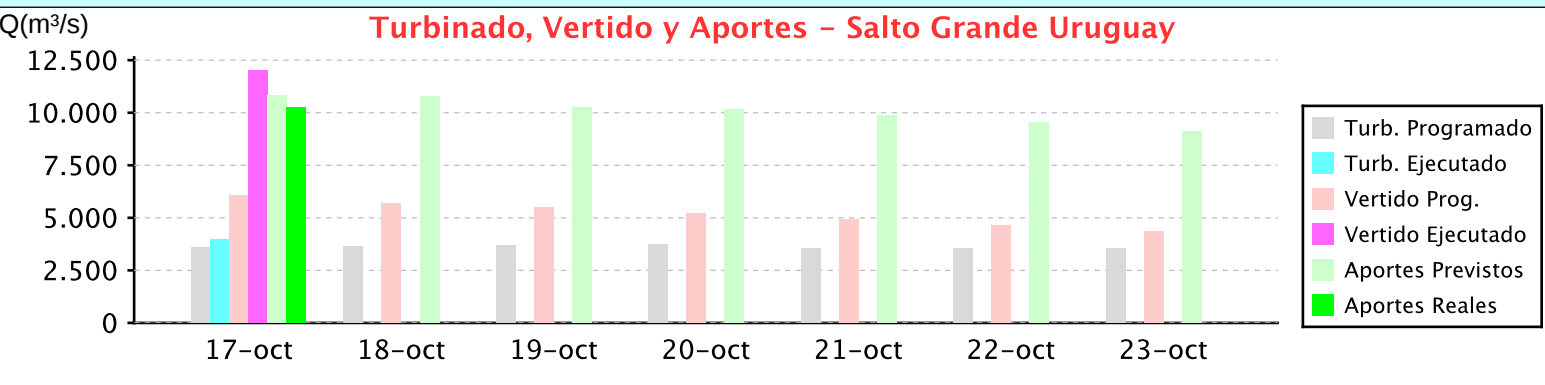

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,18
Cota Vista Arg	33,18
Cota real	33,18

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

OBSERVACIONES
