




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


lunes 19 de octubre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.019
Baygorria	2.093
Palmar	7.814
Salto Grande	14.400
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	13.003
TOTAL Generación	40.237

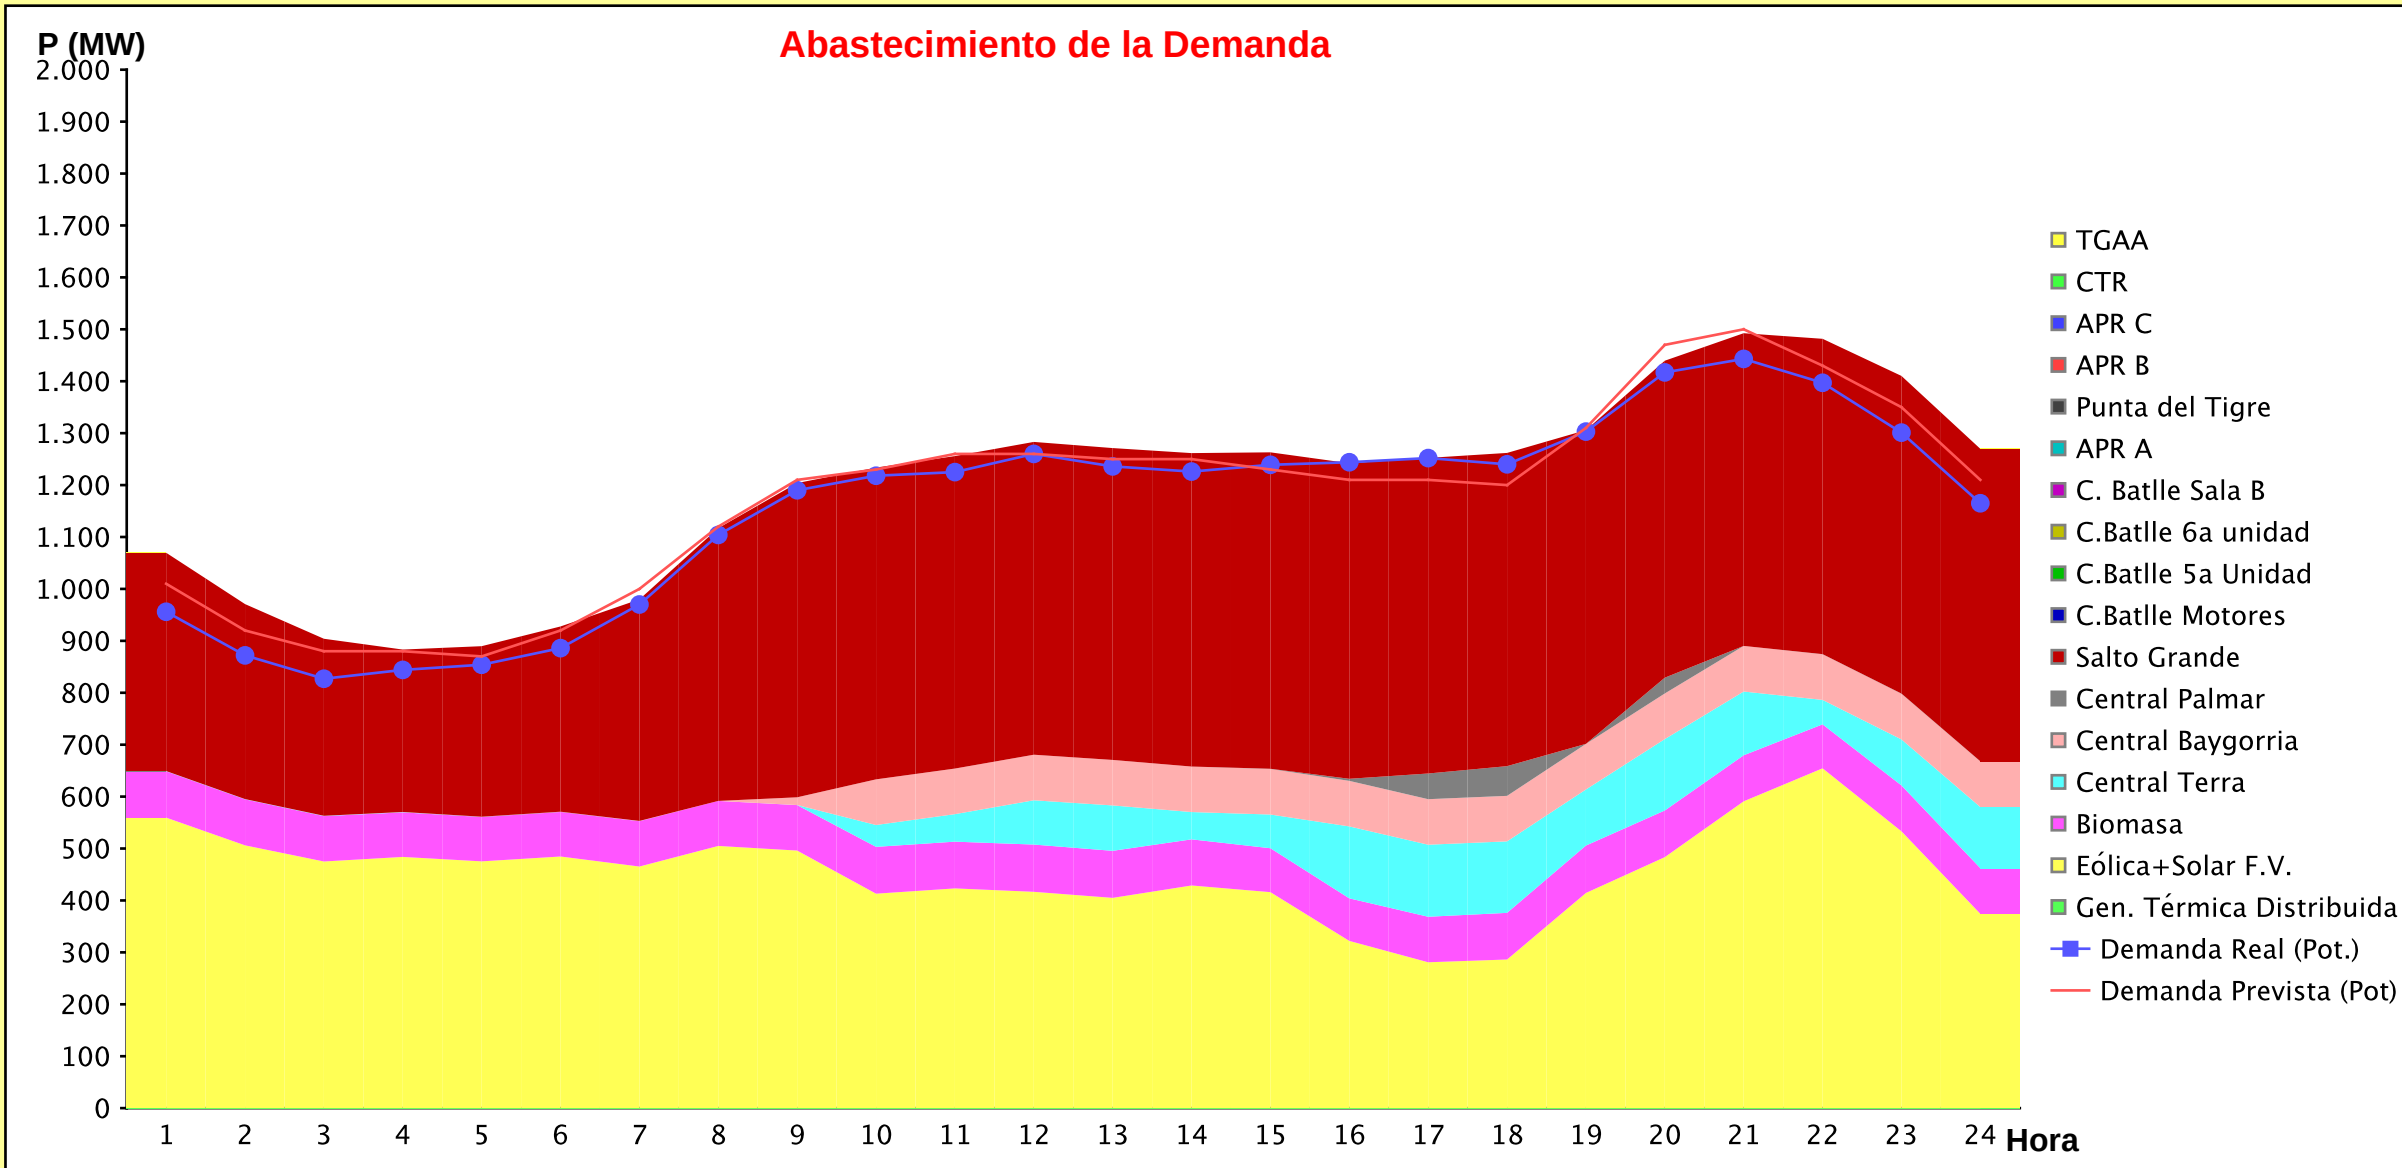




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.663
Hidráulica	11.663
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.663

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.574
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.180
Diferencia (MWh)	394
Ejecutada - Programada	1,40 %

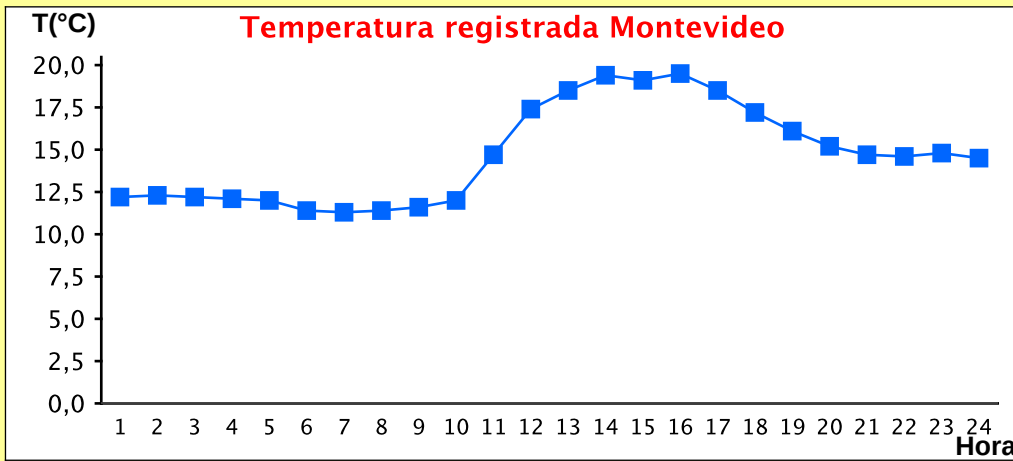



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1300 Hora 11:53
Potencia mínima:	883 Hora 04:11
Pico noche:	1534 Hora 20:58

Generación Media (MW)	
Eólica	451,7
Biomasa	88,8
Solar fotovoltaica	1,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

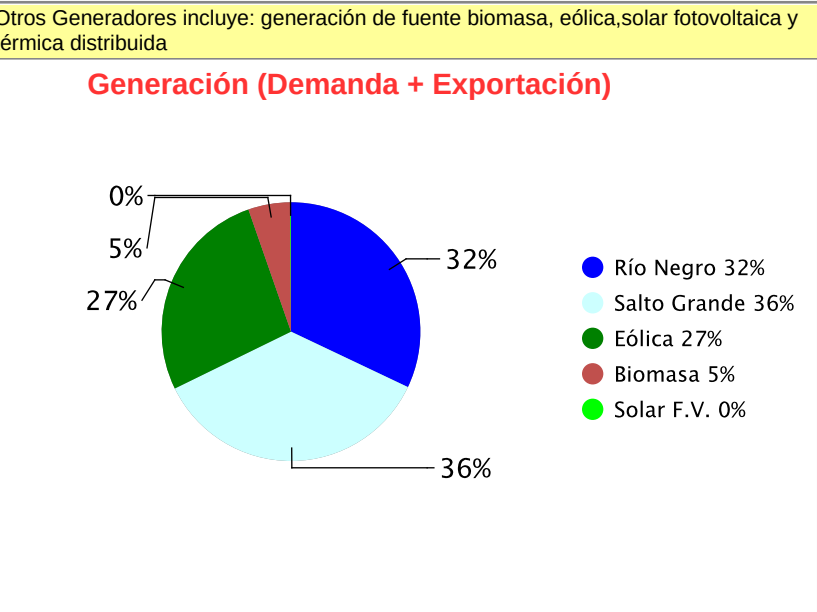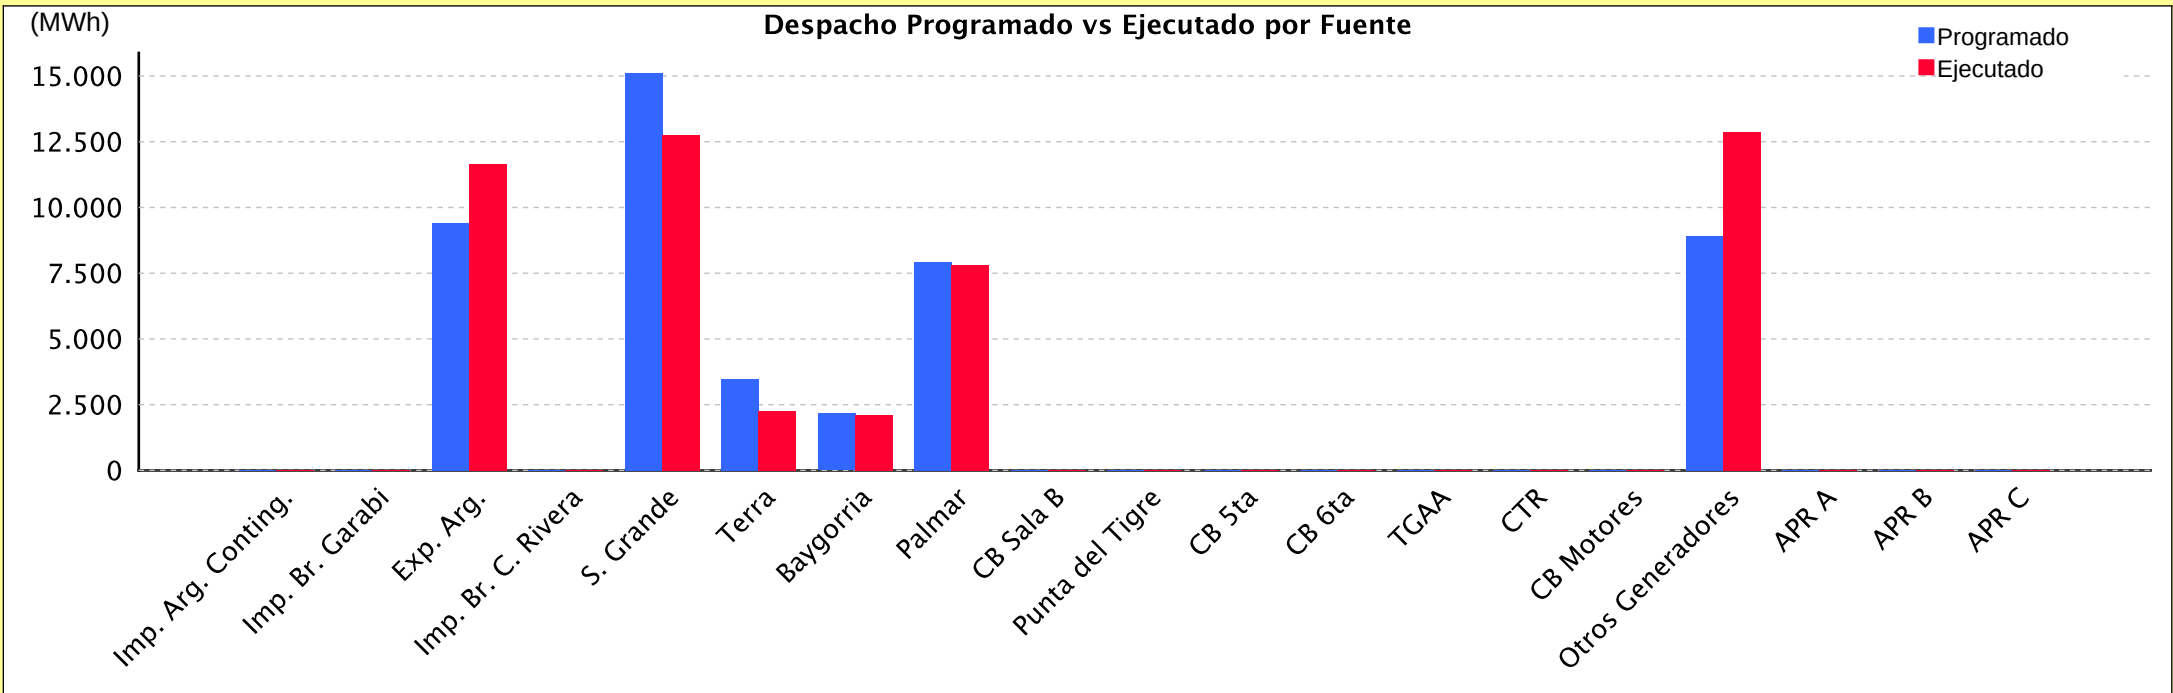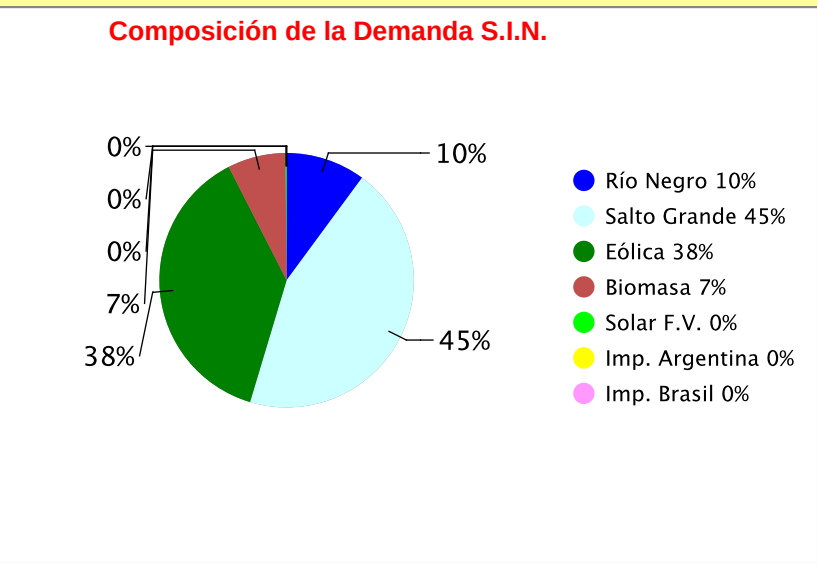



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

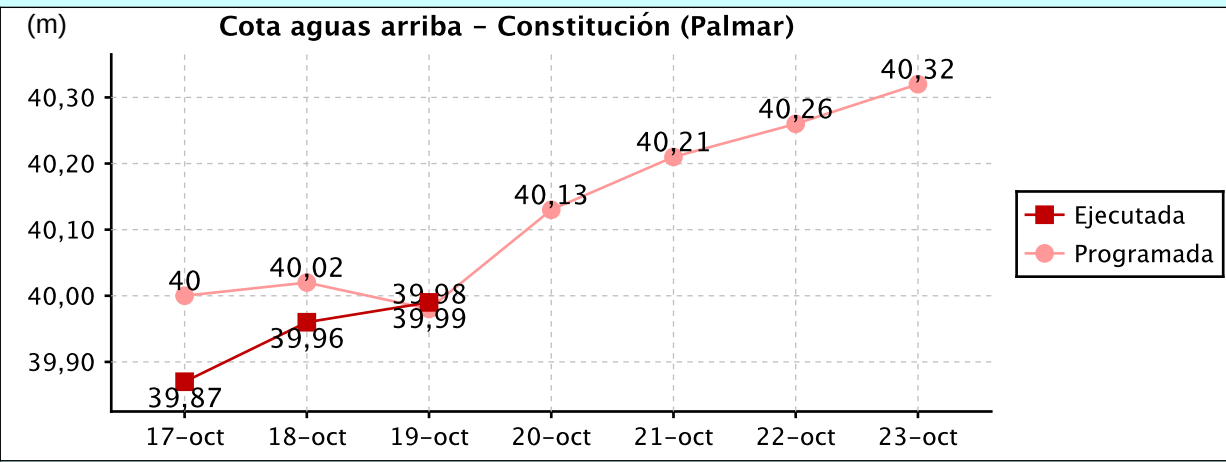
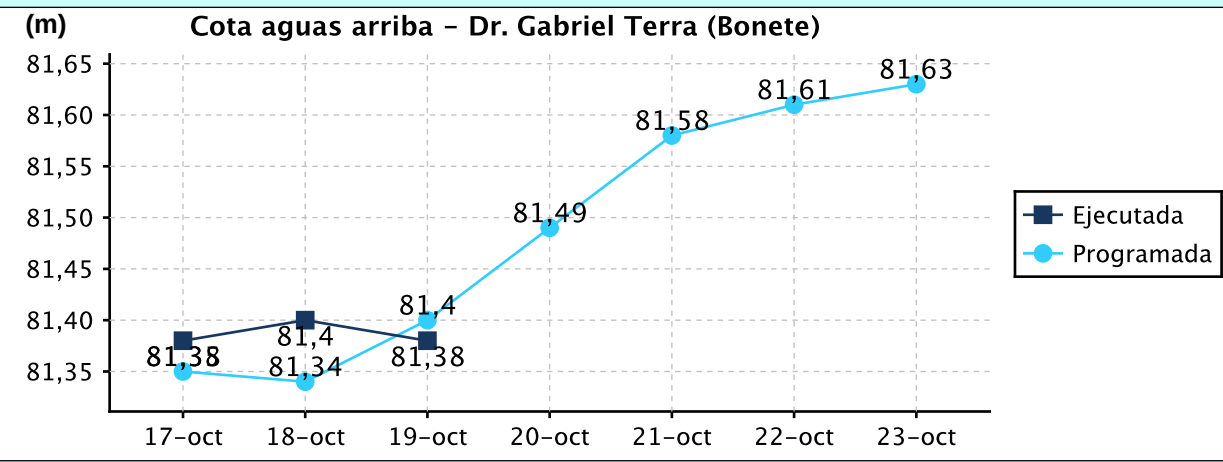


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,40	81,38
Baygorria	54,06	54,06
Palmar	39,98	39,99
SGU	33,56	33,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

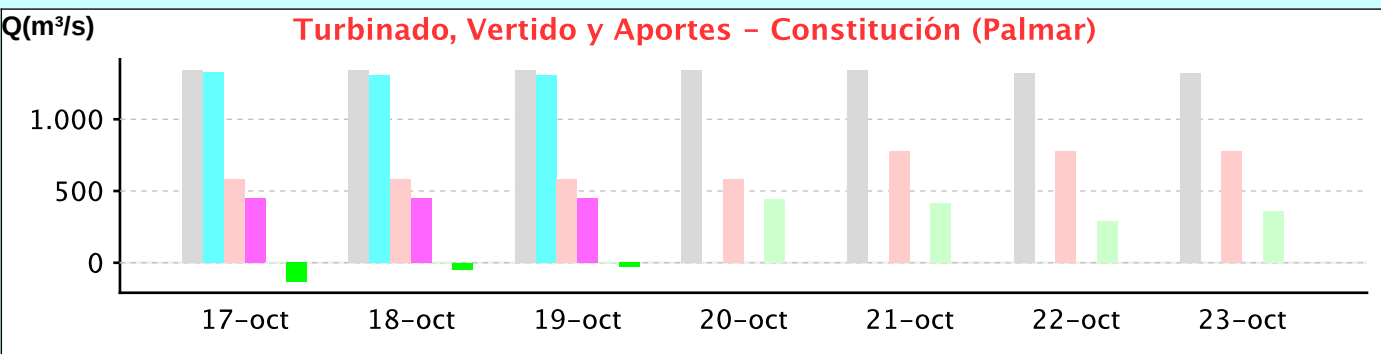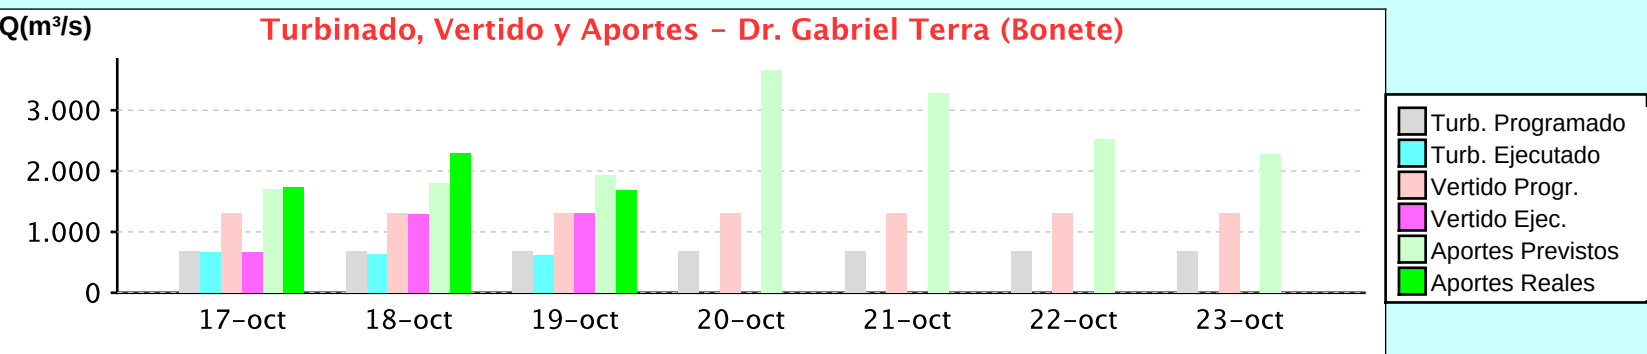

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

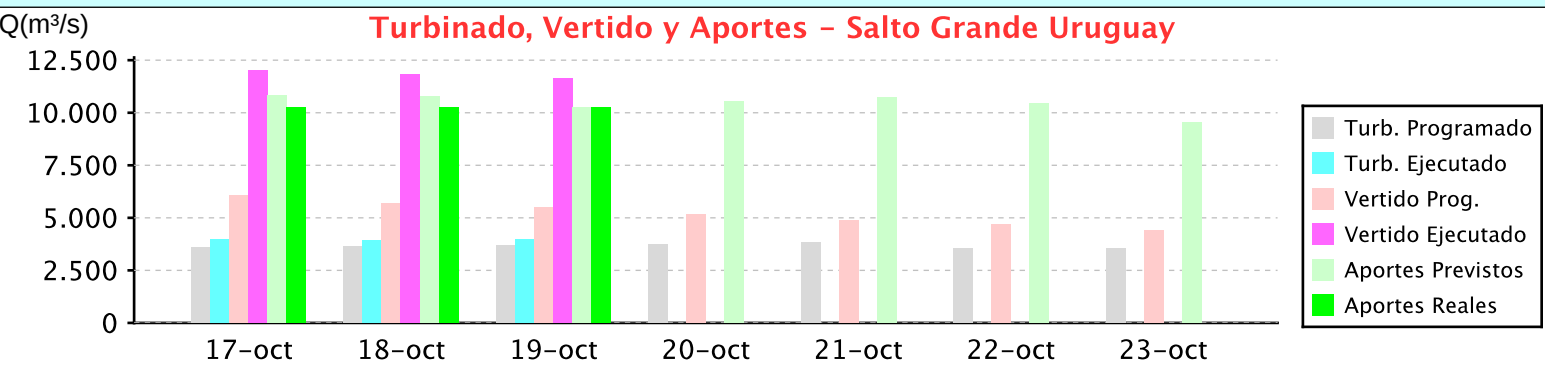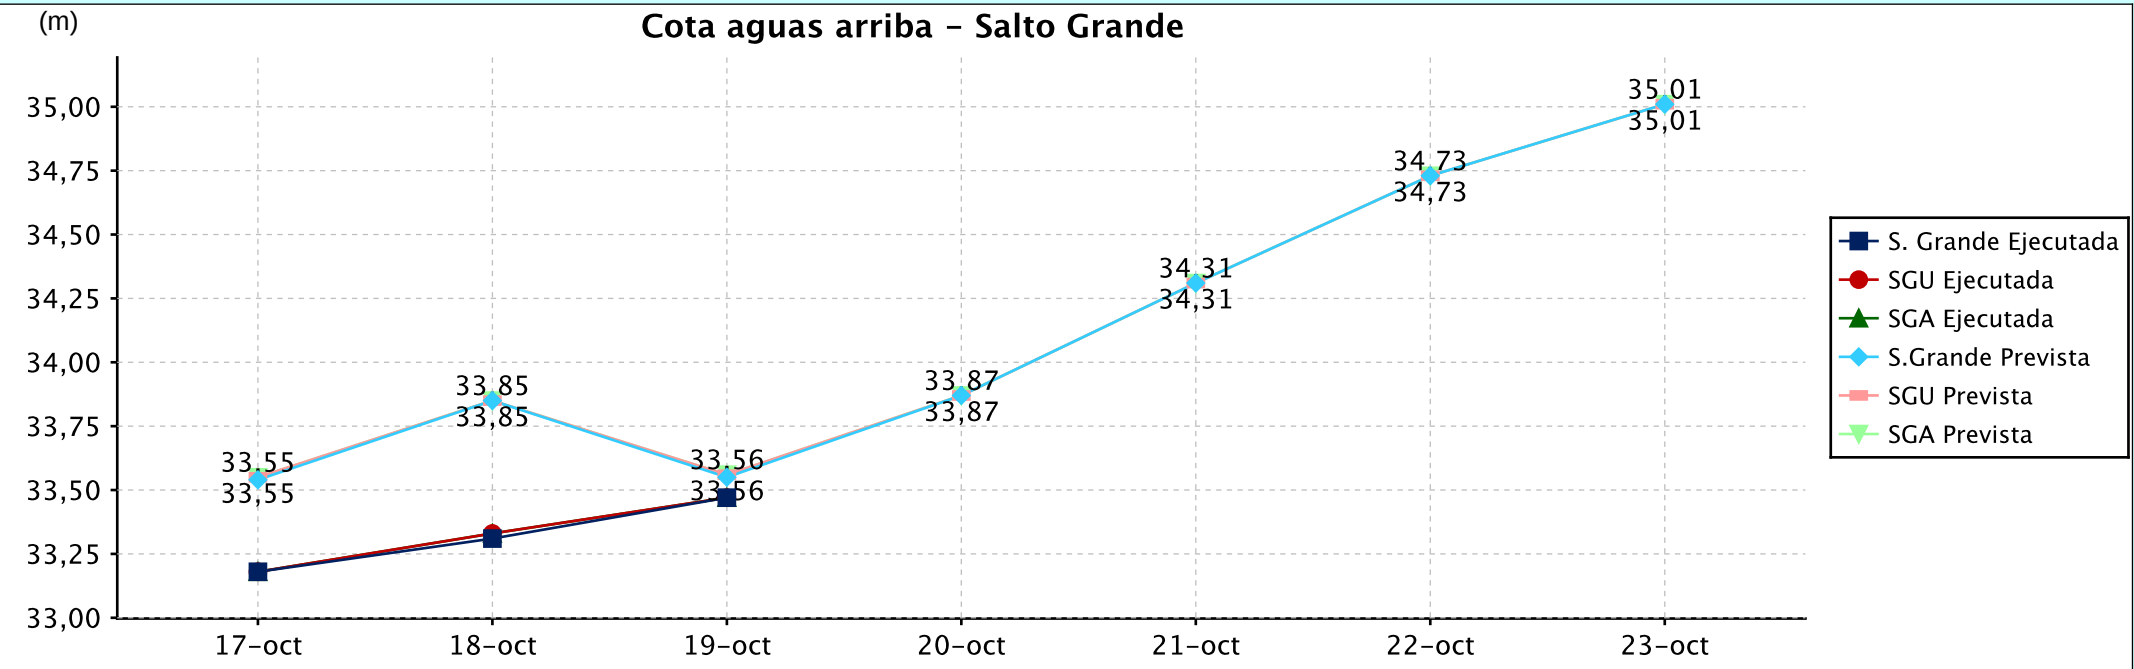

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,47
Cota Vista Arg	33,47
Cota real	33,47

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	609
Baygorria	839	823
Palmar	1.344	1.306
SGU	3.696	3.994

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.928	1.688
Baygorria	0	27
Palmar	0	-30
SGU	10.245	10.230

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.300	1.300
Baygorria	1.100	1.102
Palmar	580	450
SGU	5.492	11.614

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
