INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N. — **miércoles 15 de enero de 2014**

Generación Térmica	
Central Batlle	**3.610**
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.236
Motores	1.378
Central La Tablada	**0**
Central P. del Tigre	**2.740**
APR A	**748**
APR B	**685**
APR C	**1.003**
Aggreko	**-2**
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	**0**
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	**3.228**
C. Baygorria	**1.904**
C. Palmar	**7.125**
C. Salto Grande	**13.512**
Importación (MWh)	
Argentina	**0**
Contingente	0
Brasil	**0**
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	**1.958**
TOTAL Generación	**36.512**

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	**5.164**
Hidráulica	0
Térmica	5.164
Exportación a Brasil	**0**
TOTAL Exportación (MWh)	**5.164**

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	**31.348**

(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh)	**31.530**
Diferencia (MWh)	-182
Ejecutada - Programada	-0,58 %

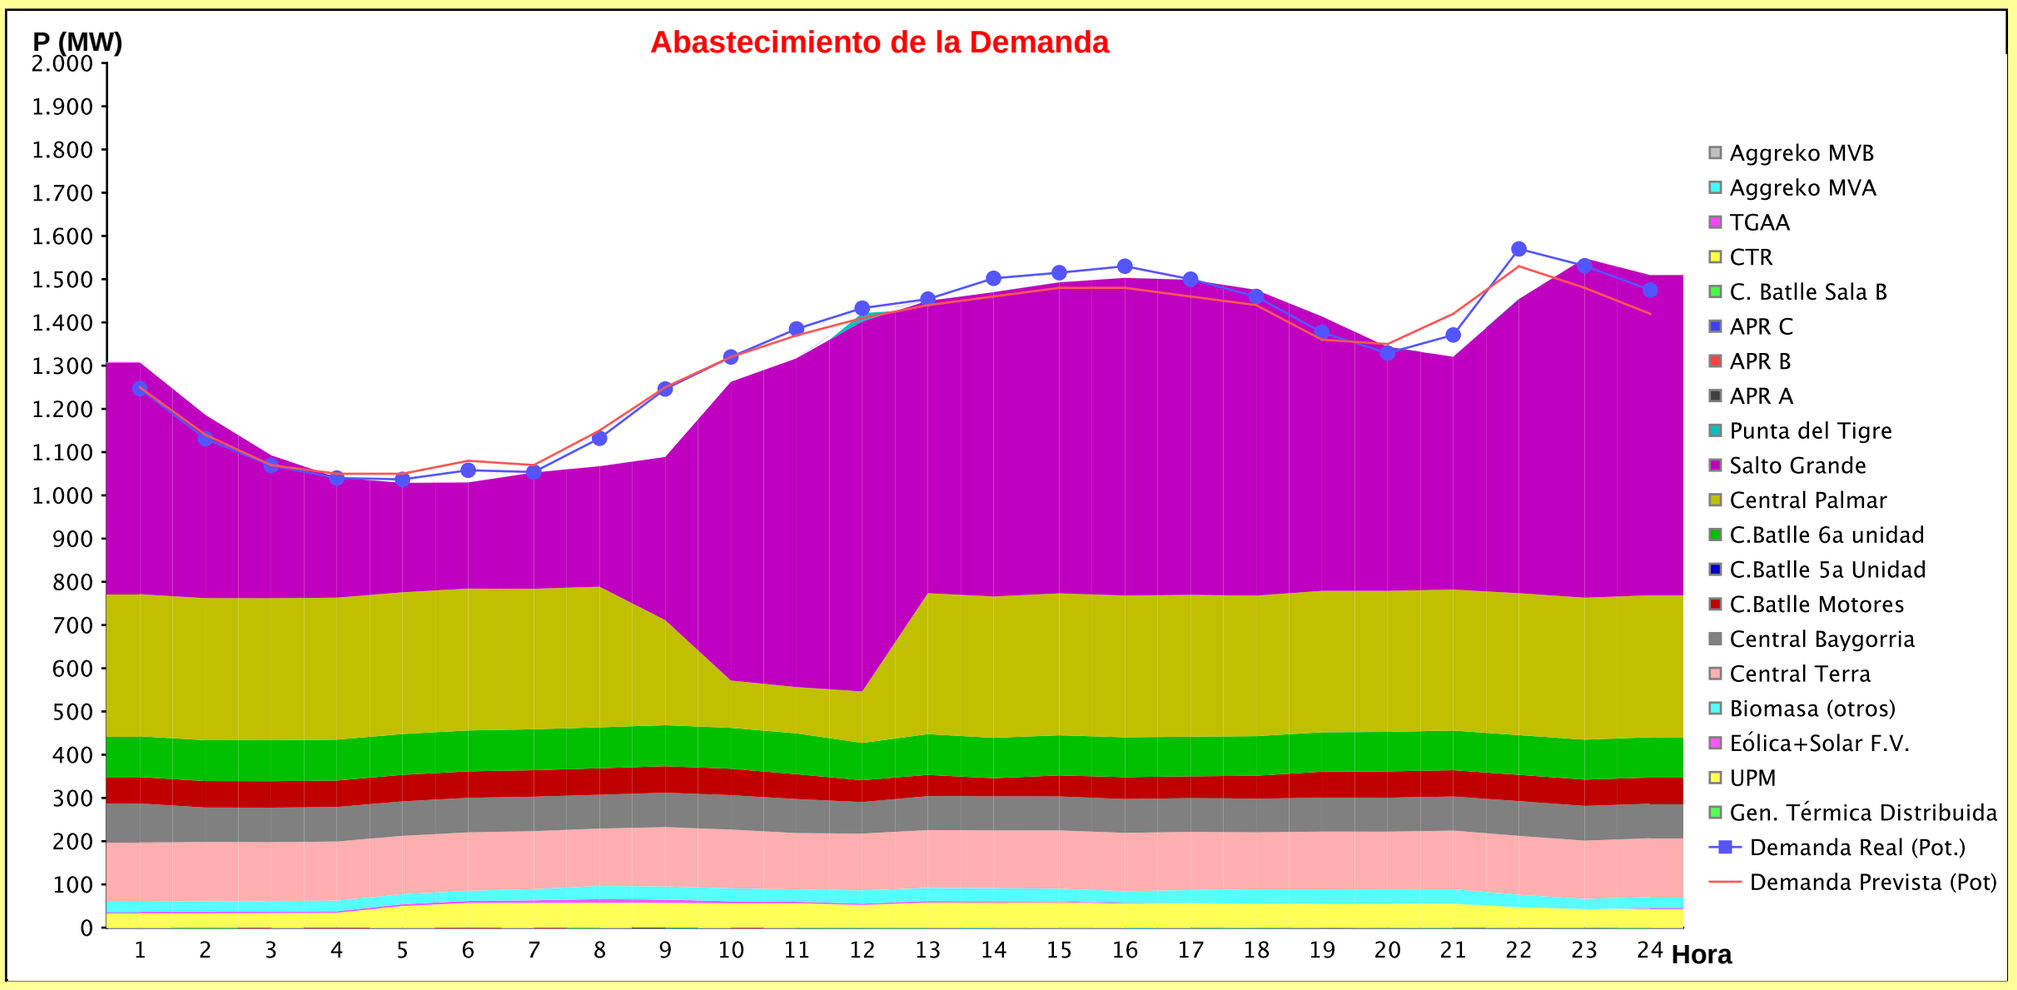

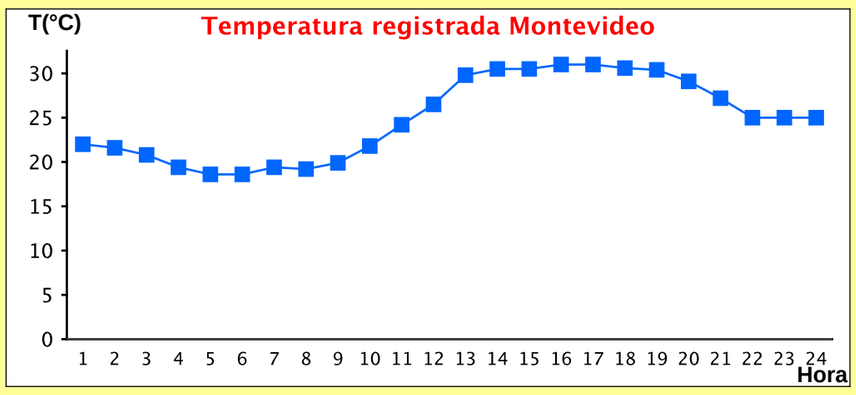

Picos de Potencia (MW)		
Pico mediodia:	1535,77	Hora 15:52
Potencia minima:	1037,35	Hora 04:57
Pico noche:	1577,45	Hora 22:09

Generación Media (MW)	
Eólica	3,7
Biomasa	86,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

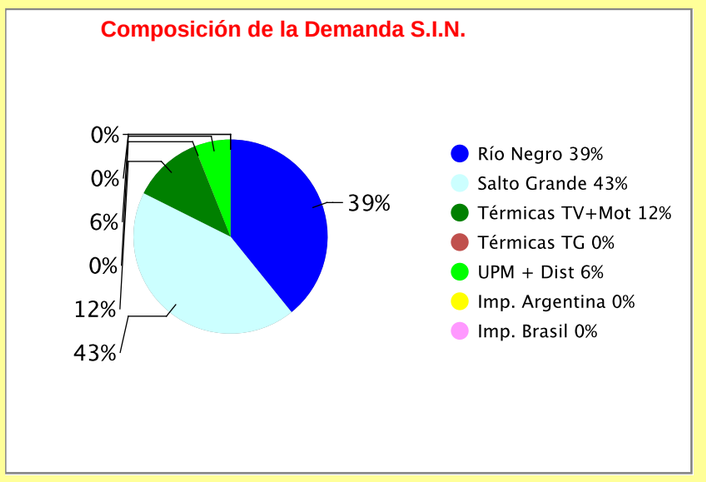

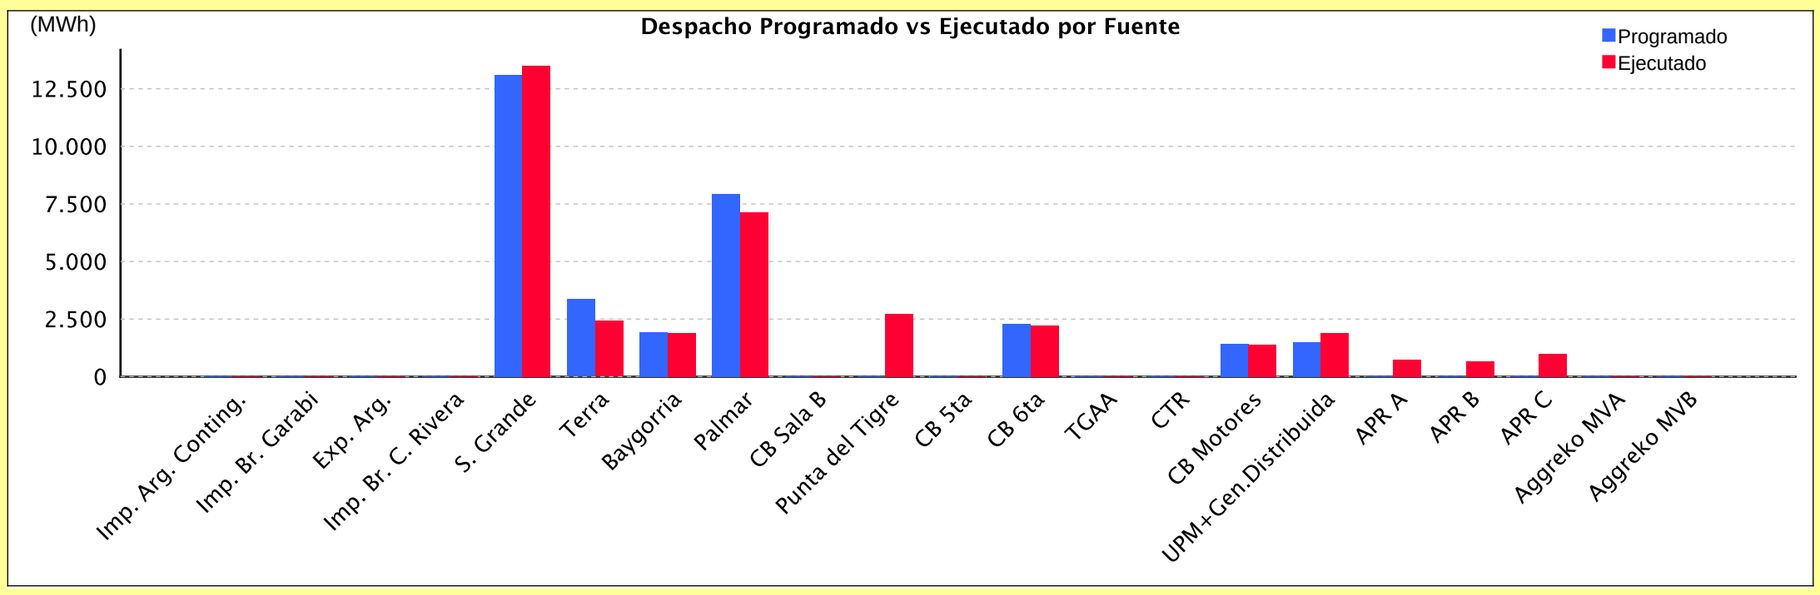

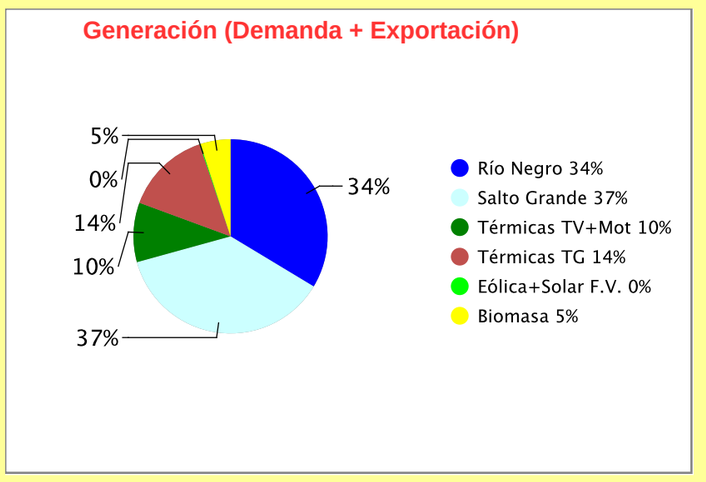

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

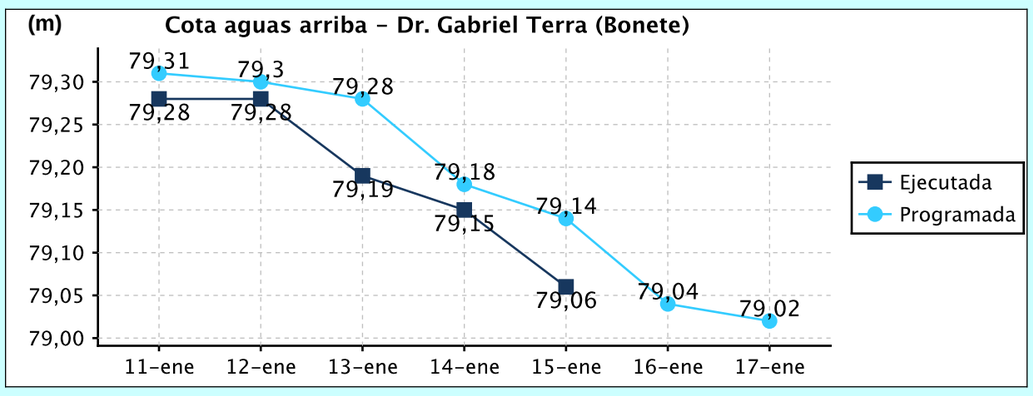

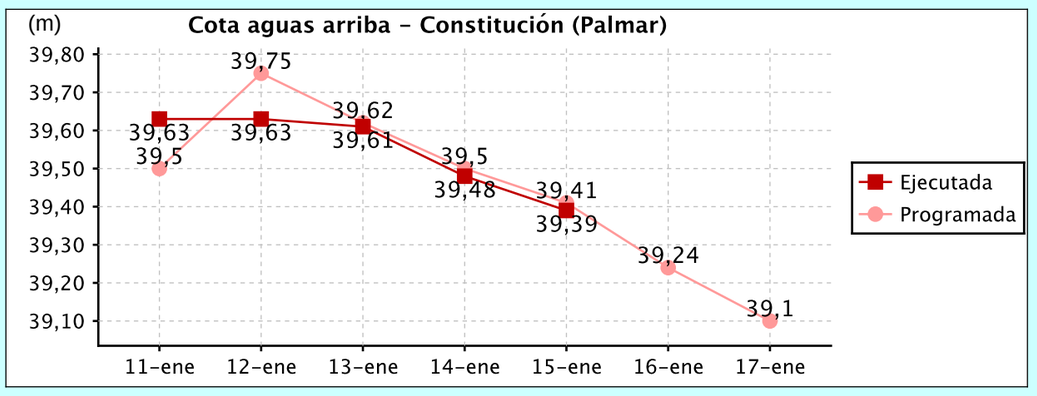

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,14	79,06
Baygorria	53,79	53,81
Palmar	39,41	39,39
SGU	34,98	35,02

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

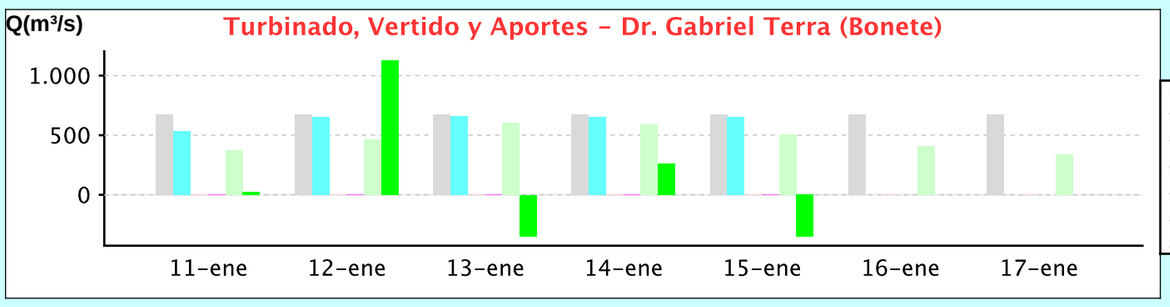

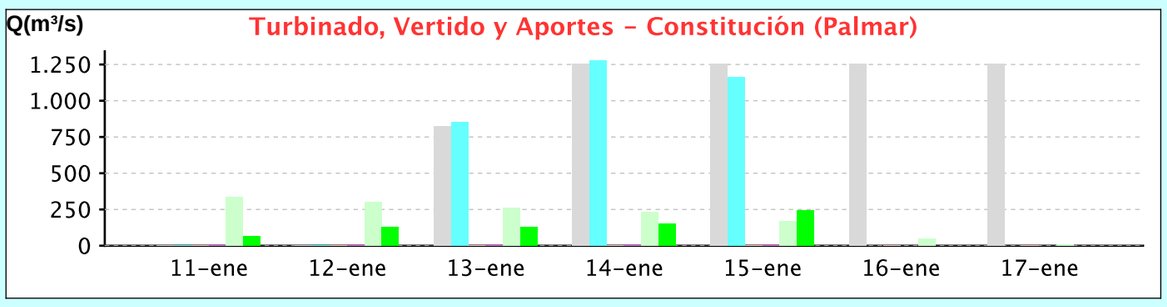

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

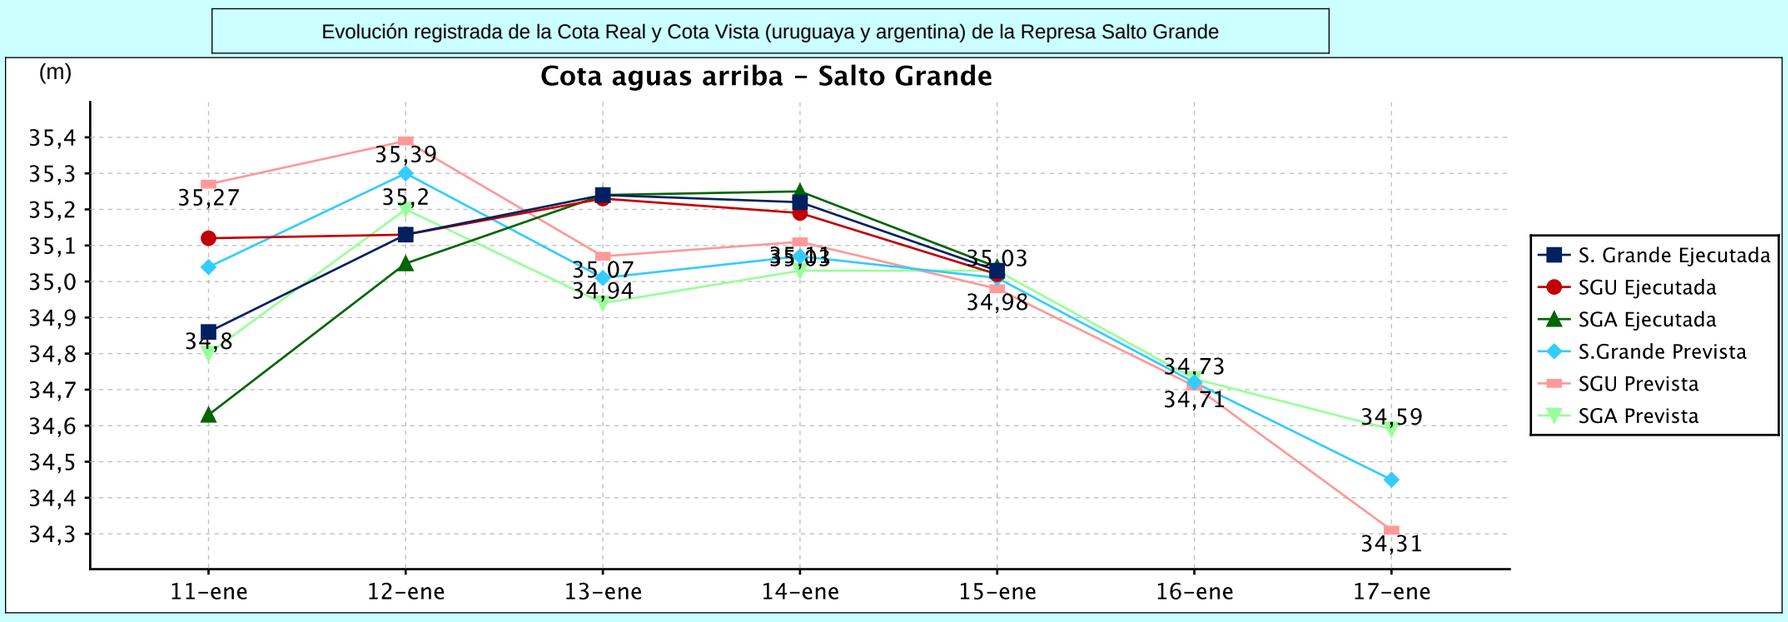

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	656
Baygorria	631	665
Palmar	1.252	1.162
SGU	2.483	2.513

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	507	-353
Baygorria	0	24
Palmar	169	244
SGU	1.875	1.869

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

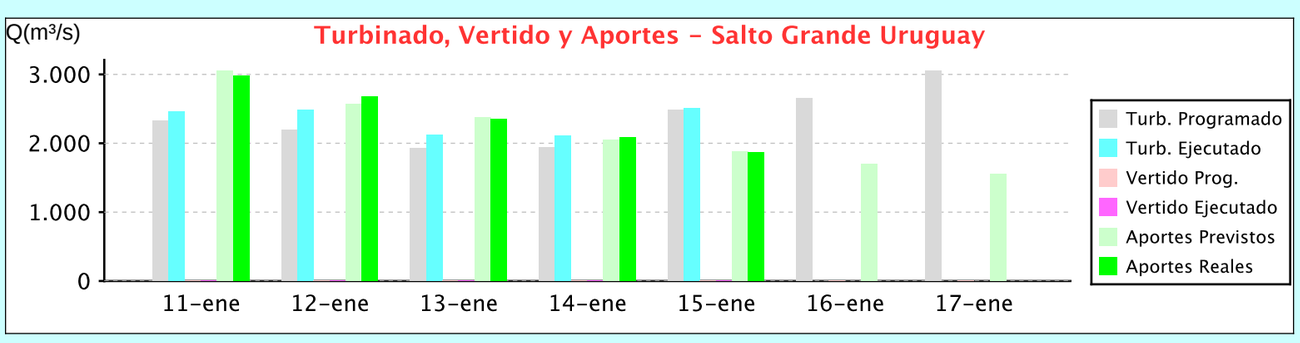

VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,02
Cota Vista Arg	35,04
Cota real	35,03

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-346

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

17/01/2014 16:50
