INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N. — **sábado 24 de enero de 2015**

Generación Térmica	
Central Batlle	**-8**
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-4
Central La Tablada	**-78**
Central P. del Tigre	**-3**
APR A	**-2**
APR B	**-2**
APR C	**-0**
Aggreko	**-1**
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	**0**
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	**3.406**
C. Baygorria	**2.424**
C. Palmar	**7.226**
C. Salto Grande	**18.118**
Importación (MWh)	
Argentina	**0**
Contingente	0
Brasil	**0**
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	**4.523**
TOTAL Generación	**35.603**

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	**7.318**
Hidráulica	7.318
Térmica	0
Exportación a Brasil	**0**
TOTAL Exportación (MWh)	**7.318**

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.285

(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh)	29.990
Diferencia (MWh)	-1.705
Ejecutada - Programada	-5,68 %

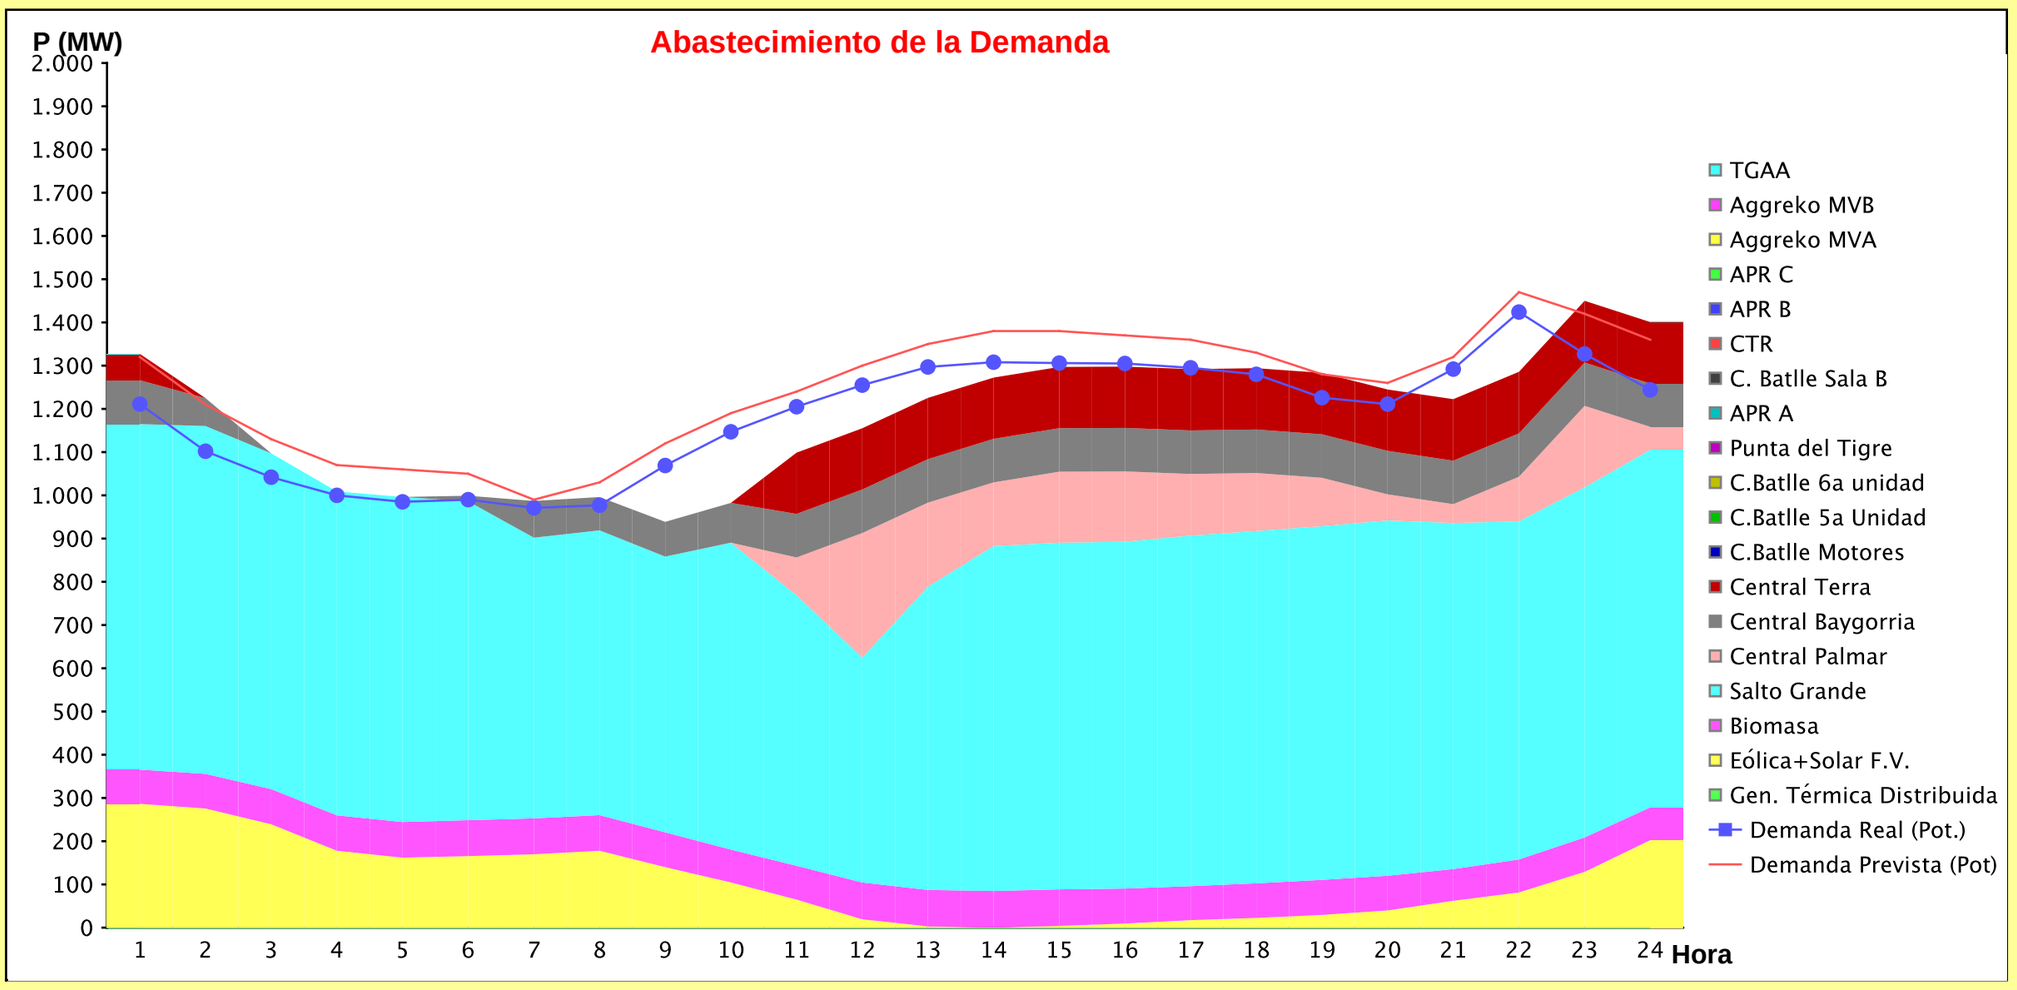

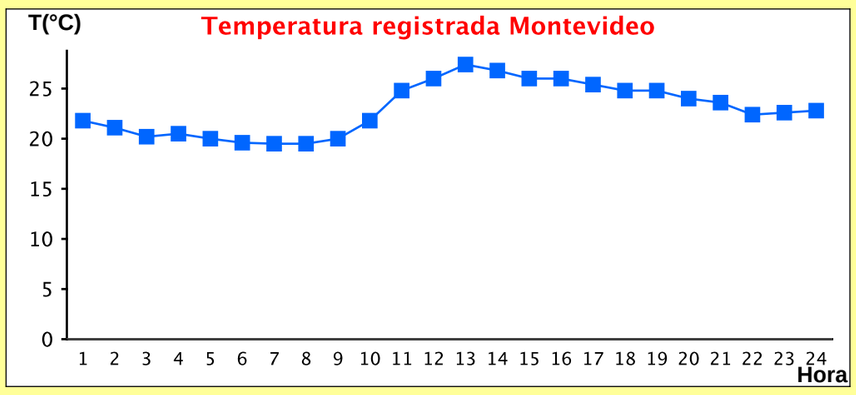

Picos de Potencia (MW)		
Pico mediodia:	1313,49	Hora 14:05
Potencia minima:	950,22	Hora 07:12
Pico noche:	1436,73	Hora 21:50

Generación Media (MW)	
Eólica	108,3
Biomasa	80,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

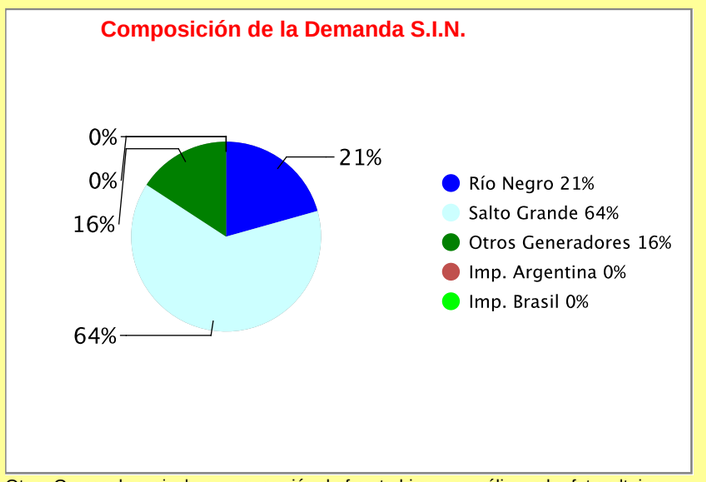

Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

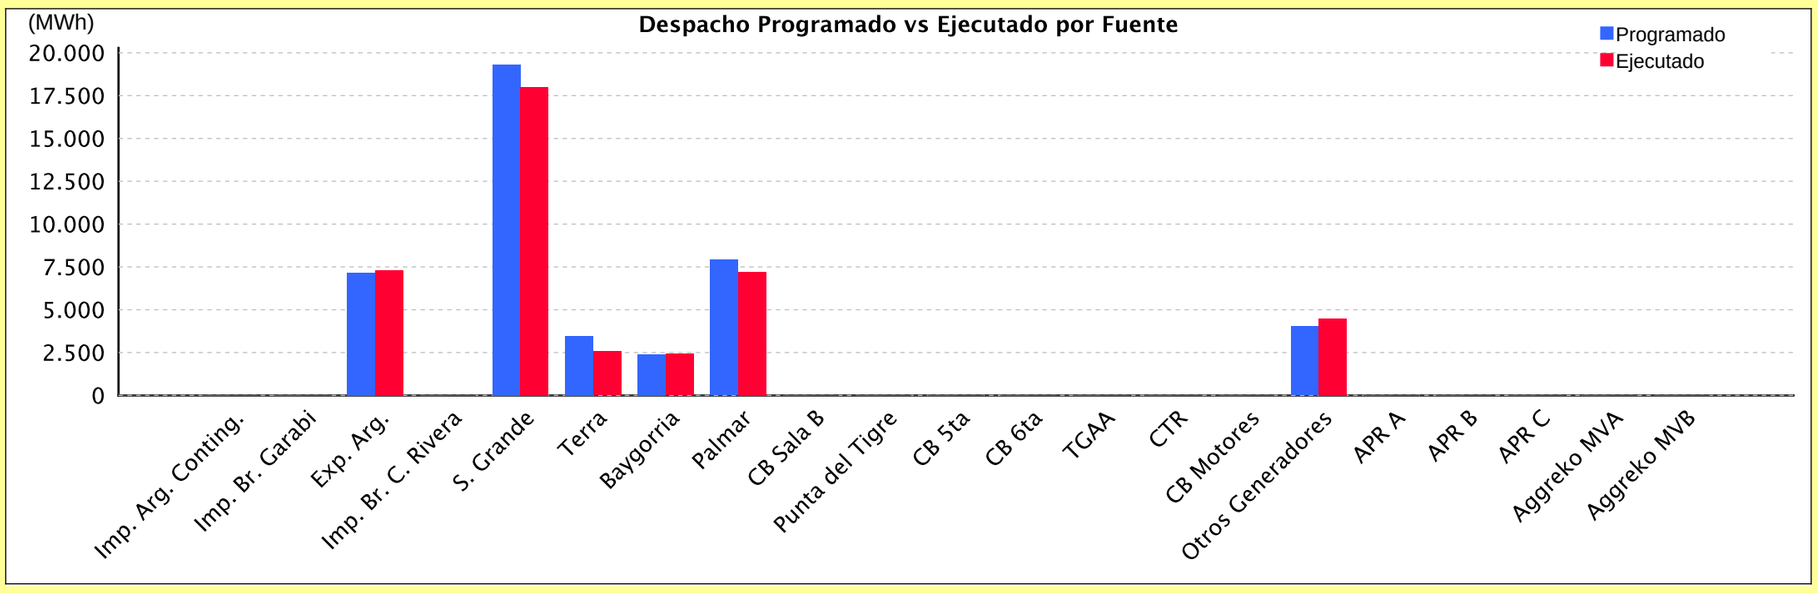

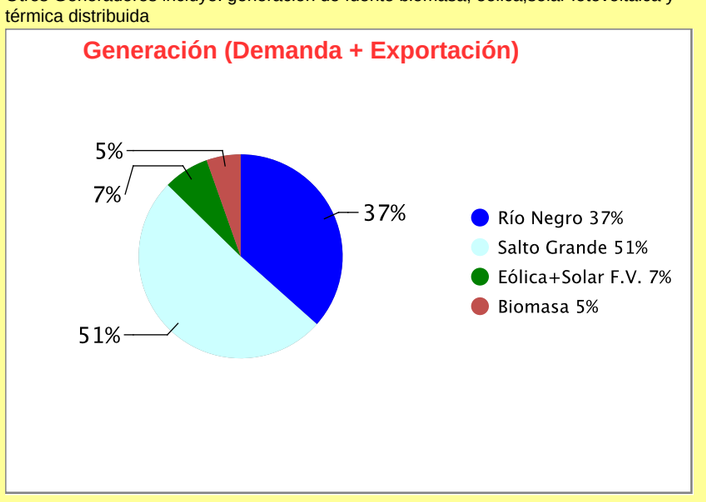

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

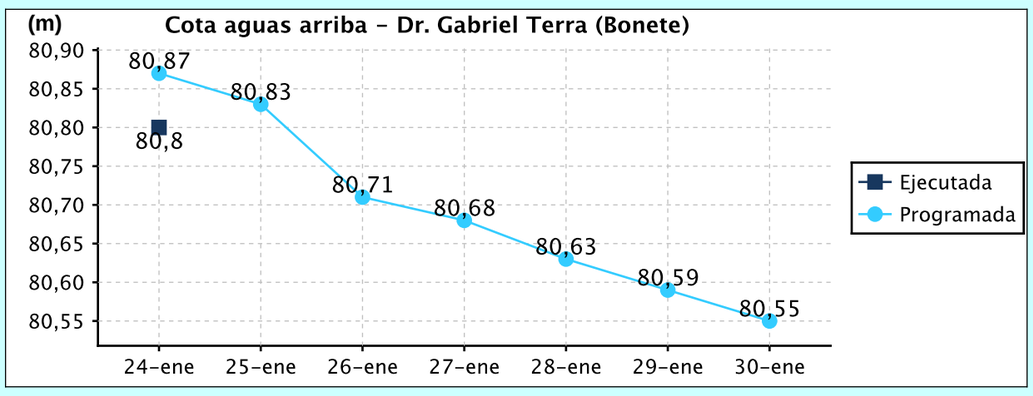

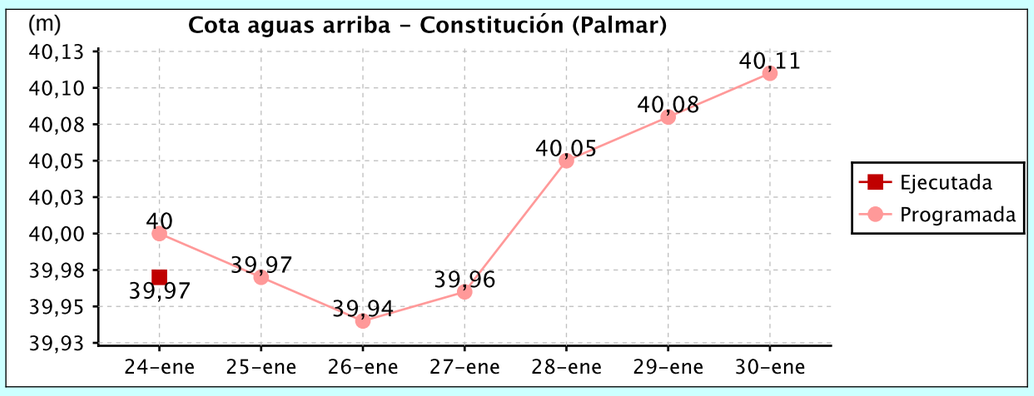

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,87	80,8
Baygorria	54,16	54,23
Palmar	40,00	39,97
SGU	35,01	35,05

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

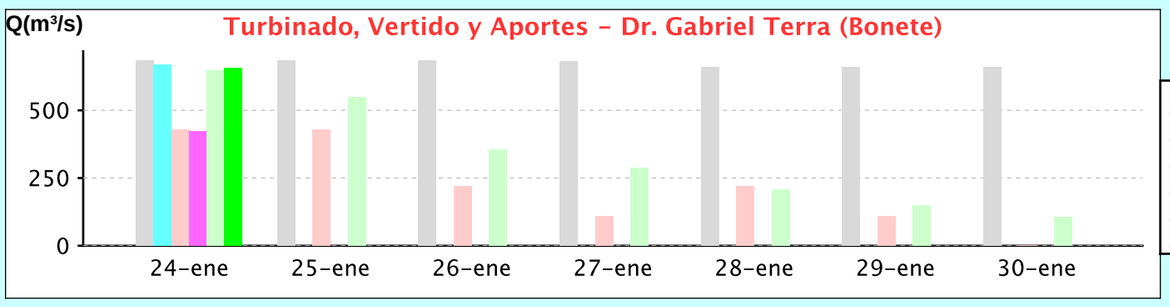

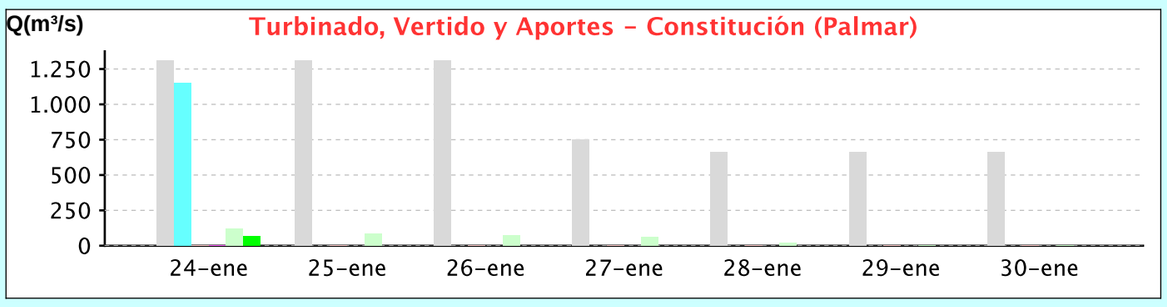

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

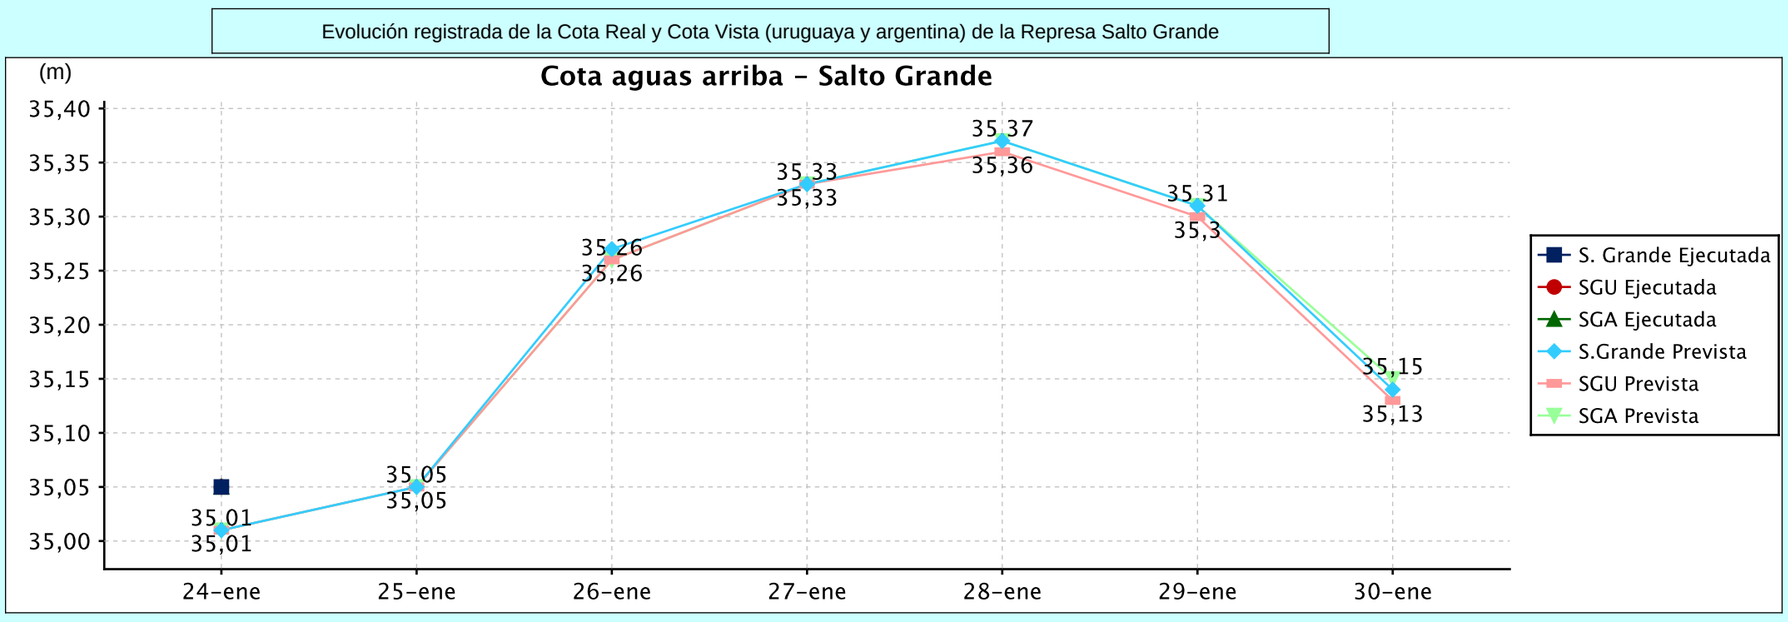

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	684	670
Baygorria	902	889
Palmar	1.310	1.150
SGU	4.048	3.802

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	646	656
Baygorria	0	-28
Palmar	123	68
SGU	5.400	5.459

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	430	424
Baygorria	200	185
Palmar	0	0
SGU	947	3.068

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

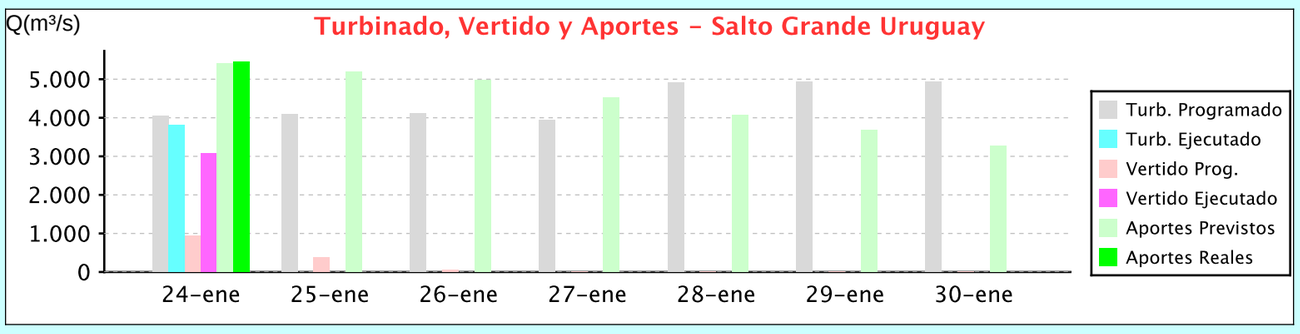

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,05
Cota Vista Arg	35,05
Cota real	35,05
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

OBSERVACIONES

Se exportaron 305 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

27/01/2015 10:54
