INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N. — **viernes 05 de junio de 2015**

Generación Térmica	
Central Batlle	**1.532**
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.536
Central La Tablada	**-82**
Central P. del Tigre	**5.873**
APR A	**496**
APR B	**943**
APR C	**-0**
Central Maldonado	**0**
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	**1.040**
C. Baygorria	**704**
C. Palmar	**0**
C. Salto Grande	**10.212**
Importación (MWh)	
Argentina	**0**
Contingente	0
Brasil	**0**
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	**8.592**
TOTAL Generación	**29.310**

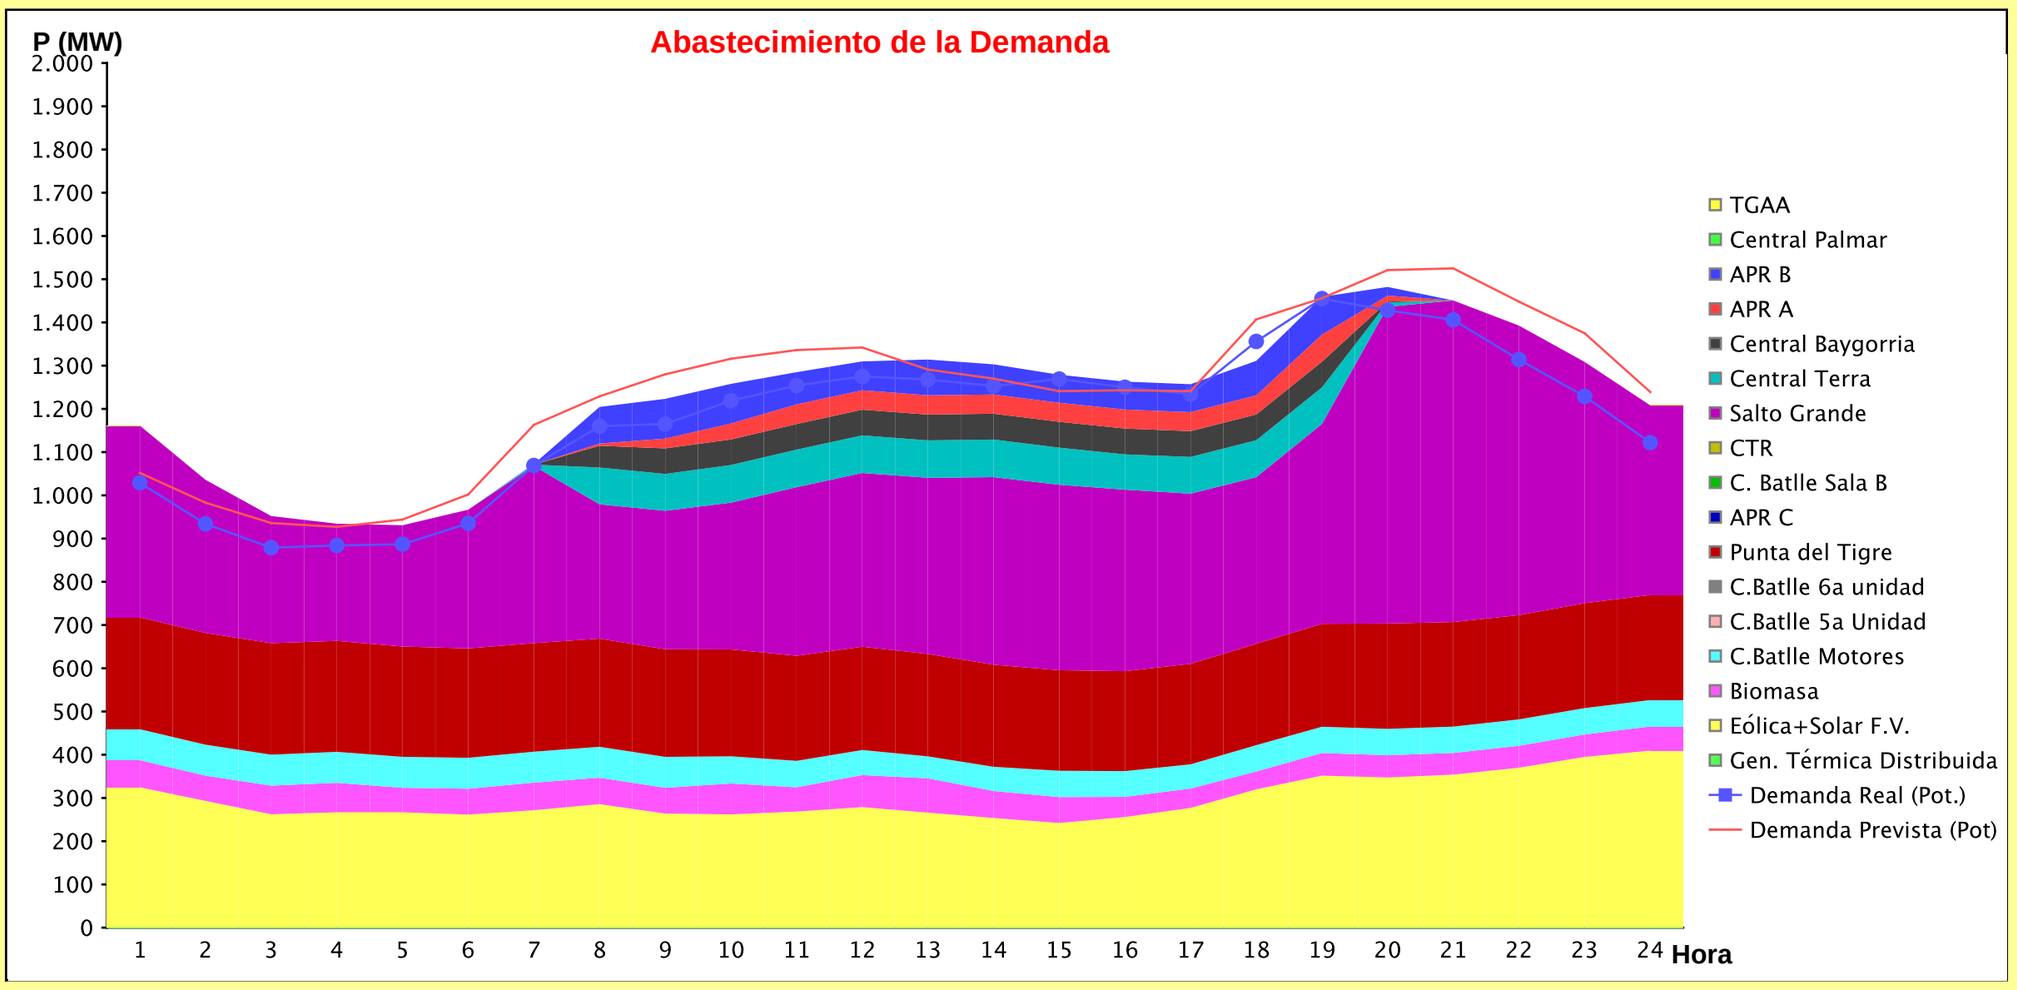

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	**0**
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	**0**
TOTAL Exportación (MWh)	**0**

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.310

(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh)	29.767
Diferencia (MWh)	-457
Ejecutada - Programada	-1,54 %

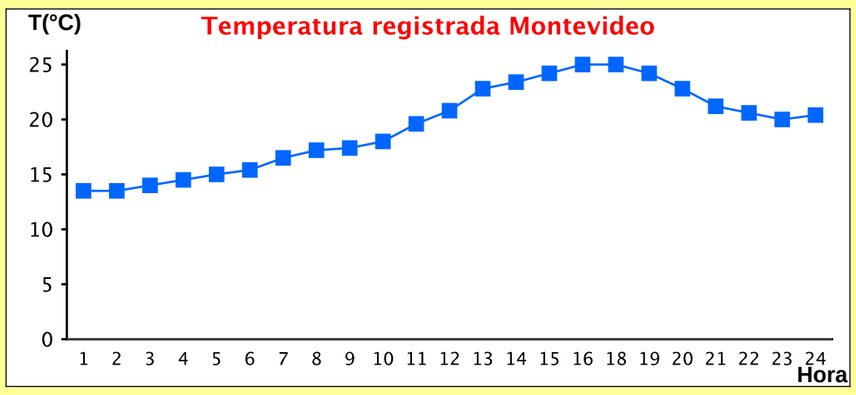

Picos de Potencia (MW)		
Pico mediodia:	1286	Hora 11:47
Potencia minima:	848	Hora 03:25
Pico noche:	1456	Hora 19:10

Generación Media (MW)	
Eólica	298,2
Biomasa	58,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

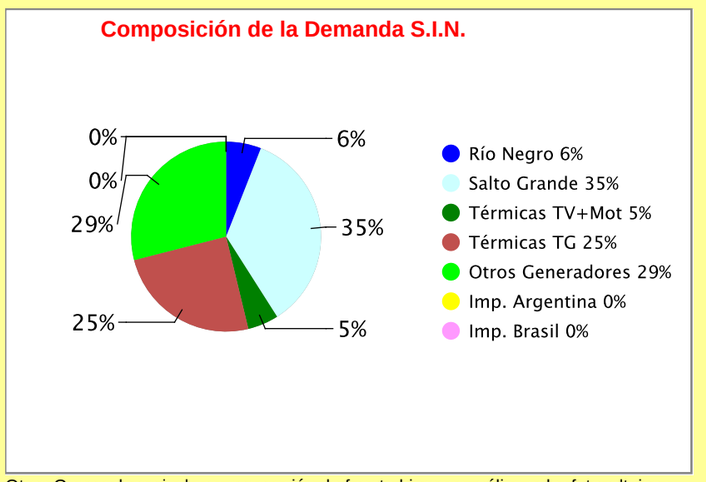

Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

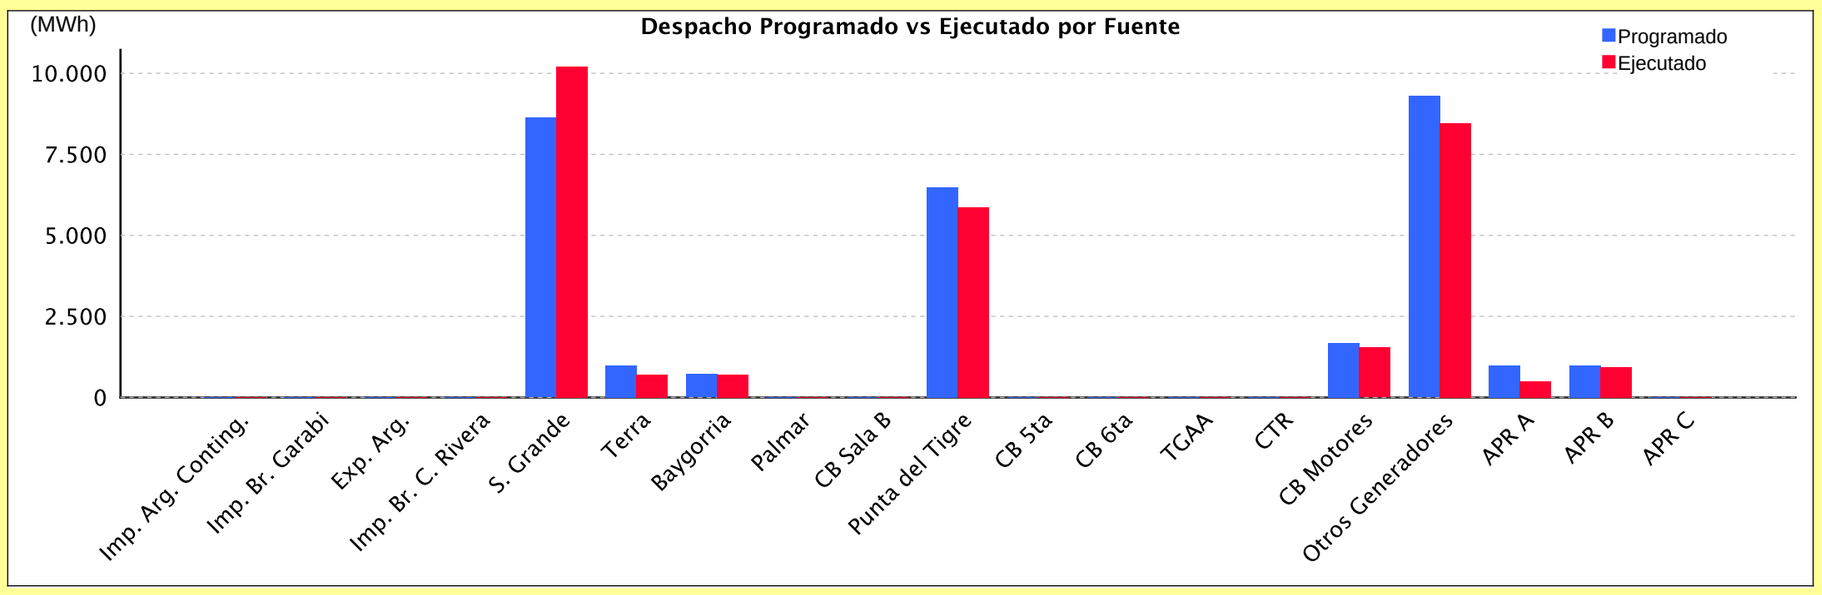

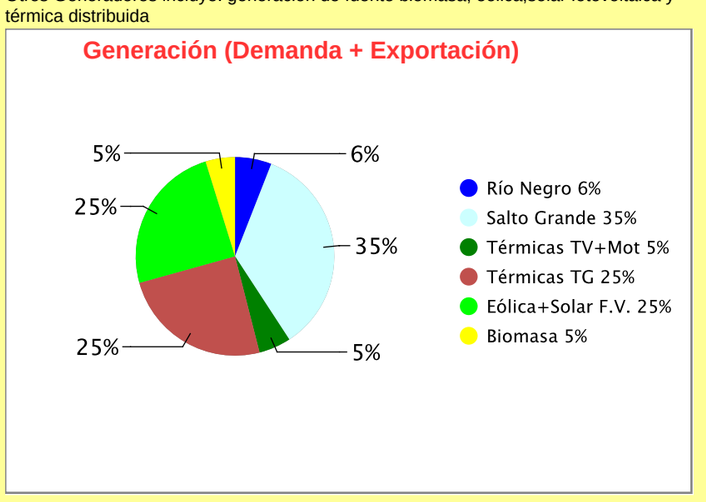

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

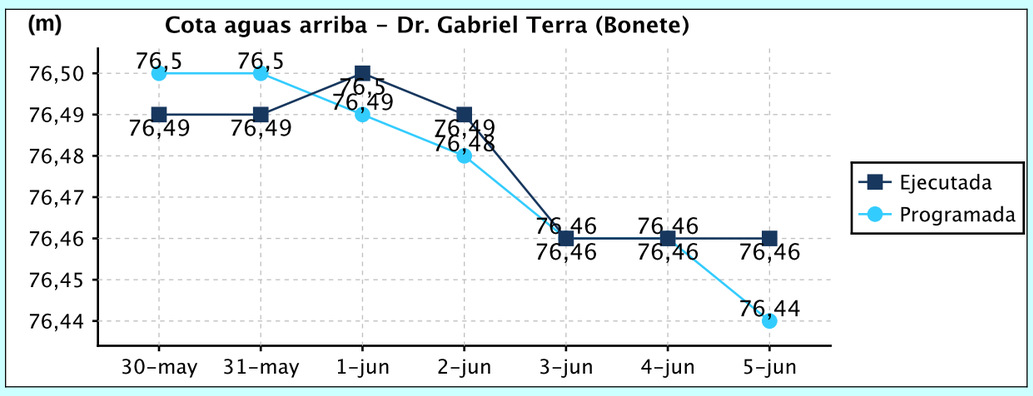

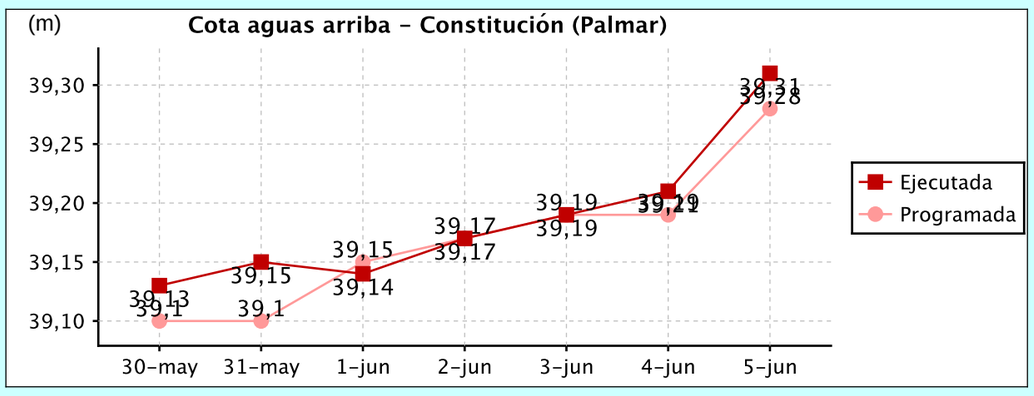

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,44	76,46
Baygorria	53,93	53,92
Palmar	39,28	39,31
SGU	34,93	34,82

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

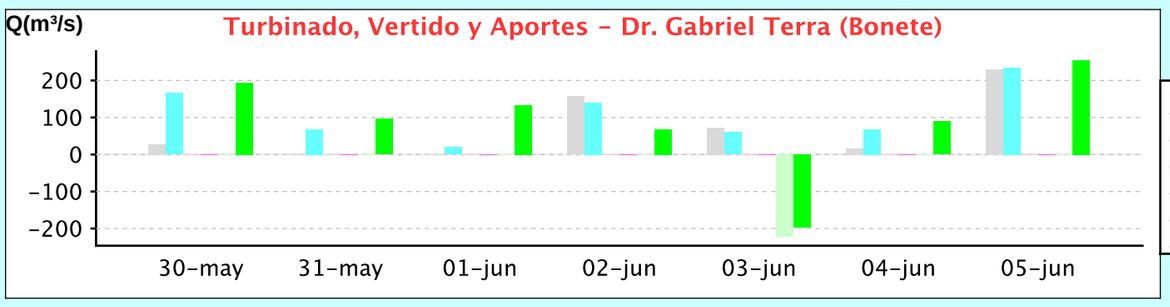

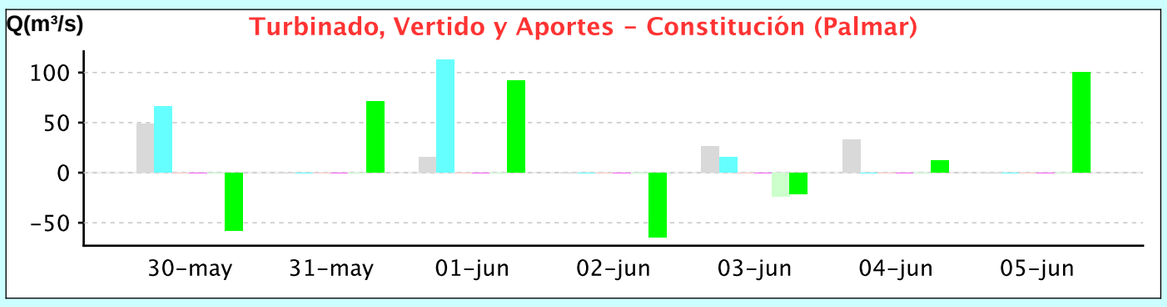

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

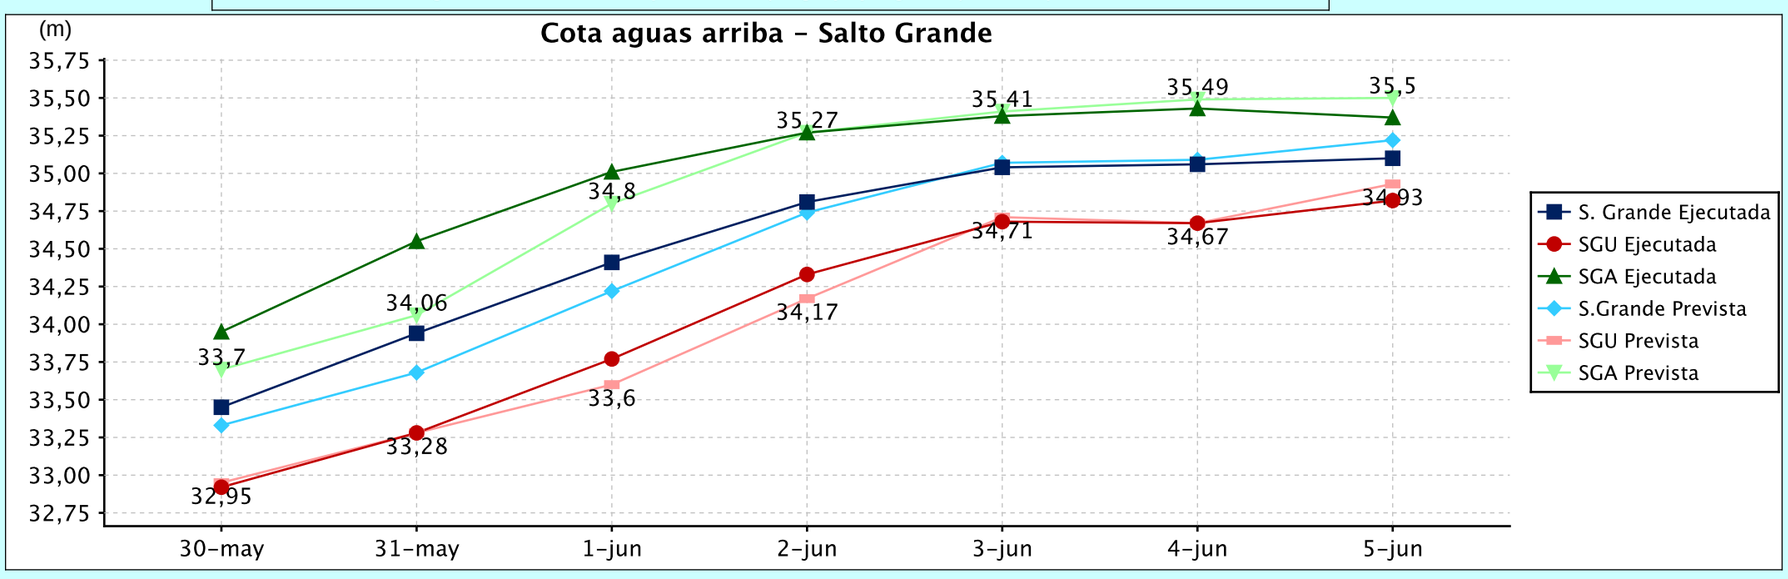

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	228	234
Baygorria	233	238
Palmar	0	0
SGU	1.664	1.839

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	255
Baygorria	0	10
Palmar	0	100
SGU	2.625	2.560

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

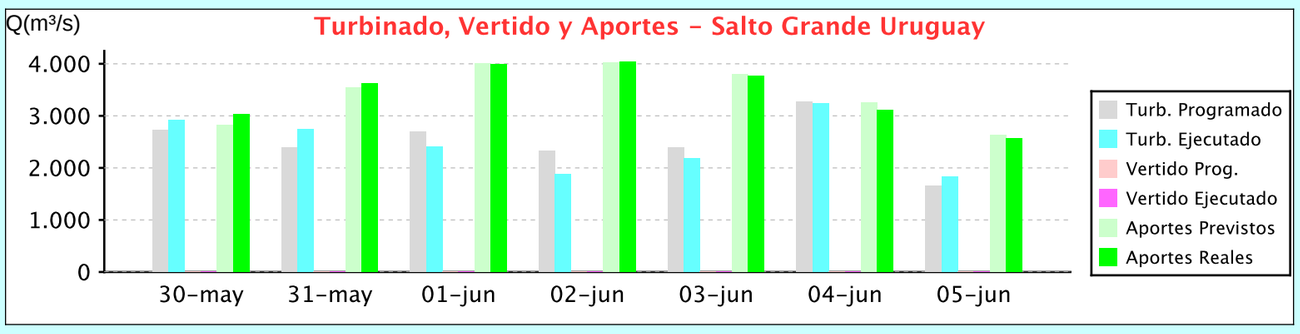

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,82
Cota Vista Arg	35,37
Cota real	35,10
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-12.954

OBSERVACIONES

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

08/06/2015 12:24
